

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND
CP - Ville :	53700 VILLAINES LA JUHEL
Référence client :	_00103000070000100094_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 94 de type 3 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 BD DUNANT - BD DUNAND 53700 VILLAINES LA JUHEL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00103000070000100094_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 94 de type 3 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0800400100) 27/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :	
Appartement n°94 - Vol 1 (Placard) Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°94 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°94 - Vol 8 (Séjour) Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	Appartement n°94 - Vol 2 (W.C) Appartement n°94 - Vol 4 (SDB) Appartement n°94 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°94 - Vol 9 (Dégagement)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°94	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°94	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Revêtement de sol	Appartement n°94	Vol 1 (Placard) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)		Impossible de voir les matériaux présent entre le panneau bois intérieur et le panneau PVC extérieur sans dépose de ceux ci
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Entrée)	Porte d'entrée 4 points sécurité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Concernant ce groupe :

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 4 prélèvements de tampons bitumineux sur 5 sont revenus amiantés. On peut en conclure que les tampons bitumineux d'origines sont amiantés dans tout le bâtiment. Lors des interventions dans les autres logements, il faudra les considérer comme positifs.

- 1 prélèvement de colle faïences de salle de bains sur 12 est revenu positif. Un prélèvement de colle de faïence de salle de bains sera nécessaire en cas d'intervention dans les logements non visités.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°94 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur marquage Datée 2012
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001632 n°1 - 1 - 002HD001632 n°1 - 2	P1	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 1 (Placard)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P1 - S5 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0016 32 n°1 - 1 - 002HD0016 32 n°1 - 2	P1	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 32 n°3 - 1 - 002HD0016 32 n°3 - 2	P3	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 1 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S8 - S9 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0016 32 n°3 - 1 - 002HD0016 32 n°3 - 2	P3	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées		I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent entre le panneau bois intérieur et le panneau PVC extérieur sans dépose de ceux ci
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 32 n°6 - 1 - 002HD0016 32 n°6 - 2	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0016 32 n°6 - 1 - 002HD0016 32 n°6 - 2	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 32 n°7 - 1 - 002HD0016 32 n°7 - 2	P7	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0016 32 n°7 - 1 - 002HD0016 32 n°7 - 2	P7	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°94	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°94	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Menuiseries	Porte d'entrée 4 points sécurité	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001632 n°2 - 1	P2	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S6 - S7 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001632 n°2 - 1	P2	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001632 n°5 - 1	P5	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 8 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001632 n°5 - 1	P5	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001632 n°4 - 1 - 002HD001632 n°4 - 2	P4	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001632 n°8 - 1 - 002HD001632 n°8 - 2	P8	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 1 (Placard)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 7 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 1 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes marron avec colle jaune	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes marron avec colle jaune	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 12 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001631
Appartement n°94	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 1 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°94	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°94	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°94	Appartement n°94 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°94	Appartement n°94 - Plan de prélèvements




APPARTEMENT N°94 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001632

Légende



Volume non visité

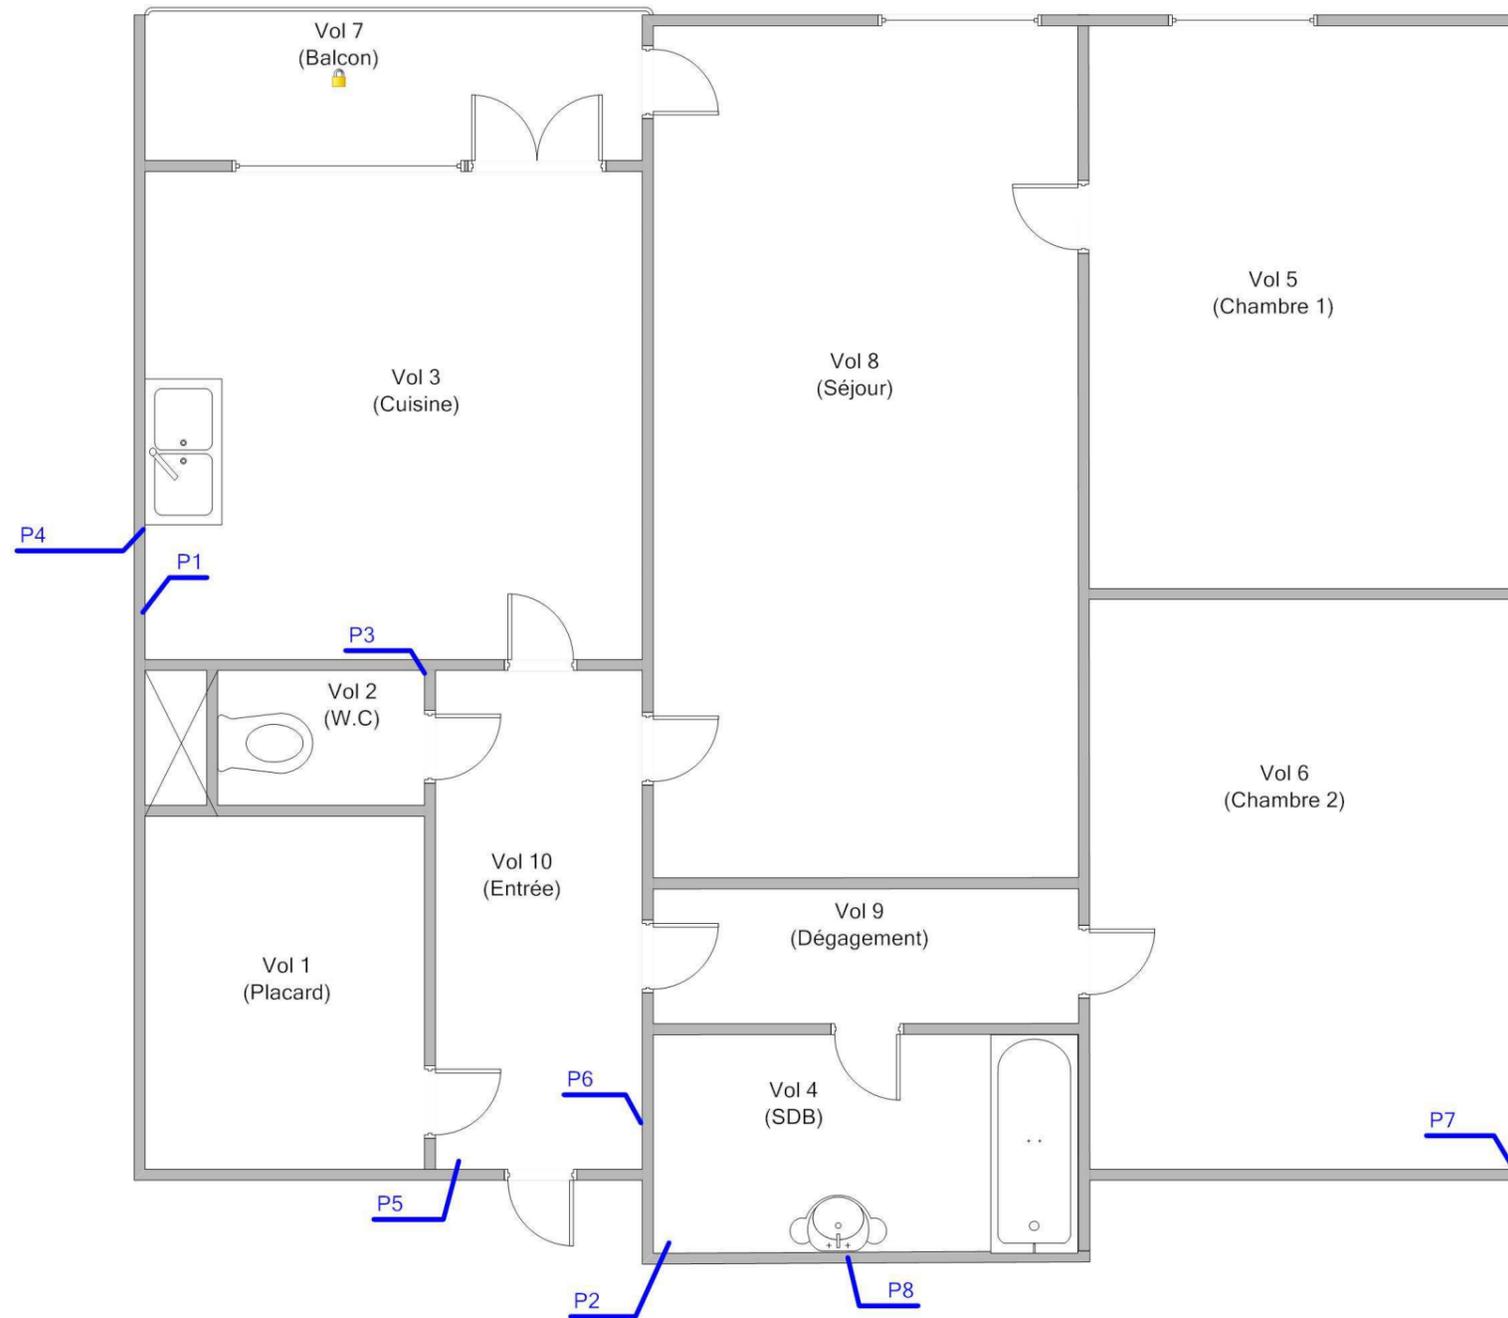

Adresse du bien
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

Désignation
Appartement n° 94 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
27/07/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001632 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001632 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001632 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001632 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°94 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001632 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°94 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001632 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001632 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001632 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001632 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001632 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001632 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°94 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001632 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°94 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001632 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001632 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	I4
	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	I5



002HD001632 n°1 - 1 (P1)



002HD001632 n°1 - 2 (P1)



002HD001632 n°2 - 1 (P2)



002HD001632 n°3 - 1 (P3)



002HD001632 n°3 - 2 (P3)



002HD001632 n°4 - 1 (P4)



002HD001632 n°4 - 2 (P4)



002HD001632 n°5 - 1 (P5)



002HD001632 n°6 - 2 (P6)



002HD001632 n°6 - 1 (P6)



002HD001632 n°7 - 1 (P7)



002HD001632 n°7 - 2 (P7)



002HD001632 n°8 - 1 (P8)



I1 - 1



I3 - 1



002HD001632 n°8 - 2 (P8)



I2 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige Rose - -	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Fibreux Souple Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 2 (W.C)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 10 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron - -	Appartement n°94 - Vol 6 (Chambre 2)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc Joint Souple Blanc - -	Appartement n°94 - Vol 4 (SDB)	

Référence chantier : C012017227402
Adresse chantier : Commande : 002HD001632
Affaire : _00103000070000100094_
5 BD DUNANT - BD DUNAND
53700 VILLAINES LA JUHEL

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227402 (8 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01534764

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_001		1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
enduits / Murs et cloisons /		3	Peinture	Effritable	Blanc				
Enduit plâtre (Porteur pièces humides)									
Vol 3 (Cuisine)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534765

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_002		1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Plafond et faux-plafonds /		2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides)		3	Peinture	Effritable	Beige Rose				
Vol 4 (SDB)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534766

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_003		1	Carton	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Parois verticales intérieures et		2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
enduits / Cloisons légères ou		3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
préfabriquées / Cloison et		4	Enduit	Effritable	Blanc				
doublage plaque plâtre pièces humides		5	Peinture	Effritable	Blanc				
Vol 2 (W.C)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534767

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_004		1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Revêtement de mur /		2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique			
Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence Cuisine)									
Vol 3 (Cuisine)									

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01534768 ●

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_005 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) Vol 10 (Entrée)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01534769 ●

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 07/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) Vol 10 (Entrée)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01534770 ●

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 07/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_007 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches Vol 6 (Chambre 2)	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01534771 ●

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 07/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002HD001632_008 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) Vol 4 (SDB)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
	4	Joint	Souple	Blanc				
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

