Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT BRAS 2
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0016800009_
Date du repérage :	27/02/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages

Présence d'amiante	Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	LOT BRAS 2 53100 MAYENNE
Référence client :	_0016800009_
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100
Date de repérage	27/02/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 14/03/2017
A Riorges, le 14/03/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

RDC - Vol 1 (SAS ext)	RDC - Vol 2 (Local V.O)
RDC - Vol 3 (local technique)	RDC - Vol 4 (PC RDC)
Etages - Vol 5 (PC R+1)	Etages - Vol 6 (local VO 1)
Etages - Vol 7 (local technique 1)	Etages - Vol 8 (PC R+2)
Etages - Vol 9 (local VO 2)	Etages - Vol 10 (local technique 2)
Etages - Vol 11 (PC R+3)	Etages - Vol 12 (local VO 3)
Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Plan masse - Vol 15 (Plan masse)
Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)
Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)	Façade gauche - Vol 19 (Façade gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (SAS ext) - Vol 2 (Local V.O) - Vol 3 (local technique) - Vol 4 (PC RDC)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (SAS ext) - Vol 4 (PC RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (SAS ext) - Vol 2 (Local V.O) - Vol 3 (local technique) - Vol 4 (PC RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 (Local V.O) - Vol 3 (local technique)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 3 (local technique) - Vol 4 (PC RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 7 (local technique 1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 10 (local technique 2) - Vol 11 (PC R+3) - Vol 12 (local VO 3)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 7 (local technique 1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 10 (local technique 2) - Vol 11 (PC R+3) - Vol 12 (local VO 3)	

Revêtement de sol	Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 7 (local technique 1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 10 (local technique 2) - Vol 11 (PC R+3) - Vol 12 (local VO 3)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages	Vol 6 (local VO 1) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	
Conduits, canalisations et équipements	Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Equipements divers et accessoires	Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 14 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 15 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 15 (Plan masse)	
Façades	Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	
Façades	Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	
Façades	Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	
Façades	Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 4 (PC RDC)	Matériaux à l'intérieur du coffre	Impossible de voir les matériaux présents à l'intérieur du coffre sans destruction de celui-ci
Vol 3 (local technique)	Matériaux sous panneaux fibralith	impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
Vol 2 (Local V.O)	Matériaux sous panneaux fibralith	impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
Vol 1 (SAS ext)	Panneaux et plaques	impossible de voir la nature des plaques rigides sans destruction de celles-ci
Vol 1 (SAS ext)	matériaux sous faux plafond	impossible de voir la nature des matériaux présents sous les plaques de faux plafond sans dépose de celles ci
Vol 16 (Façade avant)	Plaques fibres	impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Vol 18 (Façade arrière)	Plaques fibres	impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Vol 16 (Façade avant)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 17 (Façade droite)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 18 (Façade arrière)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 19 (Façade gauche)	Plaques en partie haute	innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Vol 14 (Toiture)	Complexe d'étanchéité	Risque de fuite en cas de prélèvements. (impossible de voir les matériaux présents sous les gravillons sans retirer ceux ci.
Vol 14 (Toiture)	Conduit	impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revement d'étanchéité qui les entoures

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 4 (PC RDC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4
Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	P8
Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	P8
Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	P8
Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P9
Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P9
Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P9
Vol 4 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S12
Vol 5 (PC R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S13
Vol 8 (PC R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S14
Vol 11 (PC R+3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S15

Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures vertes avec colle noire	S17
Vol 2 (Local V.O)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S18
Vol 3 (local technique)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S19
Vol 6 (local VO 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S20
Vol 9 (local VO 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S21
Vol 12 (local VO 3)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S22
Vol 12 (local VO 3)	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	coffre autour bouche VMC (Tresse + platre)	S23

Q Réserves / Commentaires

Cartographie amiante Lot BRAS 1 et 2 / Mayenne / Groupe 168 et 169 :

Liste des bâtiments concernés :
- Bâtiment 1 / 118 RUE DE DUBLIN A1
- Bâtiment 2 / 106 RUE DE DUBLIN A2
- Bâtiment 3 / 174 RUE DE DUBLIN A3
- Bâtiment 4 / 128 RUE DE ROME B1
- Bâtiment 5 / 146 RUE DE ROME B2
- Bâtiment 6 / 194 RUE DE ROME B3
- Bâtiment 7 / 178 RUE DE ROME B4
- Bâtiment 8 / 232 RUE DE ROME B5
- Bâtiment 9 / 56 RUE DE LONDRES C1

Interprétation des résultats :
- Colle des plaques de marbres dans les escaliers

8 des 9 colles de plaques de marbres prélevées sont revenues amiantées. Seul celle du bâtiment 3 (174 RUE DE DUBLIN A3) n'est pas amiantée. Il est donc nécessaire de considérer l'ensemble des colles de plaques de marbres comme amianté.

- Colle des plinthes intérieures

3 des 8 colles de plinthes intérieures sont revenues amiantées. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les colles revenues non amiantées pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiment 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 9)

- Plafond plaque de plâtre RDC

4 des 9 plafonds plaques de plâtre au RDC sont revenus amiantés. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements complémentaires sur les plafonds revenus non amiantés afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus. (Bâtiment 1/ 2 / 5 / 7 / 8)

- Plafond enduit plâtre

1 des 9 plafonds enduit plâtre est revenu amianté. Il est nécessaire de réaliser un prélèvement complémentaire sur le plafond du bâtiment en question (Bâtiment 8) pour confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

- Dalles dures dans les étages courants.

Toutes les dalles dures de tous les bâtiments sont amiantées.

- Chape maigre gaine technique

1 chape sur les 9 est revenue amiantée. Contamination possible par les travaux effectués sur les impostes des gaines techniques (présence de poussières)
- Commentaire n°1 : Aucun prélèvement réalisé sur les menuiseries des appartements en façade car menuiseies innaccessibles. (accès aux logements obligatoire pour accéder aux menuiseries)Commentaire n°2 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les élèments ponctuels de toiture où il est impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revetement d'étanchéité qui les entoures.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Etages - Vol 13 (local technique 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clés d'accès

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Local V.O)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S18	Résalisation d'un sondage		S18 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 3 (local technique)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S19	Résalisation d'un sondage	Au sol	S19 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 6 (local VO 1)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S20	Résalisation d'un sondage		S20 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 9 (local VO 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S21	Résalisation d'un sondage		S21 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 12 (local VO 3)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S22	Résalisation d'un sondage		S22 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Conduit air	étanchéité noire entre tuyau	S31			002HD001391 n°24 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 37 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 14 (Toiture)	bloc VMC	reprise étanchéité au sol	S30			002HD001391 n°24 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 36 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S26	Gris + peinture grise		S26 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 29 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	S26	Gris + peinture grise		S26 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 29 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S26	Gris + peinture grise		S26 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 29 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	S26	Gris + peinture grise		S26 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 29 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S27	gris + peinture verte		002HD001391 n°21 - 1 - S27 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 30 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	S27	gris + peinture verte		002HD001391 n°21 - 1 - S27 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 30 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S27	gris + peinture verte		002HD001391 n°21 - 1 - S27 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 30 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	S27	gris + peinture verte		002HD001391 n°21 - 1 - S27 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 30 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P21	Réalisation d'un prélevement	enduit + peinture bordeaux	002HD001391 n°21 - 1 - 002HD001391 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	enduit + peinture bordeaux	002HD001391 n°21 - 1 - 002HD001391 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques fibreuses verte	S28			S28 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001353
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques fibreuses verte	S28			S28 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 20 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001353
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques fibres	I5			I5 - 1				impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques fibres	I5			I5 - 1				impossible de voir les matériaux présents derrière le bardage sans dépose de celui-ci
Façade avant	Vol 16 (Façade avant)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Bardages	Plaques en partie haute	I6			I6 - 1				innaccessible (impossible de voir la nature du matériaux)
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	P22	Réalisation d'un prélevement	Gris + peinture beige et grise sur balcons	002HD001391 n°22 - 1	P22	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Gris + peinture beige et grise sur balcons	002HD001391 n°22 - 1	P22	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	Enduits projetés	S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Gris + peinture beige et grise sur balcons	002HD001391 n°22 - 1	P22	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	enduit + peinture balcon	P23	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°23 - 1 - 002HD001391 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 17 (Façade droite)	Murs	enduit + peinture balcon	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD001391 n°23 - 1 - 002HD001391 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade gauche	Vol 19 (Façade gauche)	Murs	enduit + peinture balcon	S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD001391 n°23 - 1 - 002HD001391 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S5			S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001084

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S6	Intérieure et extérieure		S6 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 5 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001084
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°5 - 1 - 002HD001391 n°5 - 2	P5	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	P5 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001391 n°5 - 1 - 002HD001391 n°5 - 2	P5	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+3)	Murs et cloisons	Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001391 n°5 - 1 - 002HD001391 n°5 - 2	P5	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement	Enduit gratté	002HD001391 n°11 - 1	P11	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 10 (local technique 2) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 8 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+3) - Vol 12 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11 - S11 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit gratté	002HD001391 n°11 - 1	P11	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (local technique) - Vol 2 (Local V.O) - Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S55 - S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit gratté	002HD001391 n°11 - 1	P11	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélevement	béton banché brut	002HD001391 n°12 - 1 - 002HD001391 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 10 (local technique 2) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	béton banché brut	002HD001391 n°12 - 1 - 002HD001391 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (local technique) - Vol 2 (Local V.O)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S62 - S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	béton banché brut	002HD001391 n°12 - 1 - 002HD001391 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S12	Résalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S12 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S13	Résalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S13 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S14	Résalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S14 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 11 (PC R+3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S15	Résalisation d'un sondage	Linteaux gaines techniques	S15 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°19 - 1 - 002HD001391 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 10 (local technique 2) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S79 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD001391 n°19 - 1 - 002HD001391 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche	002HD001391 n°4 - 1 - 002HD001391 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche	002HD001391 n°4 - 1 - 002HD001391 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S7 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche	002HD001391 n°4 - 1 - 002HD001391 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Gaines et coffre horizontaux	Matériaux à l'intérieur du coffre	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présents à l'intérieur du coffre sans destruction de celui-ci
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Sous face escalier	P6	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment + peinture blanche	002HD001391 n°6 - 1 - 002HD001391 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2)	Plafonds	Sous face escalier	S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Enduit ciment + peinture blanche	002HD001391 n°6 - 1 - 002HD001391 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Plafonds	Rebouchage autour de conduits	P13	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre autour conduits PVC	002HD001391 n°13 - 1	P13	Enduit compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 10 (local technique 2) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	Plafonds	Rebouchage autour de conduits	P13 - S9 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Enduit platre autour conduits PVC	002HD001391 n°13 - 1	P13	Enduit compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (local technique)	Plafonds	Rebouchage autour de conduits	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Enduit platre autour conduits PVC	002HD001391 n°13 - 1	P13	Enduit compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (local technique)	Faux plafonds	Matériaux sous panneaux fibralith	I2			I2 - 1				impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
RDC	Vol 2 (Local V.O)	Faux plafonds	Matériaux sous panneaux fibralith	I2			I2 - 1				impossible de voir les matériaux présent sous panneaux fibralith sans dépose de ceux-ci
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Plafonds	Enduit ciment brut dalle pleine	P14	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°14 - 1 - 002HD001391 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 10 (local technique 2) - Vol 6 (local VO 1) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 12 (local VO 3)	Plafonds	Enduit ciment brut dalle pleine	S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001391 n°14 - 1 - 002HD001391 n°14 - 2	P14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Plafonds	Enduit pulvérulant (réservation dans dalle)	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°17 - 1 - 002HD001391 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2)	Plafonds	Enduit pulvérulant (réservation dans dalle)	P17 - S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001391 n°17 - 1 - 002HD001391 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit pulvérulant (réservation dans dalle)	S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001391 n°17 - 1 - 002HD001391 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre + peinture blanche	P18	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°18 - 1 - 002HD001391 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Plafonds	Enduit plâtre + peinture blanche	S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001391 n°18 - 1 - 002HD001391 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 11 (PC R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement	plafond dernier étage (enduit + peinture)	002HD001391 n°20 - 1 - 002HD001391 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 12 (local VO 3)	Gaines et coffre horizontaux	coffre autour bouche VMC (Tresse + platre)	S23	Résalisation d'un sondage		002HD001391 n°21 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 26 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	I3			I3 - 1				impossible de voir la nature des plaques rigides sans destruction de celles-ci
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Faux plafonds	matériaux sous faux plafond	I4			I4 - 1				impossible de voir la nature des matériaux présents sous les plaques de faux plafond sans dépose de celles ci

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Réalisation d'un prélevement	Plinthes 30 X 10 Rouges	002HD001391 n°1 - 1 - 002HD001391 n°1 - 2	P1	Colle beige + peintures multiples avec poussières + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (SAS ext)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plinthes 30 X 10 Rouges	002HD001391 n°1 - 1 - 002HD001391 n°1 - 2	P1	Colle beige + peintures multiples avec poussières + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement	Plinthes rouges 15 X 7	002HD001391 n°2 - 1 - 002HD001391 n°2 - 2	P2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plinthes rouges 15 X 7	002HD001391 n°2 - 1 - 002HD001391 n°2 - 2	P2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 5 X 5 Rouges	002HD001391 n°3 - 1 - 002HD001391 n°3 - 2	P3	Colle grise + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC) - Vol 1 (SAS ext)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Carreaux 5 X 5 Rouges	002HD001391 n°3 - 1 - 002HD001391 n°3 - 2	P3	Colle grise + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	limon escalier	P7	Réalisation d'un prélevement	Enduit + peinture grise	002HD001391 n°7 - 1	P7	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	limon escalier	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Enduit + peinture grise	002HD001391 n°7 - 1	P7	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1) - Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	limon escalier	S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Enduit + peinture grise	002HD001391 n°7 - 1	P7	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°8 - 1 - 002HD001391 n°8 - 2	P8	Colle grise en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	S39 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001391 n°8 - 1 - 002HD001391 n°8 - 2	P8	Colle grise en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles plaque marbre marche + enduit contremarche	S40 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001391 n°8 - 1 - 002HD001391 n°8 - 2	P8	Colle grise en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P9	Réalisation d'un prélevement		002HD001391 n°9 - 1 - 002HD001391 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001391 n°9 - 1 - 002HD001391 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	S41 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001391 n°9 - 1 - 002HD001391 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier	S42 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001391 n°9 - 1 - 002HD001391 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages	Vol 7 (local technique 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P10	Réalisation d'un prélevement	grise avec motif	002HD001391 n°10 - 1 - 002HD001391 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 10 (local technique 2) - Vol 12 (local VO 3) - Vol 9 (local VO 2) - Vol 6 (local VO 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S43 - S44 - S45 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	grise avec motif	002HD001391 n°10 - 1 - 002HD001391 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (local technique) - Vol 2 (Local V.O)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	grise avec motif	002HD001391 n°10 - 1 - 002HD001391 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélevement	gaines techniques	002HD001391 n°15 - 1 - 002HD001391 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 8 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	gaines techniques	002HD001391 n°15 - 1 - 002HD001391 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	gaines techniques	002HD001391 n°15 - 1 - 002HD001391 n°15 - 2	P15	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S16			S16 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S16			S16 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etages	Vol 11 (PC R+3)	Revêtement de sol	parquet posé au sol	S16			S16 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Dalles dures vertes avec colle noire	S17	Résalisation d'un sondage		S17 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 8 (PC R+2)	Revêtement de sol	Dalles dures vertes avec colle noire	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17		S17 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Etages	Vol 11 (PC R+3)	Revêtement de sol	Dalles dures vertes avec colle noire	S17	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S17		S17 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087
Etages	Vol 5 (PC R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélevement	Sous dalles plastiques	002HD001391 n°16 - 1 - 002HD001391 n°16 - 2	P16	Ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 8 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	S74 - S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Sous dalles plastiques	002HD001391 n°16 - 1 - 002HD001391 n°16 - 2	P16	Ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 15 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint d'assemblage des bordures	S25			S25 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 28 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 14 (Toiture)	SKYDOME	Joints	S29			002HD001391 n°24 - 1				Négatif sur marquagedaté 2003
Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I7			002HD001391 n°24 - 1				Risque de fuite en cas de prélèvements. (impossible de voir les matériaux présents sous les gravillons sans retirer ceux ci.
Plan masse	Vol 14 (Toiture)	Eléments ponctuels	Conduit	I8			002HD001391 n°24 - 1				impossible de voir la nature des conduits sans retirer le revement d'étanchéité qui les entoures

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 15 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	S24			S24 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 27 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001087

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	RDC	RDC - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvements
	Etages	Etages - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages	Etages - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Etages	Etages - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Etages	Etages - MPCA Revêtement de sol
	Etages	Etages - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade gauche	Façade gauche - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001391

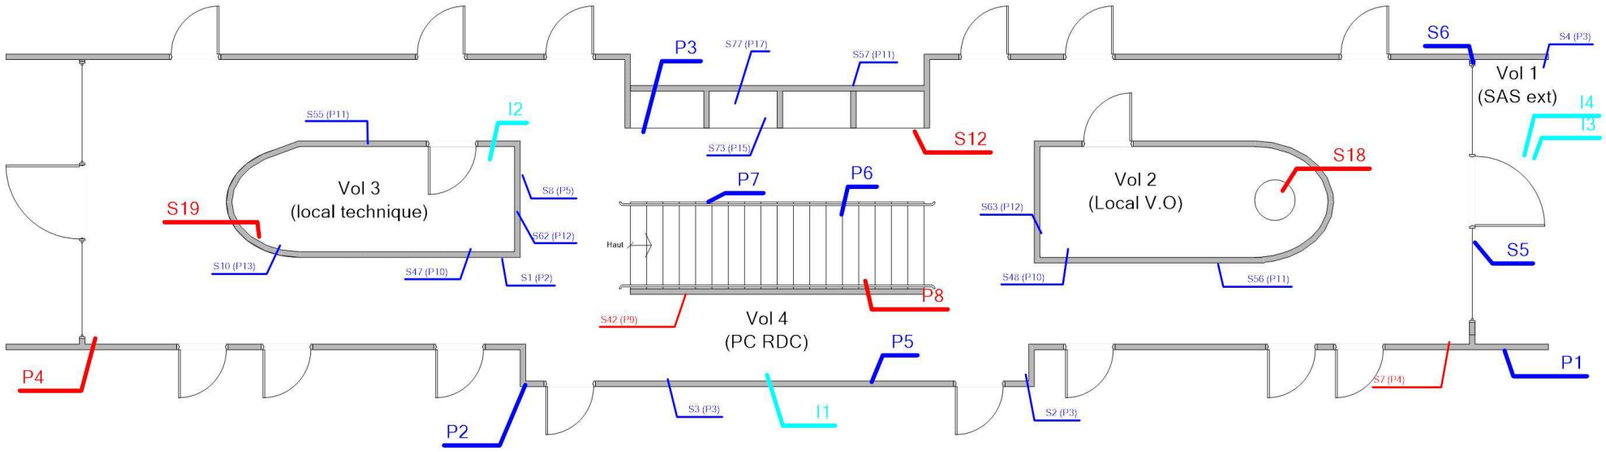

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001391

Légende

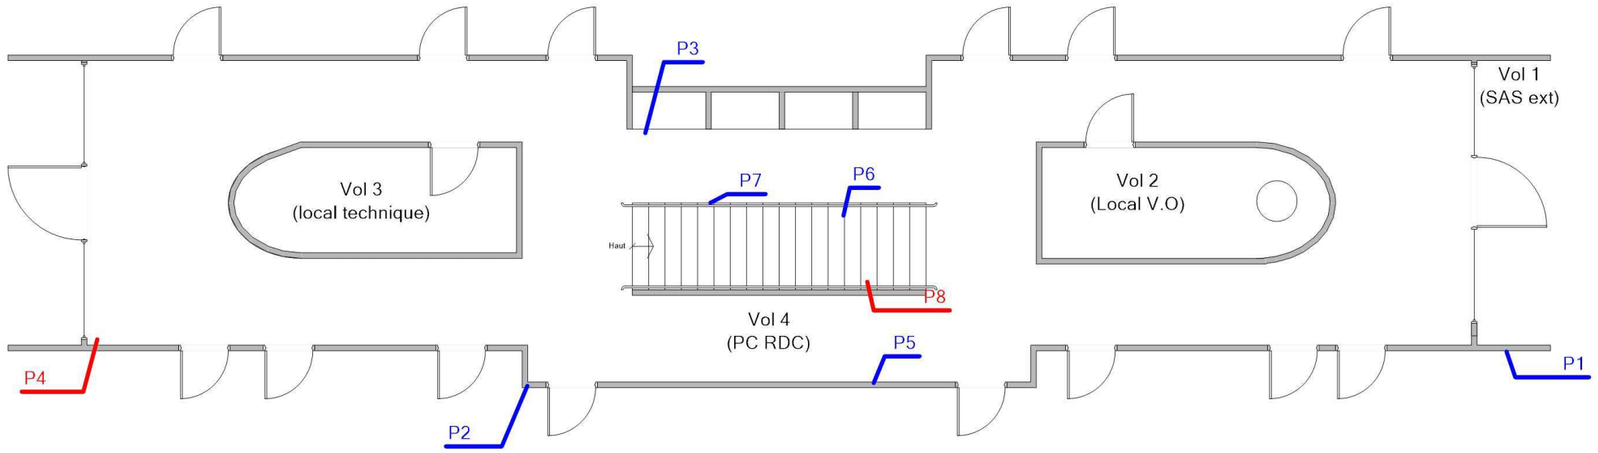

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001391

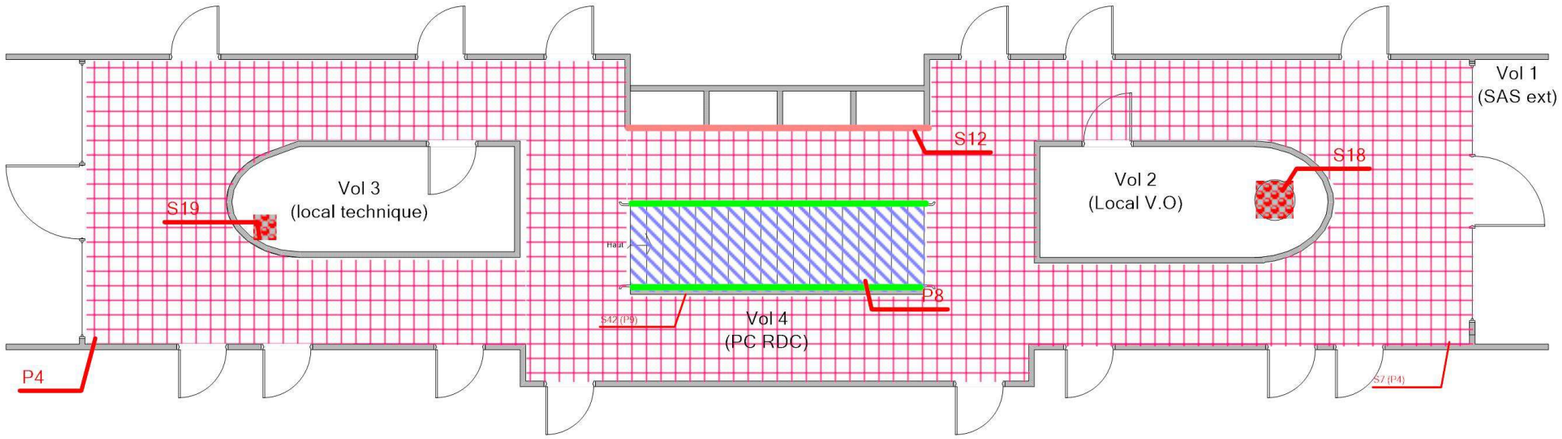

Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment
	P4 : Joint entre plaque plâtre plafond
	S12: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	P9 : enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier
	P8 : Colles plaque marbre marche + enduit contremarche
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001391

Légende	
	S12: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine

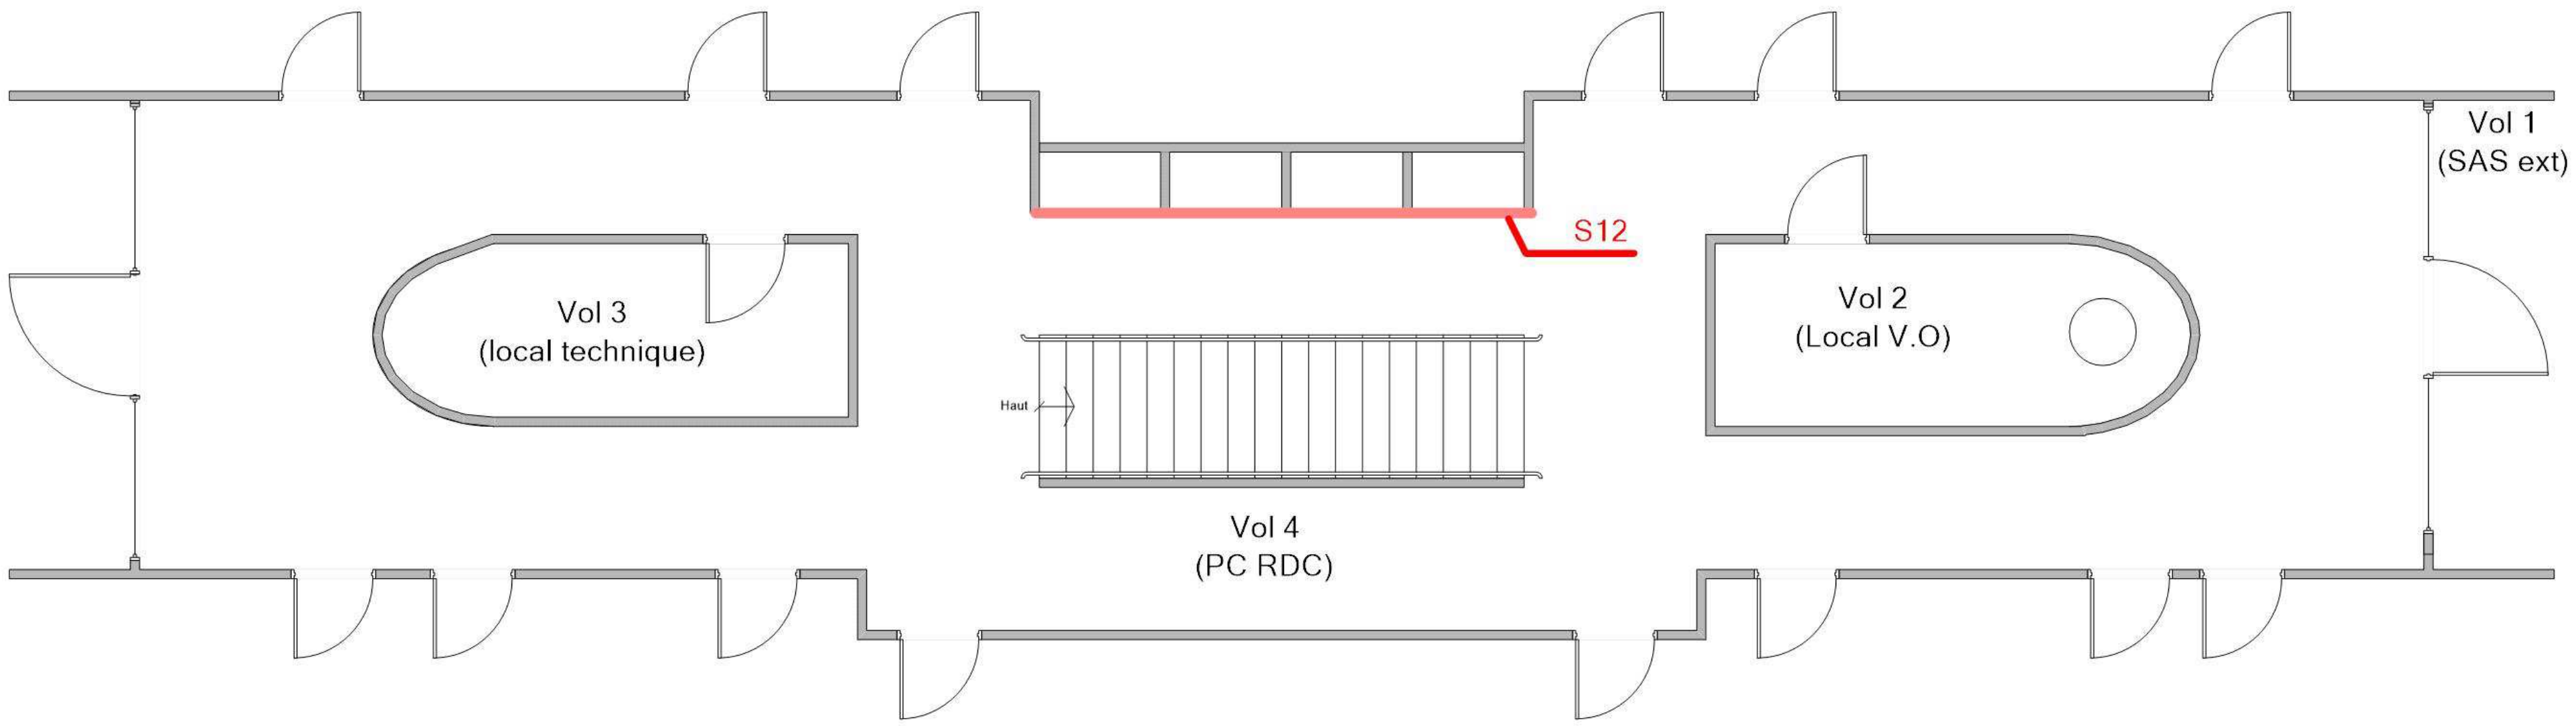

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
AC Environnement Diagnostics Immobiliers	LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001391

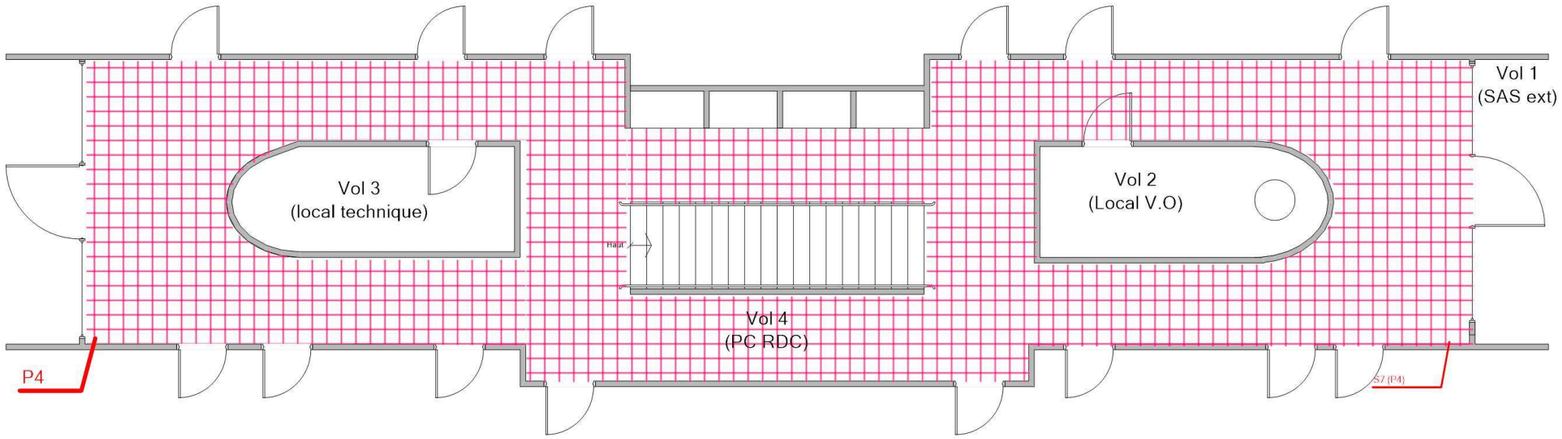

Légende

	P4 : Joint entre plaque plâtre plafond

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001391

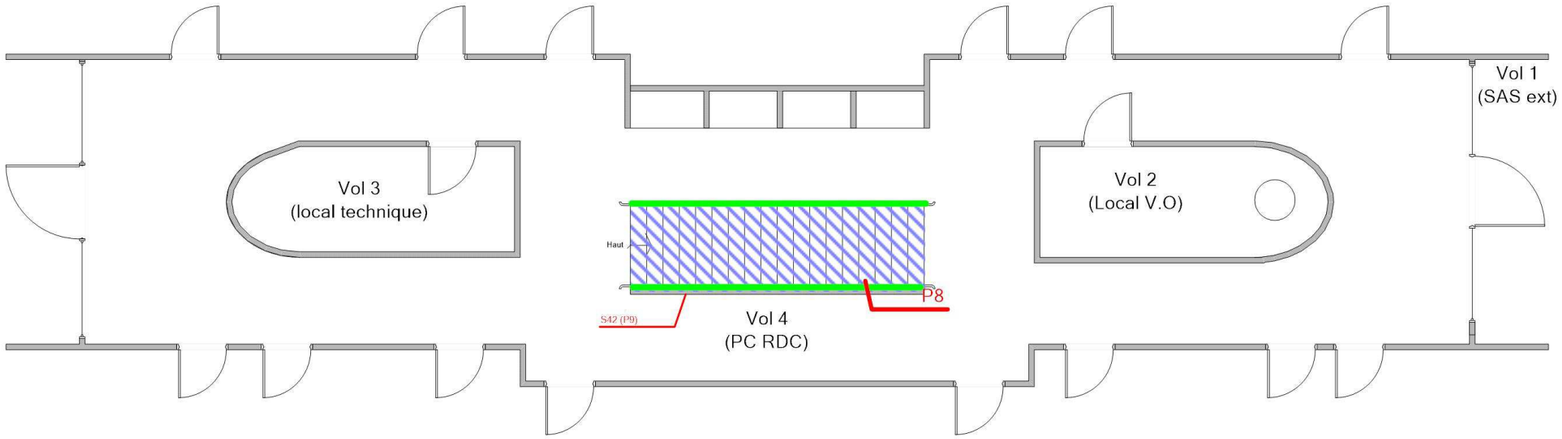

Légende

	P9 : enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier
	P8 : Colles plaque marbre marche + enduit contremarche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001391

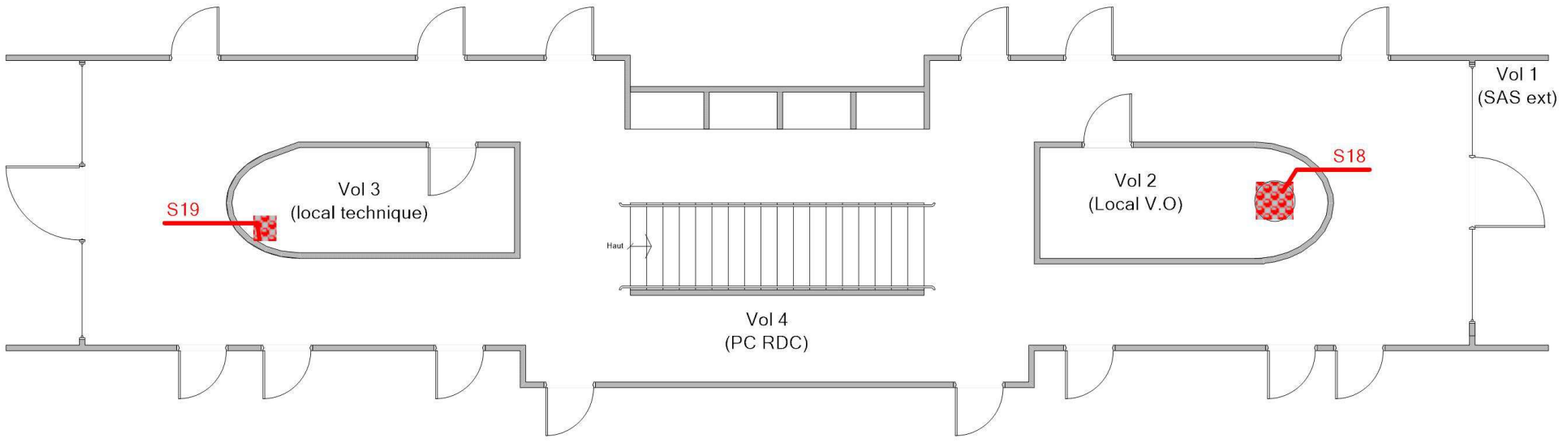

Légende

	S19: Conduit en fibres-ciment
	S18: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001391

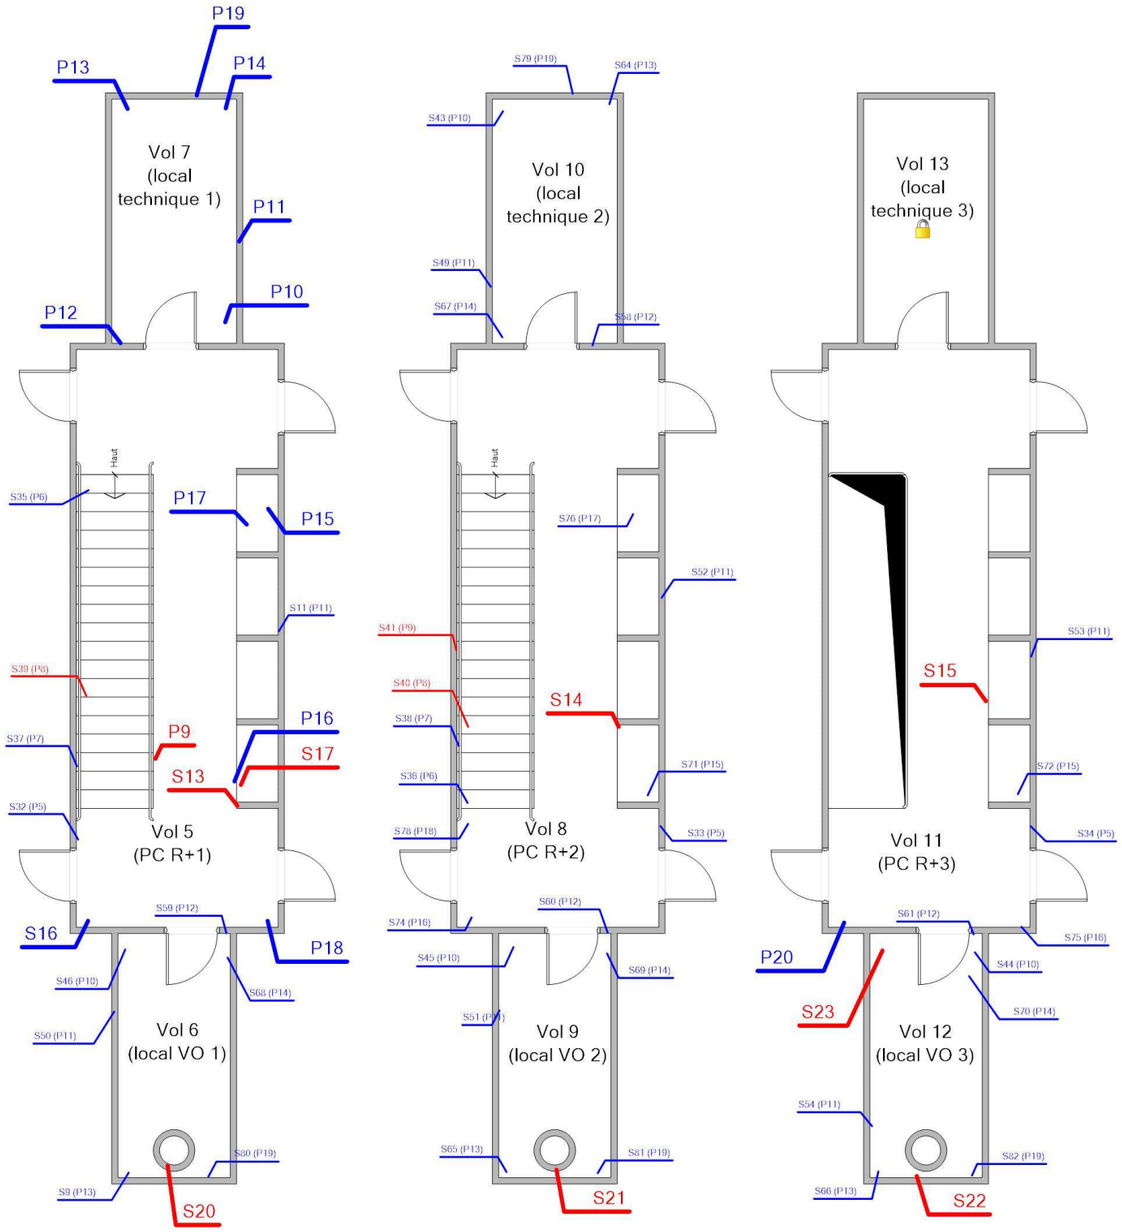

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001391

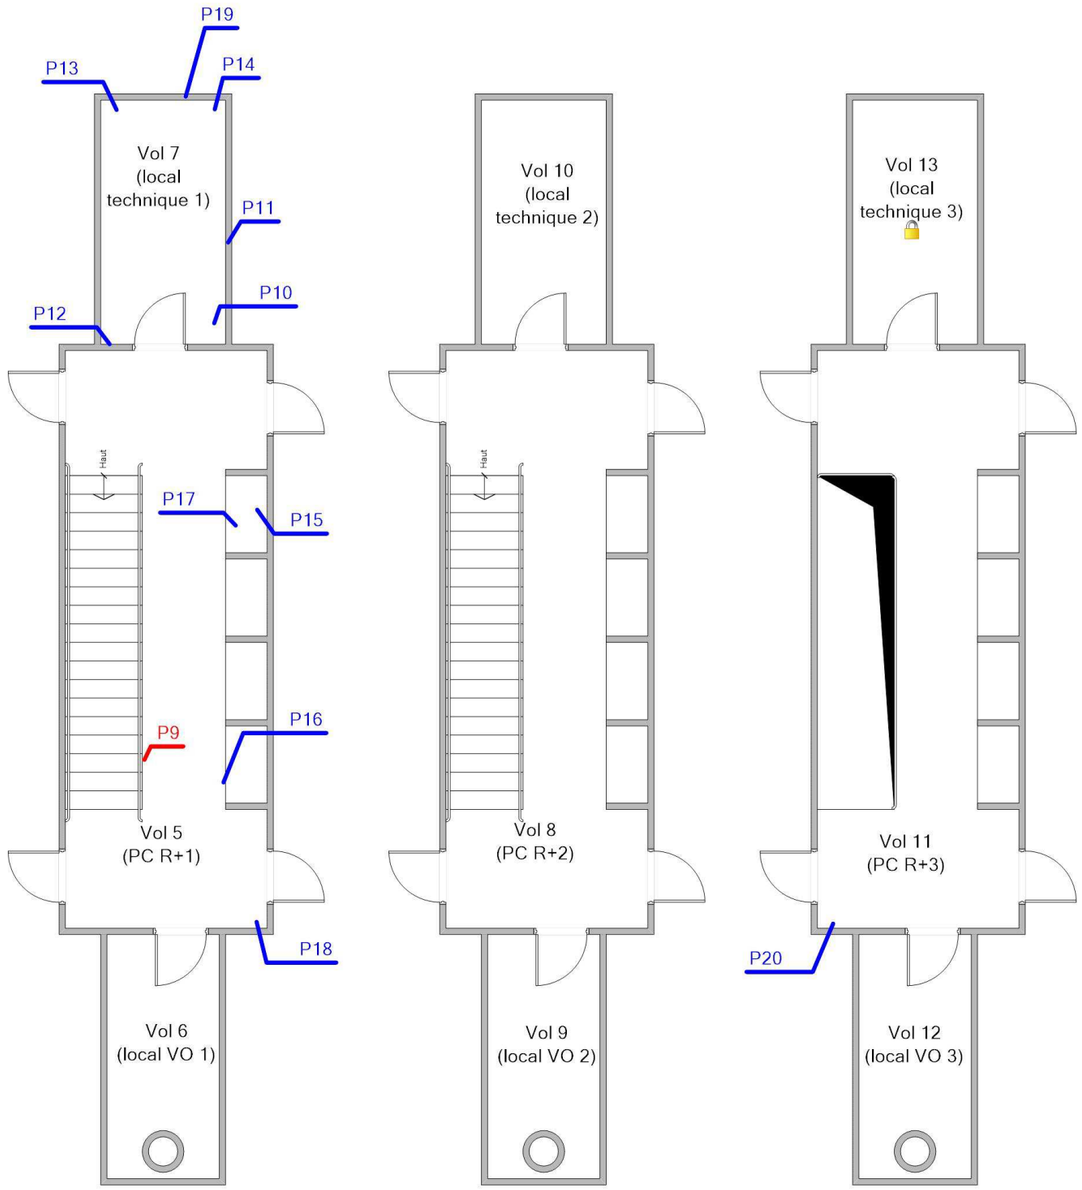

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence: 002HD001391

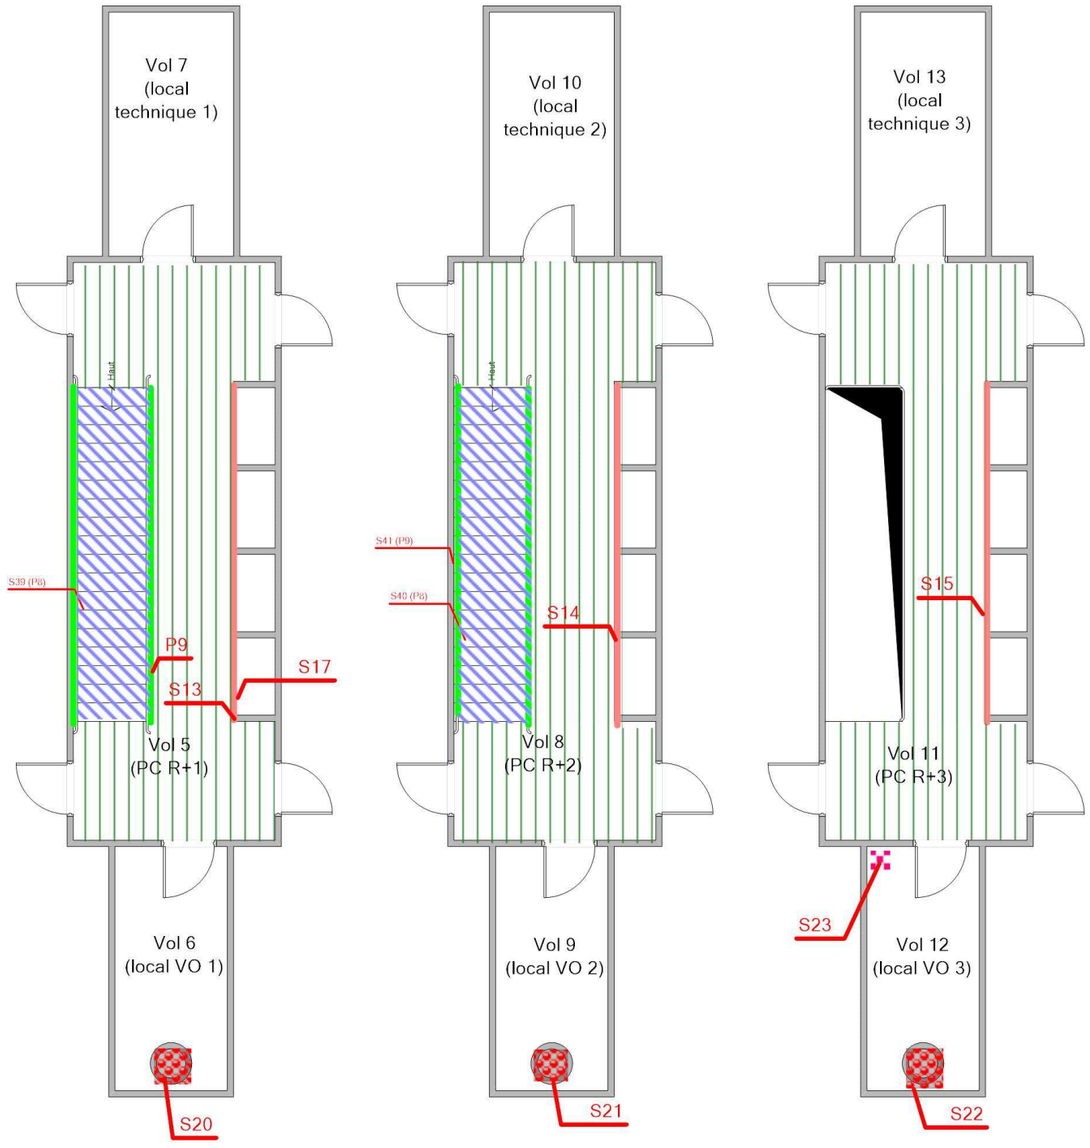

Légende

	S21: Conduit en fibres-ciment
	S15: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	P9 : enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier
	S20: Conduit en fibres-ciment
	S14: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	S17: Dalles dures vertes avec colle noire
	P8 : Colles plaque marbre marche + enduit contremarche
	S13: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	S23: coffre autour bouche VMC (Tresse + platre)
	S22: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001391

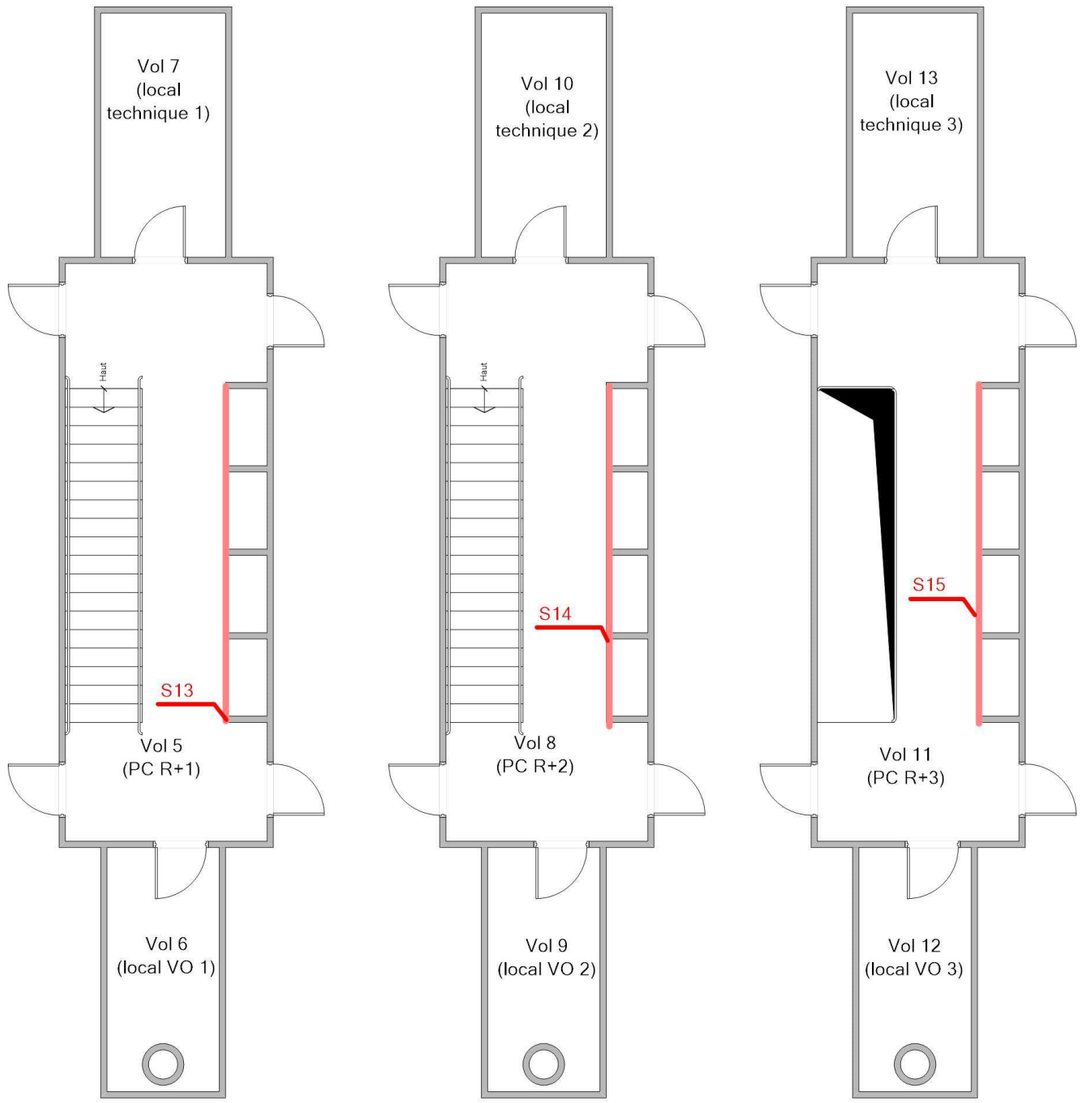

Légende

	S15: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	S14: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)
	S13: Plaques planes en fibres-ciment (imposte gaine technique)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001391

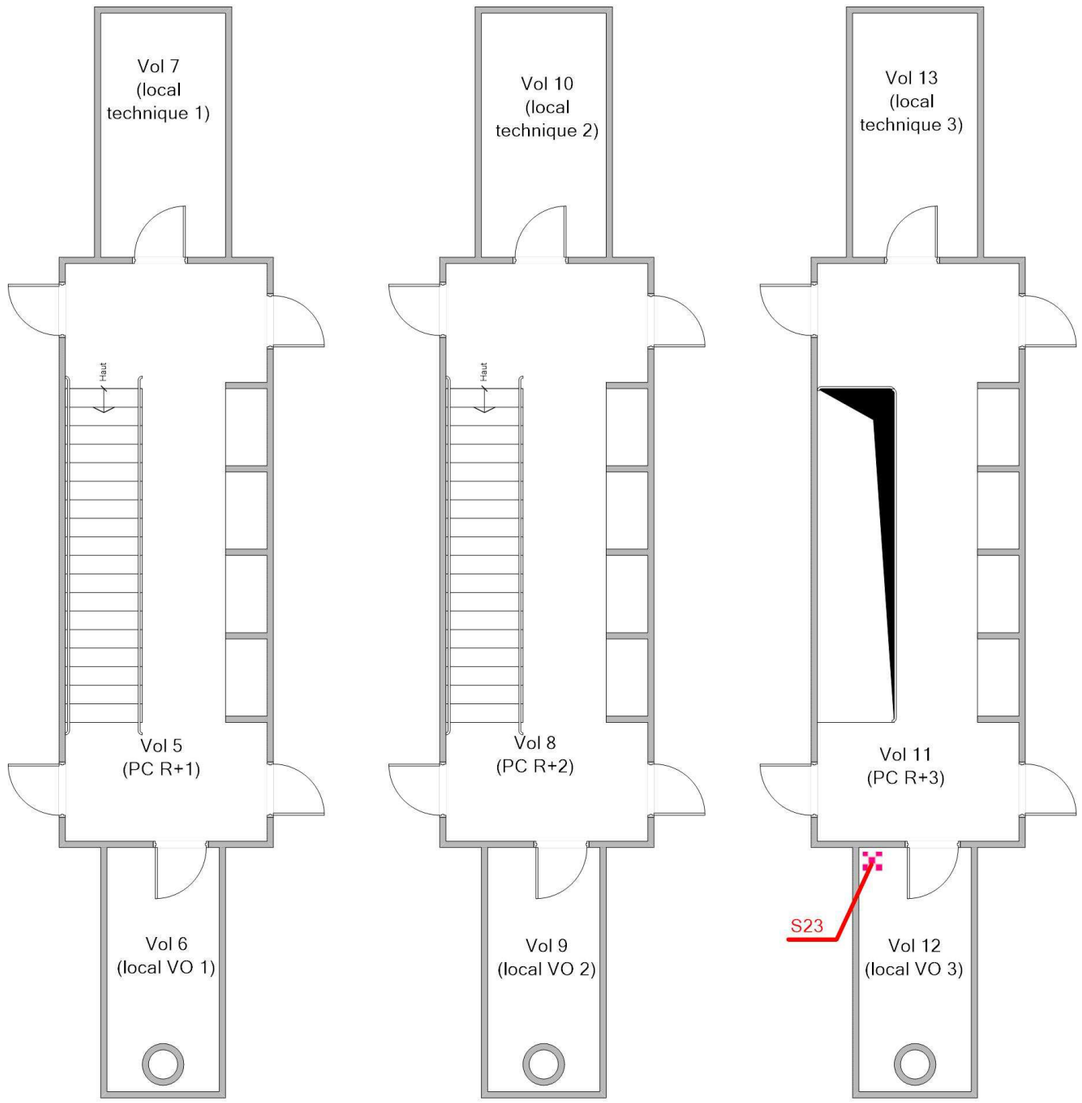

Légende

	S23: coffre autour bouche VMC (Tresse + platre)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001391

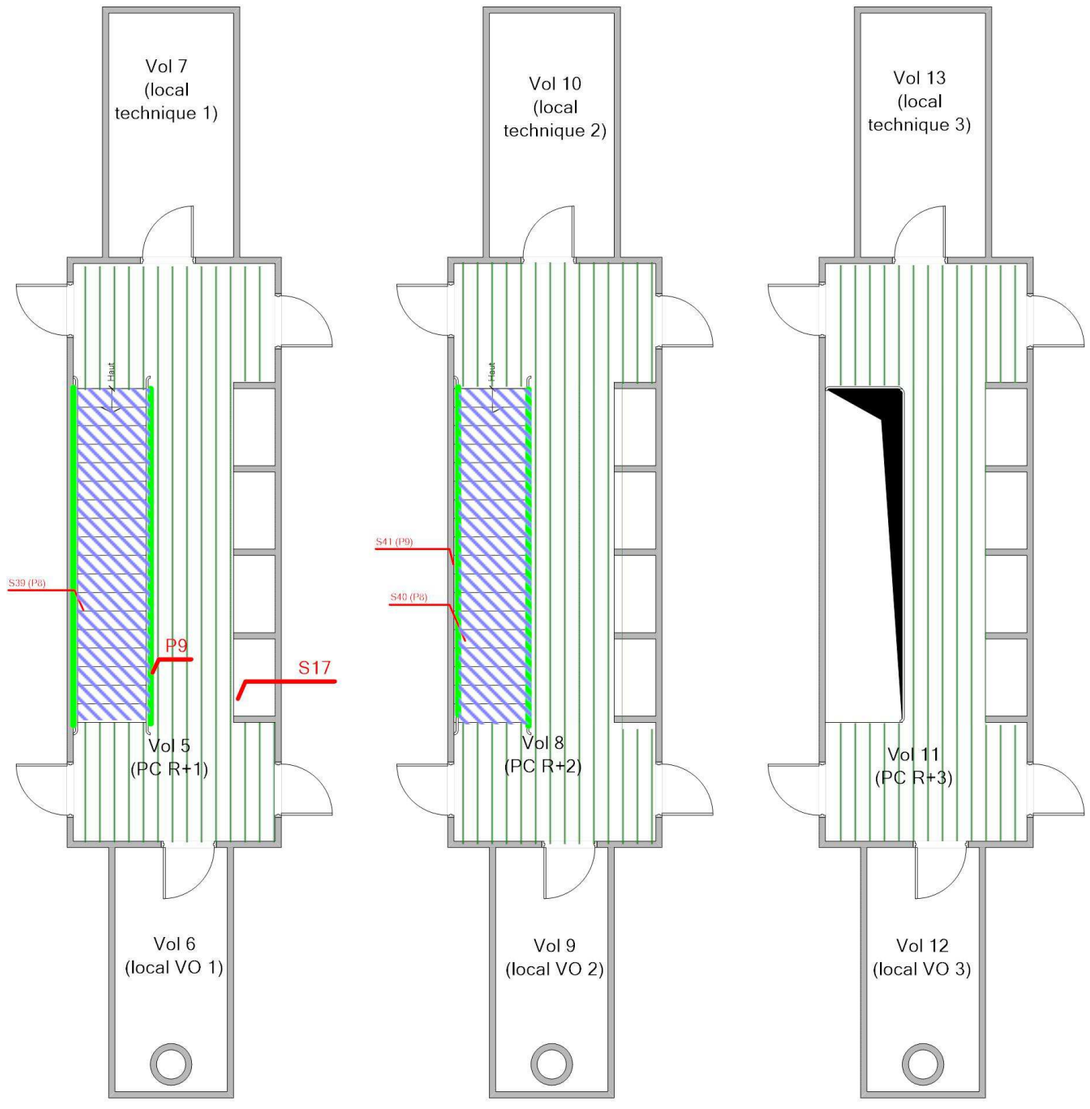

Légende

	P9 : enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier
	S17: Dalles dures vertes avec colle noire
	P8 : Colles plaque marbre marche + enduit contremarche

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ETAGES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001391

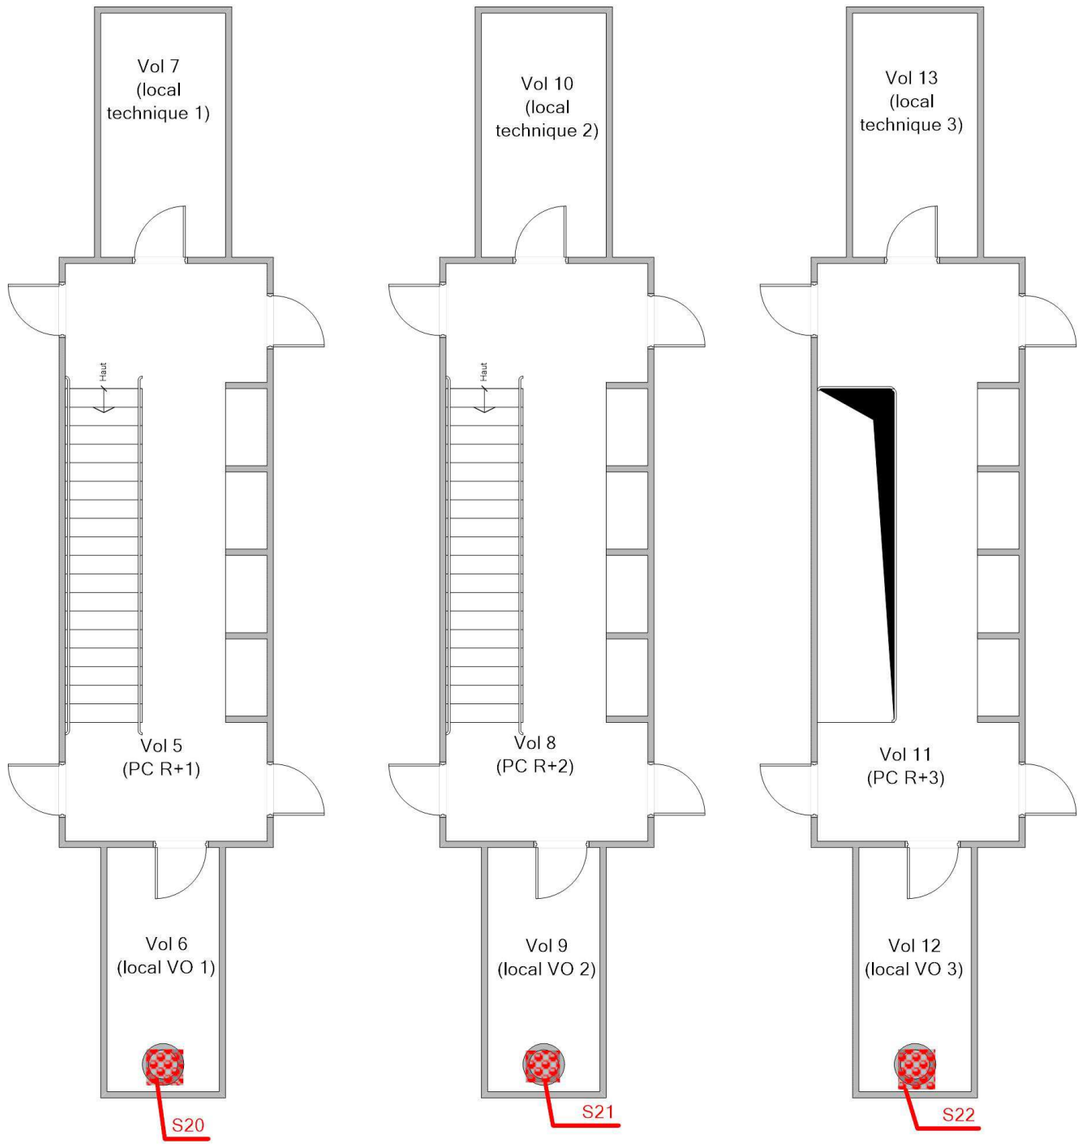

Légende

	S21: Conduit en fibres-ciment
	S20: Conduit en fibres-ciment
	S22: Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001391

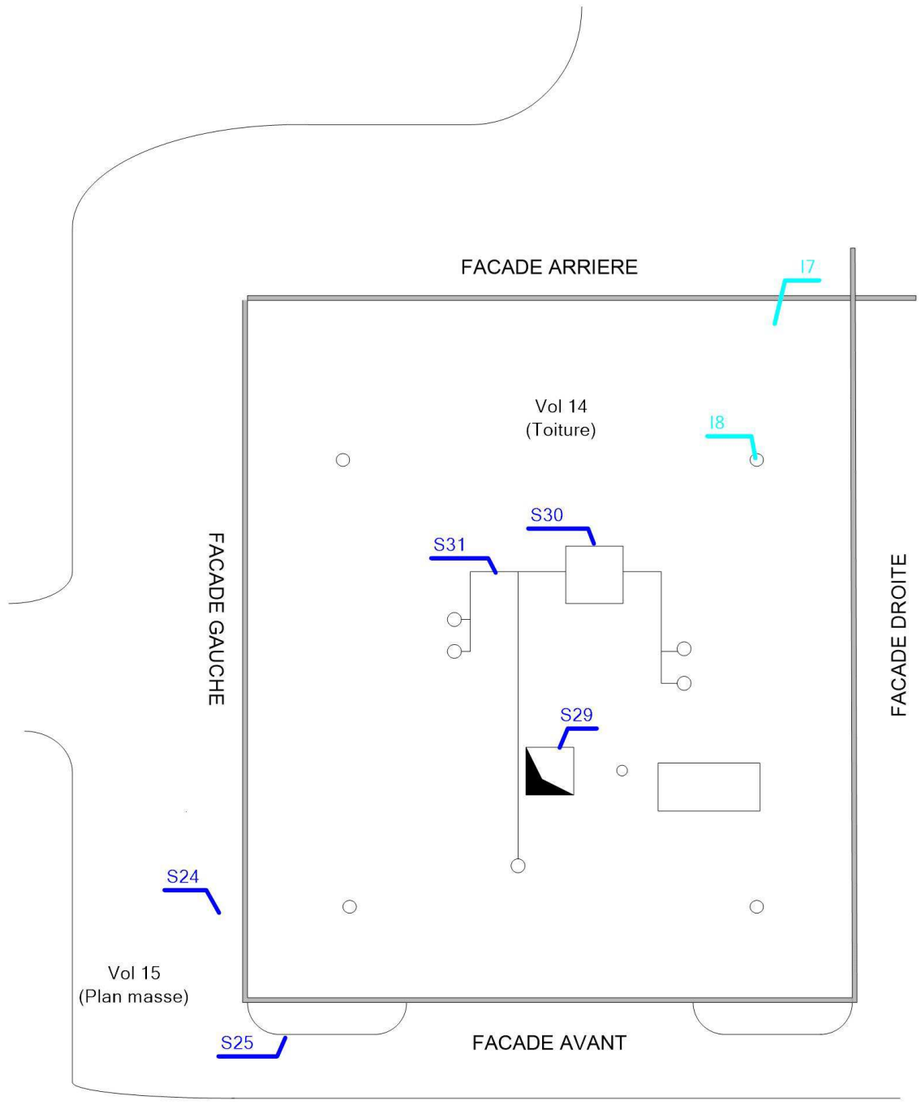

Légende

I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001391

Vol 16
(Façade avant)

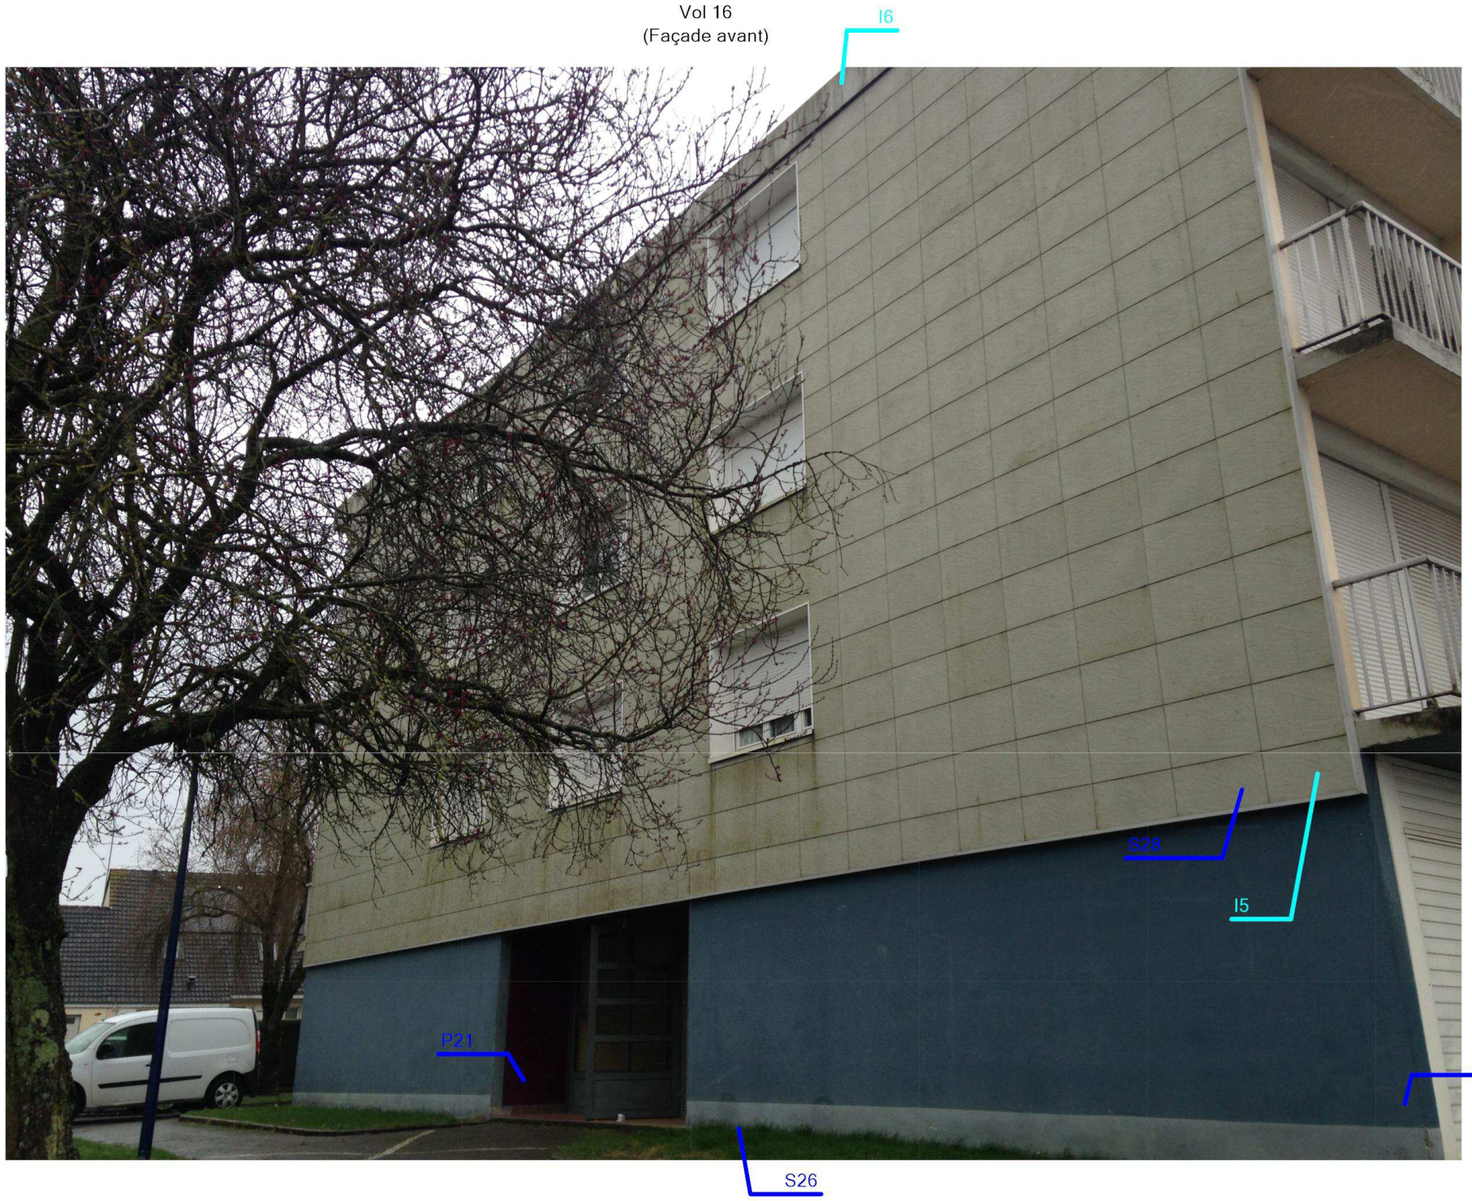

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE DROITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001391

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001391

Vol 18
(Façade arrière)

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

FAÇADE GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001391

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT BRAS 2 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages	27/02/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°21 - 1 (A23)	Etages - Vol 12 (local VO 3)	Présence sur présentation de documents
002HD001391 n°9 - 1 (P9)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement positif
002HD001391 n°9 - 2 (P9)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement positif
002HD001391 n°10 - 1 (P10)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°10 - 2 (P10)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°11 - 1 (P11)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°12 - 1 (P12)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°12 - 2 (P12)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°13 - 1 (P13)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°14 - 1 (P14)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°14 - 2 (P14)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°15 - 1 (P15)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°15 - 2 (P15)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°16 - 1 (P16)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°16 - 2 (P16)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°17 - 1 (P17)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°17 - 2 (P17)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°18 - 1 (P18)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°18 - 2 (P18)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°19 - 1 (P19)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°19 - 2 (P19)	Etages - Vol 7 (local technique 1)	Prélevement négatif
002HD001391 n°20 - 1 (P20)	Etages - Vol 11 (PC R+3)	Prélevement négatif
002HD001391 n°20 - 2 (P20)	Etages - Vol 11 (PC R+3)	Prélevement négatif
S13 - 1 (A13)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S14 - 1 (A14)	Etages - Vol 8 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S15 - 1 (A15)	Etages - Vol 11 (PC R+3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S16 - 1 (A16)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Absence : pas d'amiante par nature
S17 - 1 (A17)	Etages - Vol 5 (PC R+1)	Présence sur présentation de documents
S20 - 1 (A20)	Etages - Vol 6 (local VO 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S21 - 1 (A21)	Etages - Vol 9 (local VO 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S22 - 1 (A22)	Etages - Vol 12 (local VO 3)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°21 - 1 (A27)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Absence sur présentation de documents
002HD001391 n°21 - 1 (P21)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°21 - 2 (P21)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Prélevement négatif
S26 - 1 (A26)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Absence sur présentation de documents
S27 - 2 (A27)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Absence sur présentation de documents
S28 - 1 (A28)	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	Absence sur présentation de documents
	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	I5
	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	I6

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°22 - 1 (P22)	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)	Prélevement négatif
002HD001391 n°23 - 1 (P23)	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)	Prélevement négatif
002HD001391 n°23 - 2 (P23)	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	Plan masse - Vol 14 (Toiture)	I7
	Plan masse - Vol 14 (Toiture)	I8
002HD001391 n°24 - 1 (A29)	Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Absence sur marquage du materiau
002HD001391 n°24 - 1 (A30)	Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Absence sur présentation de documents
002HD001391 n°24 - 1 (A31)	Plan masse - Vol 14 (Toiture)	Absence sur présentation de documents
S24 - 1 (A24)	Plan masse - Vol 15 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
S25 - 1 (A25)	Plan masse - Vol 15 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001391 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 1 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001391 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001391 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001391 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001391 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001391 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
002HD001391 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement positif
S5 - 1 (A5)	RDC - Vol 1 (SAS ext)	Absence sur présentation de documents
S6 - 1 (A6)	RDC - Vol 1 (SAS ext)	Absence sur présentation de documents
	RDC - Vol 4 (PC RDC)	I1
S12 - 1 (A12)	RDC - Vol 4 (PC RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S18 - 1 (A18)	RDC - Vol 2 (Local V.O)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S19 - 1 (A19)	RDC - Vol 3 (local technique)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
	RDC - Vol 3 (local technique)	I2
	RDC - Vol 1 (SAS ext)	I3
	RDC - Vol 1 (SAS ext)	I4

002HD001391 n°24 - 1

002HD001391 n°24 - 1

002HD001391 n°21 - 1 (A23)

002HD001391 n°21 - 1 (A27)

002HD001391 n°24 - 1 (A29)

002HD001391 n°24 - 1 (A30)

002HD001391 n°24 - 1 (A31)

002HD001391 n°1 - 1 (P1)

002HD001391 n°1 - 2 (P1)

002HD001391 n°2 - 1 (P2)

002HD001391 n°2 - 2 (P2)

002HD001391 n°3 - 1 (P3)

002HD001391 n°3 - 2 (P3)

002HD001391 n°4 - 1 (P4)

002HD001391 n°4 - 2 (P4)

002HD001391 n°5 - 1 (P5)

002HD001391 n°5 - 2 (P5)

002HD001391 n°6 - 1 (P6)

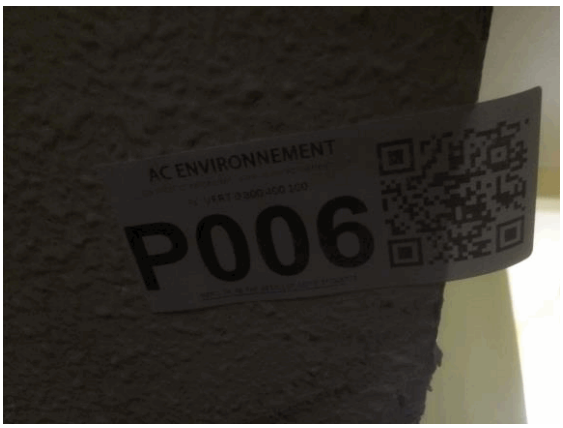

002HD001391 n°6 - 2 (P6)

002HD001391 n°7 - 1 (P7)

002HD001391 n°9 - 1 (P9)

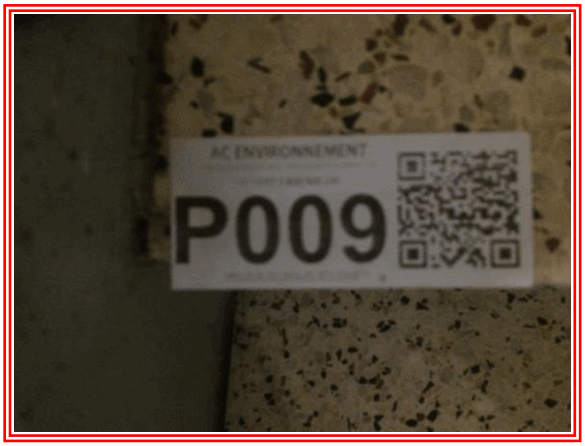

002HD001391 n°9 - 2 (P9)

002HD001391 n°8 - 1 (P8)

002HD001391 n°8 - 2 (P8)

002HD001391 n°10 - 1 (P10)

002HD001391 n°10 - 2 (P10)

002HD001391 n°11 - 1 (P11)

002HD001391 n°12 - 1 (P12)

002HD001391 n°12 - 2 (P12)

002HD001391 n°13 - 1 (P13)

002HD001391 n°14 - 1 (P14)

002HD001391 n°14 - 2 (P14)

002HD001391 n°15 - 1 (P15)

002HD001391 n°15 - 2 (P15)

002HD001391 n°16 - 1 (P16)

002HD001391 n°16 - 2 (P16)

002HD001391 n°17 - 1 (P17)

002HD001391 n°17 - 2 (P17)

002HD001391 n°18 - 1 (P18)

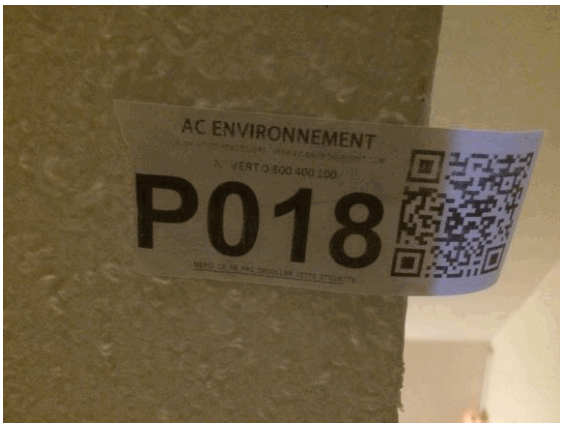

002HD001391 n°18 - 2 (P18)

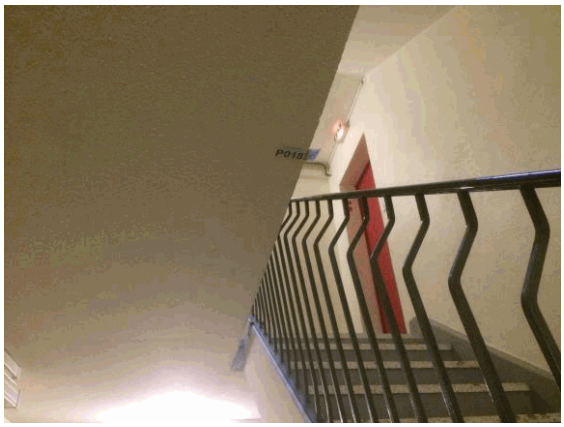

002HD001391 n°19 - 1 (P19)

002HD001391 n°19 - 2 (P19)

002HD001391 n°20 - 1 (P20)

002HD001391 n°20 - 2 (P20)

002HD001391 n°22 - 1 (P22)

002HD001391 n°23 - 1 (P23)

002HD001391 n°23 - 2 (P23)

002HD001391 n°21 - 1 (P21)

002HD001391 n°21 - 2 (P21)

S5 - 1 (A5)

S6 - 1 (A6)

I1 - 1

S12 - 1 (A12)

S13 - 1 (A13)

S14 - 1 (A14)

S15 - 1 (A15)

S16 - 1 (A16)

S17 - 1 (A17)

S20 - 1 (A20)

S21 - 1 (A21)

S22 - 1 (A22)

S18 - 1 (A18)

S19 - 1 (A19)

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

S24 - 1 (A24)

S25 - 1 (A25)

S26 - 1 (A26)

S27 - 2 (A27)

S28 - 1 (A28)

I5 - 1

I6 - 1

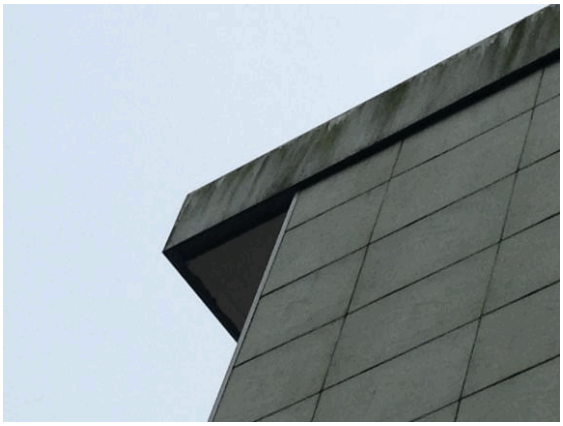

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples avec poussières + joint cassant gris non séparable - Plinthes 30 X 10 Rouges -	RDC - Vol 1 (SAS ext)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - Plinthes rouges 15 X 7 -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable - Carreaux 5 X 5 Rouges -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable - Plafond placoplatre + peinture gouttelé blanche -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable - Enduit ciment + peinture blanche -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peinture non séparable - Enduit + peinture grise -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + peinture non séparable - -	RDC - Vol 4 (PC RDC)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable - -	Etages - Vol 5 (PC R+1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige non séparable - grise avec motif -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture non séparable - Enduit gratté -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène - béton banché brut -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre autour conduits PVC -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac - gaines techniques -	Etages - Vol 5 (PC R+1)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable - Sous dalles plastiques -	Etages - Vol 5 (PC R+1)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec poussières - -	Etages - Vol 5 (PC R+1)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - -	Etages - Vol 5 (PC R+1)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable - -	Etages - Vol 7 (local technique 1)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - plafond dernier étage (enduit + peinture) -	Etages - Vol 11 (PC R+3)	
P21	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable - enduit + peinture bordeaux -	Façade avant - Vol 16 (Façade avant)	
P22	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable - Gris + peinture beige et grise sur balcons -	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)	
P23	Façades	Murs	Enduit compact gris + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable - -	Façade droite - Vol 17 (Façade droite)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20874 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20874
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (SAS ext)

Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples avec poussières / Joint cassant gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + peintures multiples avec poussières + joint cassant gris non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20875 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20875
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20876 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20876
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise + matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20877 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20877
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Matériau plâtreux beige en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 14/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20878 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20878
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment + enduit platreux + peinture gouttelé jaunatre / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20879 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20879
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Sous face escalier / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples / Matériau plâtreux beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20880 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20880
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / limon escalier / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20881 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20881
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles plaque marbre marche + enduit contremarche / Vol 4 (PC RDC)

Description ITGA	Colle grise en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 14/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20882 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20882
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / enduit cimenteux entre plaque marbre et limon escalier / Vol 5 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit compact gris avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris avec poussières + peinture non séparable	META le 13/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20883 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20883
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Matériau beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + matériau beige non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20884 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20884
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 13/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20885 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20885
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + matériau compact gris hétérogène	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20886 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20886
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Rebouchage autour de conduits / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Enduit compact gris / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + enduit plâtreux blanc en vrac	META le 13/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20887 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20887
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment brut dalle pleine / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20888 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20888
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 5 (PC R+1)

Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20889 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20889
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (PC R+1)

Description ITGA	Ragréage gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20890 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20890
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit pulvérulant (réservation dans dalle) / Vol 5 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 13/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20891 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20891
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre + peinture blanche / Vol 5 (PC R+1)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20892 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20892
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (local technique 1)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac non séparable	META le 13/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20893 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20893
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 11 (PC R+3)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20894 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20894
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391021 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 16 (Façade avant)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20895 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20895
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391022 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 17 (Façade droite)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-20896 EN DATE DU 14/03/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-20917
Echantillon ITGA : IT071703-20896
Reçu au laboratoire le : 03/03/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001391
Dossier client	_0016800009_ LOT BRAS 2 - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 3 étages
Echantillon	002HD001391023 / Façades / Murs / enduit + peinture balcon / Vol 17 (Façade droite)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META le 14/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
