Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000600035_
Date du repérage :	03/07/2017
Désignation :	Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000600035_
Désignation :	Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	PALLUEL Matthieu
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)
Date de repérage	03/07/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 20/07/2017
A Riorges, le 20/07/2017



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°35 - Vol 2 (Dégagement)
Appartement n°35 - Vol 3 (Chambre 1)	Appartement n°35 - Vol 5 (Chambre 2)
Appartement n°35 - Vol 6 (Chambre 3)	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)
Appartement n°35 - Vol 8 (Sanitaires)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)
Appartement n°35 - Vol 10 (Salon)	Appartement n°35 - Vol 11 (Séjour)
Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°35	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Sanitaires) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Salon) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Cuisine) - Vol 14 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°35	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Sanitaires) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Salon) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Cuisine) - Vol 14 (W.C)	

Revêtement de sol	Appartement n°35	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Salon) - Vol 11 (Séjour) - Vol 12 (Cuisine) - Vol 14 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°35	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 10 (Salon) - Vol 12 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°35	Vol 8 (Sanitaires) - Vol 9 (SDB) - Vol 12 (Cuisine)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 12 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 12 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 12 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 14 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Sanitaires)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 12 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :
- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Appartement n°35	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Tablier collé au silicone
Appartement n°35 - Vol 13 (Balcon 1)	pièce non visée par le présent diagnostic	
Appartement n°35 - Vol 4 (Balcon 2)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°2 - 1 - 002LQ001395 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 10 (Salon) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Evier	Tampon bitumineux	S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ001395 n°2 - 1 - 002LQ001395 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 11 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 10 (Salon)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°35	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4							Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement n°35	Vol 11 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°4 - 1 - 002LQ001395 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée) - Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Salon) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	P4 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ001395 n°4 - 1 - 002LQ001395 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 14 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°7 - 1 - 002LQ001395 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 9 (SDB) - Vol 8 (Sanitaires) - Vol 12 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides)	S23 - S24 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ001395 n°7 - 1 - 002LQ001395 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	P12	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°12 - 1 - 002LQ001395 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces humides)	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ001395 n°12 - 1 - 002LQ001395 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	P13	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°13 - 1 - 002LQ001395 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 10 (Salon) - Vol 11 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (porteur pièces sèches)	S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ001395 n°13 - 1 - 002LQ001395 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	P3	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°3 - 1 - 002LQ001395 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Salon) - Vol 7 (Placard) - Vol 8 (Sanitaires) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces sèches)	S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ001395 n°3 - 1 - 002LQ001395 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 14 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°6 - 1 - 002LQ001395 n°6 - 2	P6	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plafonds pièces humides)	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ001395 n°6 - 1 - 002LQ001395 n°6 - 2	P6	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques pièces humides	P11	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°11 - 1 - 002LQ001395 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°1 - 1 - 002LQ001395 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau beige + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P10	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°10 - 1 - 002LQ001395 n°10 - 2	P10	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche)	P14	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°14 - 1 - 002LQ001395 n°14 - 2	P14	Colle beige + carrelage + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples jaunes + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°5 - 1 - 002LQ001395 n°5 - 2	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 14 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage Pièces humides	P8	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°8 - 1 - 002LQ001395 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine) - Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage Pièces humides	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ001395 n°8 - 1 - 002LQ001395 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 14 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine pièces humides	P9	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°9 - 1 - 002LQ001395 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 9 (SDB) - Vol 12 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine pièces humides	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ001395 n°9 - 1 - 002LQ001395 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 7 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P15	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°15 - 1 - 002LQ001395 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 11 (Séjour) - Vol 10 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LQ001395 n°15 - 1 - 002LQ001395 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 7 (Placard)	Revêtement de sol	Moquettes bleue + colle	P16	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°16 - 1 - 002LQ001395 n°16 - 2	P16	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage beige en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P17	Réalisation d'un prélevement		002LQ001395 n°17 - 1 - 002LQ001395 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°35	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Placard) - Vol 10 (Salon) - Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine pièces sèches	S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LQ001395 n°17 - 1 - 002LQ001395 n°17 - 2	P17	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 12 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 11 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 10 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 14 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°35	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°35	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + Ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°35	Appartement n°35 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°35	Appartement n°35 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°35 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002LQ001395

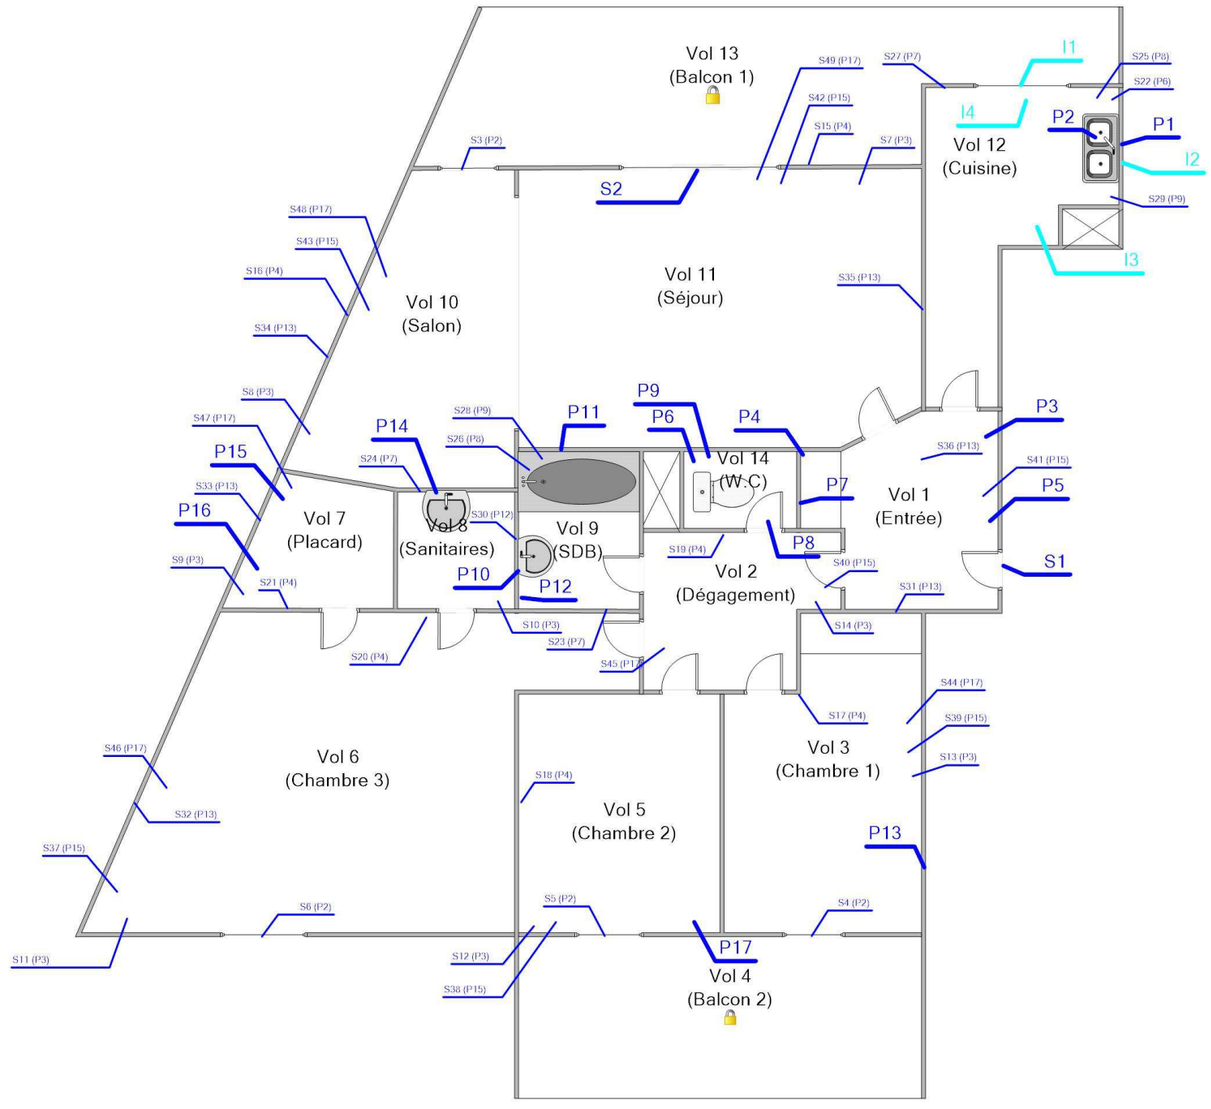

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage	03/07/2017	PALLUEL Matthieu

APPARTEMENT N°35 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LQ001395

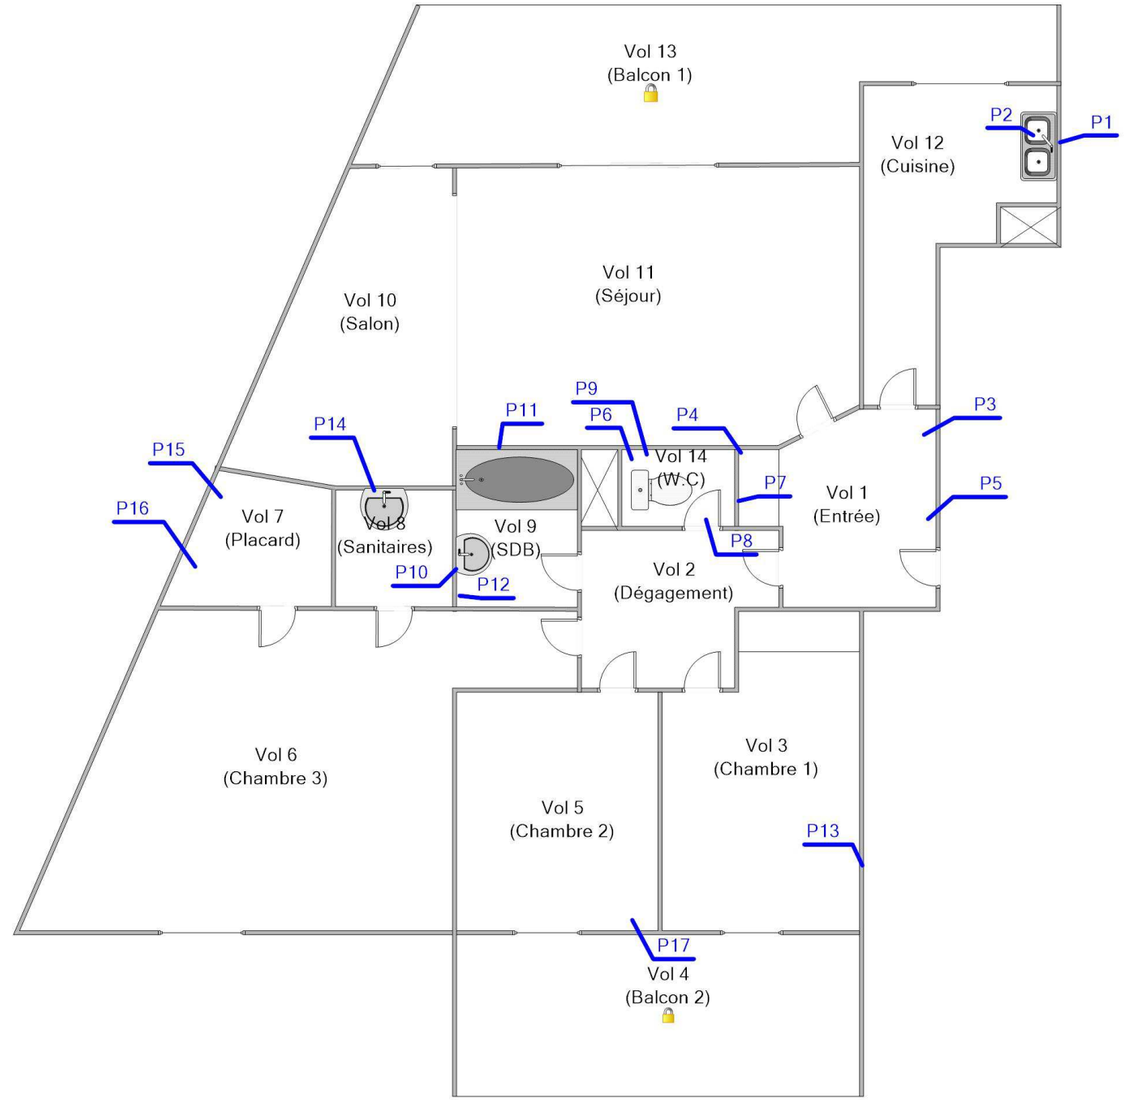

Légende

	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage	03/07/2017	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	I1
	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	I2
	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	I3
002LQ001395 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°35 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°35 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°35 - Vol 8 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°35 - Vol 8 (Sanitaires)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ001395 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°35 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001395 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°35 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

002LQ001395 n°1 - 1 (P1)

002LQ001395 n°1 - 2 (P1)

002LQ001395 n°2 - 1 (P2)

002LQ001395 n°2 - 2 (P2)

002LQ001395 n°3 - 1 (P3)

002LQ001395 n°3 - 2 (P3)

002LQ001395 n°4 - 1 (P4)

002LQ001395 n°4 - 2 (P4)

002LQ001395 n°5 - 1 (P5)

002LQ001395 n°5 - 2 (P5)

002LQ001395 n°6 - 1 (P6)

002LQ001395 n°6 - 2 (P6)

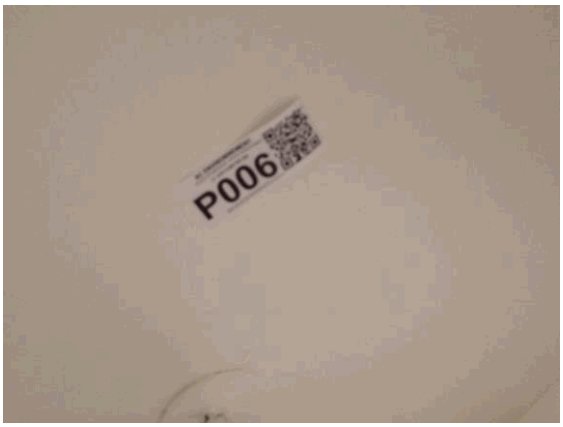

002LQ001395 n°7 - 1 (P7)

002LQ001395 n°7 - 2 (P7)

002LQ001395 n°8 - 1 (P8)

002LQ001395 n°8 - 2 (P8)

002LQ001395 n°9 - 1 (P9)

002LQ001395 n°9 - 2 (P9)

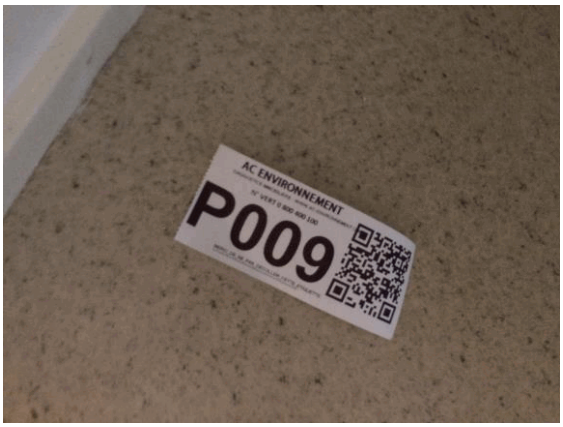

002LQ001395 n°10 - 1 (P10)

002LQ001395 n°10 - 2 (P10)

002LQ001395 n°11 - 1 (P11)

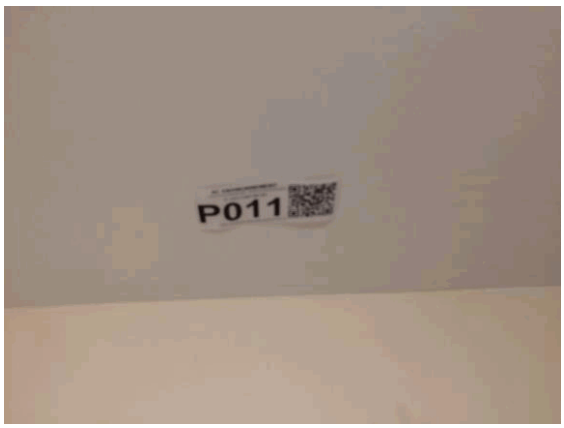

002LQ001395 n°11 - 2 (P11)

002LQ001395 n°12 - 1 (P12)

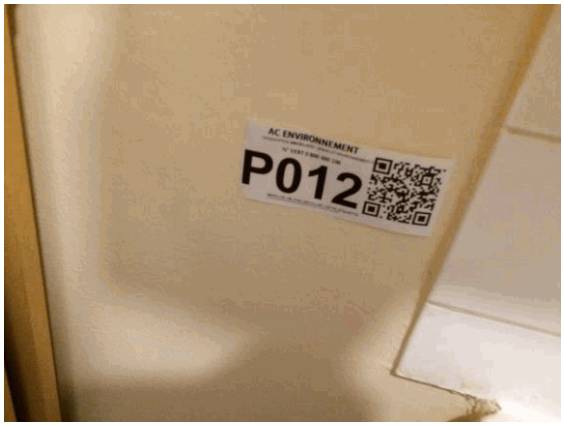

002LQ001395 n°12 - 2 (P12)

002LQ001395 n°13 - 1 (P13)

002LQ001395 n°13 - 2 (P13)

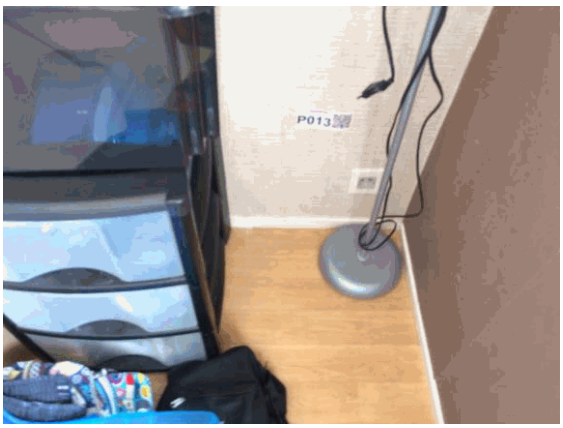

002LQ001395 n°14 - 1 (P14)

002LQ001395 n°14 - 2 (P14)

002LQ001395 n°15 - 1 (P15)

002LQ001395 n°15 - 2 (P15)

002LQ001395 n°16 - 1 (P16)

002LQ001395 n°16 - 2 (P16)

002LQ001395 n°17 - 1 (P17)

002LQ001395 n°17 - 2 (P17)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau beige + carrelage - -	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°35 - Vol 12 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°35 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°35 - Vol 14 (W.C)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 9 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 3 (Chambre 1)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage + matériau souple blanc - -	Appartement n°35 - Vol 8 (Sanitaires)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage beige en faible quantité - -	Appartement n°35 - Vol 7 (Placard)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable - -	Appartement n°35 - Vol 5 (Chambre 2)	

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66494 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0717-66494
		Réf. Commande Client :	002LQ001395

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22624	
Réf échantillon client : 002LQ001395001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 12 (Cuisine)		Description ITGA :	Colle grise / Matériau beige / Carrelage	
▸ Colle grise + matériau beige + carrelage	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22625	
Réf échantillon client : 002LQ001395002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 12 (Cuisine)		Description ITGA :	Tampon bitumineux noir	
▸ Tampon bitumineux noir	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -



Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66494 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22626	
Réf échantillon client : 002LQ001395003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Enduit beige en vrac / Peinture	
▸ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22627	
Réf échantillon client : 002LQ001395004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22628	
Réf échantillon client : 002LQ001395005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques souples jaunes + colle jaune / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche	
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA :	IT071707-22629	
Réf échantillon client : 002LQ001395006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (plafonds pièces humides) / Vol 14 (W.C)		Description ITGA :	Enduit beige en vrac / Peinture	
▸ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66494 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22630		
Réf échantillon client : 002LQ001395007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (pièces humides) / Vol 14 (W.C)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture		
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22631		
Réf échantillon client : 002LQ001395008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Pièces humides / Vol 14 (W.C)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22632		
Réf échantillon client : 002LQ001395009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 14 (W.C)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22633		
Réf échantillon client : 002LQ001395010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 9 (SDB)		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture		
▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66494 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22634		
Réf échantillon client : 002LQ001395011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques pièces humides / Vol 9 (SDB)		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture		
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22635		
Réf échantillon client : 002LQ001395012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces humides) / Vol 9 (SDB)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22636		
Réf échantillon client : 002LQ001395013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (porteur pièces sèches) / Vol 3 (Chambre 1)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22637		
Réf échantillon client : 002LQ001395014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche) / Vol 8 (Sanitaires)		Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Matériau souple blanc		
▸ Colle beige + carrelage + matériau souple blanc	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66494 EN DATE DU 19/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22638		
Réf échantillon client : 002LQ001395015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 7 (Placard)		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22639		
Réf échantillon client : 002LQ001395016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes bleue + colle / Vol 7 (Placard)		Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragréage beige en faible quantité		
▸ Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage beige en faible quantité	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600035_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 35 de type 5 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-22640		
Réf échantillon client : 002LQ001395017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 5 (Chambre 2)		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose		
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose non séparable	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
