Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE JEANNE D ARC
CP - Ville :	53150 MONTSURS
Référence client :	_0045000001_
Date du repérage :	27/07/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS
Référence client :	_0045000001_
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	Néant ()
Date de repérage	27/07/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 06/08/2016
A Riorges, le 06/08/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)
PC Cage 30 - Vol 3 (local vélo)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)
PC Cage 30 - Vol 5 (PC R+1)	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)
PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)
PC Cage 30 BIS - Vol 9 (local poubelle 1)	PC Cage 30 BIS - Vol 10 (local poubelle 2)
PC Cage 30 BIS - Vol 11 (PC R+1)	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)
Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)
Combles cage 30 BIS - Vol 15 (combles 1)	Combles cage 30 BIS - Vol 16 (combles 2)
Toiture - Vol 17 (toiture)	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)
Façade avant cage 30 BIS - Vol 19 (Façade avant cage 30 BIS)	Façade arrière cage 30 BIS - Vol 20 (Façade arrière cage 30 BIS)
Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Pignon gauche - Vol 22 (Pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

DOSSIER TECHNIQUE - 3/05/264RC/DTA - RENE CODVELLE
Consultant - 19/10/2005

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée) - Vol 2 (local poubelle) - Vol 3 (local vélo) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (SAS ext)	
Revêtement de mur	PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	
Revêtement de sol	PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée) - Vol 2 (local poubelle) - Vol 3 (local vélo) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (SAS ext)	
Façades	PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 7 (SAS ext)	
Plafond et faux-plafonds	PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	
Façades	PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (local poubelle 1) - Vol 10 (local poubelle 2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	
Plafond et faux-plafonds	PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	
Revêtement de sol	PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 9 (local poubelle 1) - Vol 10 (local poubelle 2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	

Revêtement de sol	Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	
Voies et réseaux divers	Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	
Toiture et étanchéité	Combles cage 30	Vol 14 (combles VMC)	
Toiture et étanchéité	Combles cage 30 BIS	Vol 15 (combles 1) - Vol 16 (combles 2)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 17 (toiture)	
Façades	Façade avant cage 30	Vol 18 (Façade avant cage 30)	
Façades	Façade avant cage 30 BIS	Vol 19 (Façade avant cage 30 BIS)	
Façades	Façade arrière cage 30 BIS	Vol 20 (Façade arrière cage 30 BIS)	
Façades	Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	
Façades	Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	

K

Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L

Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M

Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 7 (SAS ext)	Lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Vol 1 (Hall entrée)	Lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Vol 3 (local vélo)	Lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Vol 2 (local poubelle)	Lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
Vol 6 (PC R+1)	velux désenfumage	Innaccessible sans échelle grande hauteur ou échafaudage
Vol 12 (PC R+2)	velux	Innaccessible

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Des réserves sont émises sur les matériaux présents dans le local vélo cage 30. Local très encombré lors de la réalisation du diagnostic et impossible d'assurer la visite complète du volume.
Commentaire n°2 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :
Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.
Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.
Les élèments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.
Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées…)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)
Commentaire n°3 : Des réserves sont émises sur les matériaux présents autour du bâtiment. Végétation très dense autour du bâtiment empêchant une exhaustivité complète.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 7 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P2	Réalisation d'un prélevement	Dur grise	002HD001067 n°2 - 1 - 002HD001067 n°2 - 2	P2	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Dur grise	002HD001067 n°2 - 1 - 002HD001067 n°2 - 2	P2	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Dur grise	002HD001067 n°2 - 1 - 002HD001067 n°2 - 2	P2	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30	Vol 18 (Façade avant cage 30)	Murs	Enduits projetés	P28	Réalisation d'un prélevement	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30	Vol 18 (Façade avant cage 30)	Murs	Enduits projetés	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30 BIS	Vol 19 (Façade avant cage 30 BIS)	Murs	Enduits projetés	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30 BIS	Vol 20 (Façade arrière cage 30 BIS)	Murs	Enduits projetés	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Murs	Enduits projetés	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Enduit principal beige	002HD001067 n°28 - 1 - 002HD001067 n°28 - 2	P28	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30	Vol 18 (Façade avant cage 30)	Murs	Enduits projetés	P29	Réalisation d'un prélevement	marron	002HD001067 n°29 - 1 - 002HD001067 n°29 - 2	P29	Matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30	Vol 18 (Façade avant cage 30)	Murs	Enduits projetés	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	marron	002HD001067 n°29 - 1 - 002HD001067 n°29 - 2	P29	Matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 30 BIS	Vol 19 (Façade avant cage 30 BIS)	Murs	Enduits projetés	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	marron	002HD001067 n°29 - 1 - 002HD001067 n°29 - 2	P29	Matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 22 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	marron	002HD001067 n°29 - 1 - 002HD001067 n°29 - 2	P29	Matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Murs	sous face balcon	P30	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°30 - 1 - 002HD001067 n°30 - 2	P30	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Murs	sous face balcon	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD001067 n°30 - 1 - 002HD001067 n°30 - 2	P30	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélevement	gris soubassement	002HD001067 n°31 - 1 - 002HD001067 n°31 - 2	P31	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30 BIS	Vol 20 (Façade arrière cage 30 BIS)	Murs	Enduits projetés	S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	gris soubassement	002HD001067 n°31 - 1 - 002HD001067 n°31 - 2	P31	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P32	Réalisation d'un prélevement	souple blanc	002HD001067 n°32 - 1 - 002HD001067 n°32 - 2	P32	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cage 30	Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	souple blanc	002HD001067 n°32 - 1 - 002HD001067 n°32 - 2	P32	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 7 (SAS ext)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P3	Réalisation d'un prélevement	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau fibreux de type isolant (noir) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type tresse de fibres (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau fibreux de type isolant (noir) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type tresse de fibres (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau fibreux de type isolant (noir) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type tresse de fibres (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 7 (SAS ext)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P3	Réalisation d'un prélevement	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau souple de type joint (gris) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau souple de type joint (gris) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	joint souple noir / joint balai fibreux noir	002HD001067 n°3 - 1 - 002HD001067 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau souple de type joint (gris) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 2 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélevement	Sur porteur	002HD001067 n°5 - 1 - 002HD001067 n°5 - 2	P5	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 10 (local poubelle 2) - Vol 9 (local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S63 - S64 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Sur porteur	002HD001067 n°5 - 1 - 002HD001067 n°5 - 2	P5	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 3 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélevement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001067 n°6 - 1 - 002HD001067 n°6 - 2	P6	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 10 (local poubelle 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joint d'assemblage des parpaings	002HD001067 n°6 - 1 - 002HD001067 n°6 - 2	P6	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélevement	Sur porteur (sous peinture)	002HD001067 n°10 - 1 - 002HD001067 n°10 - 2	P10	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée) - Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10 - S4 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Sur porteur (sous peinture)	002HD001067 n°10 - 1 - 002HD001067 n°10 - 2	P10	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P11	Réalisation d'un prélevement	pailleté multicolore	002HD001067 n°11 - 1 - 002HD001067 n°11 - 2	P11	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 1 (Hall entrée) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P11 - S5 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	pailleté multicolore	002HD001067 n°11 - 1 - 002HD001067 n°11 - 2	P11	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	joint assemblage carreaux platre	P13	Réalisation d'un prélevement	Gaines techniques	002HD001067 n°13 - 1 - 002HD001067 n°13 - 2	P13	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	joint assemblage carreaux platre	P13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gaines techniques	002HD001067 n°13 - 1 - 002HD001067 n°13 - 2	P13	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Murs et cloisons	joint assemblage carreaux platre	S29 - S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gaines techniques	002HD001067 n°13 - 1 - 002HD001067 n°13 - 2	P13	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement	bandes placoplatre (gaines techniques)	002HD001067 n°14 - 1 - 002HD001067 n°14 - 2	P14	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	bandes placoplatre (gaines techniques)	002HD001067 n°14 - 1 - 002HD001067 n°14 - 2	P14	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	bandes placoplatre (gaines techniques)	002HD001067 n°14 - 1 - 002HD001067 n°14 - 2	P14	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 6 (PC R+1)	Menuiseries	velux désenfumage	I2			I2 - 1				Innaccessible sans échelle grande hauteur ou échafaudage
PC Cage 30	Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Limon escalier	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Limon escalier	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Murs et cloisons	Limon escalier	S26 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Limon escalier	P17	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 4 (PC RDC)	Murs et cloisons	Limon escalier	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Murs et cloisons	Limon escalier	S26 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD001067 n°17 - 1 - 002HD001067 n°17 - 2	P17 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit gratté beige	P18	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°18 - 1 - 002HD001067 n°18 - 2	P18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit gratté beige	P18 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001067 n°18 - 1 - 002HD001067 n°18 - 2	P18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 11 (PC R+1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéités	P22	Réalisation d'un prélevement	PVC blanche simple vitrage	002HD001067 n°22 - 1 - 002HD001067 n°22 - 2	P22	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 11 (PC R+1) - Vol 8 (PC RDC) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 10 (local poubelle 2) - Vol 9 (local poubelle 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéités	P22 - S37 - S38 - S39 - S40 - S58 - S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	PVC blanche simple vitrage	002HD001067 n°22 - 1 - 002HD001067 n°22 - 2	P22	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 2 (local poubelle)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéités	S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	PVC blanche simple vitrage	002HD001067 n°22 - 1 - 002HD001067 n°22 - 2	P22	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 12 (PC R+2)	Menuiseries	velux	I3			I3 - 1				Innaccessible
PC Cage 30 BIS	Vol 10 (local poubelle 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	P24	Réalisation d'un prélevement	semi dur blanche	002HD001067 n°24 - 1	P24	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 7 (SAS ext)	Faux plafonds	Lamelle bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Faux plafonds	Lamelle bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
PC Cage 30	Vol 3 (local vélo)	Faux plafonds	Lamelle bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
PC Cage 30	Vol 2 (local poubelle)	Faux plafonds	Lamelle bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous le faux plafond bois sans destruction de celui-ci
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Enduit gouttelé (rampant + droit)	002HD001067 n°12 - 1 - 002HD001067 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Enduit gouttelé (rampant + droit)	002HD001067 n°12 - 1 - 002HD001067 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement	Enduit gouttelé (rampant + droit)	002HD001067 n°12 - 1 - 002HD001067 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Enduit gouttelé (rampant + droit)	002HD001067 n°12 - 1 - 002HD001067 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélevement	Brut dans gaines techniques	002HD001067 n°16 - 1 - 002HD001067 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Brut dans gaines techniques	002HD001067 n°16 - 1 - 002HD001067 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélevement	Brut dans gaines techniques	002HD001067 n°16 - 1 - 002HD001067 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Brut dans gaines techniques	002HD001067 n°16 - 1 - 002HD001067 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Platre lissé + peinture verte	002HD001067 n°19 - 1 - 002HD001067 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P19 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Platre lissé + peinture verte	002HD001067 n°19 - 1 - 002HD001067 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Platre lissé + peinture verte	002HD001067 n°19 - 1 - 002HD001067 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P19 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Platre lissé + peinture verte	002HD001067 n°19 - 1 - 002HD001067 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment + peinture verte	P20	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier + palier	002HD001067 n°20 - 1 - 002HD001067 n°20 - 2	P20	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 11 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment + peinture verte	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Sous face escalier + palier	002HD001067 n°20 - 1 - 002HD001067 n°20 - 2	P20	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 12 (PC R+2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P23	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplatre dernier étage	002HD001067 n°23 - 1 - 002HD001067 n°23 - 2	P23 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 12 (PC R+2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P23	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplatre dernier étage	002HD001067 n°23 - 1 - 002HD001067 n°23 - 2	P23 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélevement	Carreaux 30 X 30 Rosatre	002HD001067 n°7 - 1 - 002HD001067 n°7 - 2	P7	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 7 (SAS ext)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement	Grise avec motif	002HD001067 n°1 - 1 - 002HD001067 n°1 - 2	P1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 2 (local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélevement	lissé	002HD001067 n°4 - 1 - 002HD001067 n°4 - 2	P4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 3 (local vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lissé	002HD001067 n°4 - 1 - 002HD001067 n°4 - 2	P4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 9 (local poubelle 1) - Vol 10 (local poubelle 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lissé	002HD001067 n°4 - 1 - 002HD001067 n°4 - 2	P4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lissé	002HD001067 n°4 - 1 - 002HD001067 n°4 - 2	P4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau souple de type MET	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S7 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau souple de type MET	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S31 - S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau souple de type MET	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S7 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S31 - S56 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001067 n°8 - 1 - 002HD001067 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 1 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélevement	gris	002HD001067 n°9 - 1 - 002HD001067 n°9 - 2	P9	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC) - Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S6 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris	002HD001067 n°9 - 1 - 002HD001067 n°9 - 2	P9	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S30 - S54 - S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris	002HD001067 n°9 - 1 - 002HD001067 n°9 - 2	P9	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 4 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélevement	Recharge dans gaines techniques	002HD001067 n°15 - 1 - 002HD001067 n°15 - 2	P15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30	Vol 5 (PC R+1) - Vol 6 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Recharge dans gaines techniques	002HD001067 n°15 - 1 - 002HD001067 n°15 - 2	P15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S27 - S48 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Recharge dans gaines techniques	002HD001067 n°15 - 1 - 002HD001067 n°15 - 2	P15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Revêtement de sol	Lés rosatre + colle jaune	P21	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°21 - 1 - 002HD001067 n°21 - 2	P21 Phase 1	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés rosatre + colle jaune	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001067 n°21 - 1 - 002HD001067 n°21 - 2	P21 Phase 1	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 30 BIS	Vol 8 (PC RDC)	Revêtement de sol	Lés rosatre + colle jaune	P21	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°21 - 1 - 002HD001067 n°21 - 2	P21 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 30 BIS	Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés rosatre + colle jaune	S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001067 n°21 - 1 - 002HD001067 n°21 - 2	P21 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	Revêtement de sol	joint assemblage des bordures	P25	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°25 - 1 - 002HD001067 n°25 - 2	P25	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	Revêtement de sol	joint assemblage des bordures	P25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002HD001067 n°25 - 1 - 002HD001067 n°25 - 2	P25	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 30	Vol 14 (combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P27	Réalisation d'un prélevement	laine + pare vapeur	002HD001067 n°27 - 1 - 002HD001067 n°27 - 2 - 002HD001067 n°27 - 3	P27 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles cage 30 BIS	Vol 15 (combles 1) - Vol 16 (combles 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S69 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	laine + pare vapeur	002HD001067 n°27 - 1 - 002HD001067 n°27 - 2 - 002HD001067 n°27 - 3	P27 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 30	Vol 14 (combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P27	Réalisation d'un prélevement	laine + pare vapeur	002HD001067 n°27 - 1 - 002HD001067 n°27 - 2 - 002HD001067 n°27 - 3	P27 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles cage 30 BIS	Vol 15 (combles 1) - Vol 16 (combles 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S69 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	laine + pare vapeur	002HD001067 n°27 - 1 - 002HD001067 n°27 - 2 - 002HD001067 n°27 - 3	P27 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 17 (toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S71			S71 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan Masse	Vol 13 (Plan de masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P26	Réalisation d'un prélevement		002HD001067 n°26 - 1 - 002HD001067 n°26 - 2	P26	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC Cage 30	PC Cage 30 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 30	PC Cage 30 - Plan de prélèvements
	PC Cage 30 BIS	PC Cage 30 BIS - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 30 BIS	PC Cage 30 BIS - Plan de prélèvements
	Combles cage 30	Combles cage 30 - Plan de repérage - Actions menées
	Combles cage 30 BIS	Combles cage 30 BIS - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan Masse	Plan Masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 30	Façade avant cage 30 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 30 BIS	Façade avant cage 30 BIS - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière cage 30 BIS	Façade arrière cage 30 BIS - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière cage 30	Façade arrière cage 30 - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC CAGE 30 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001067

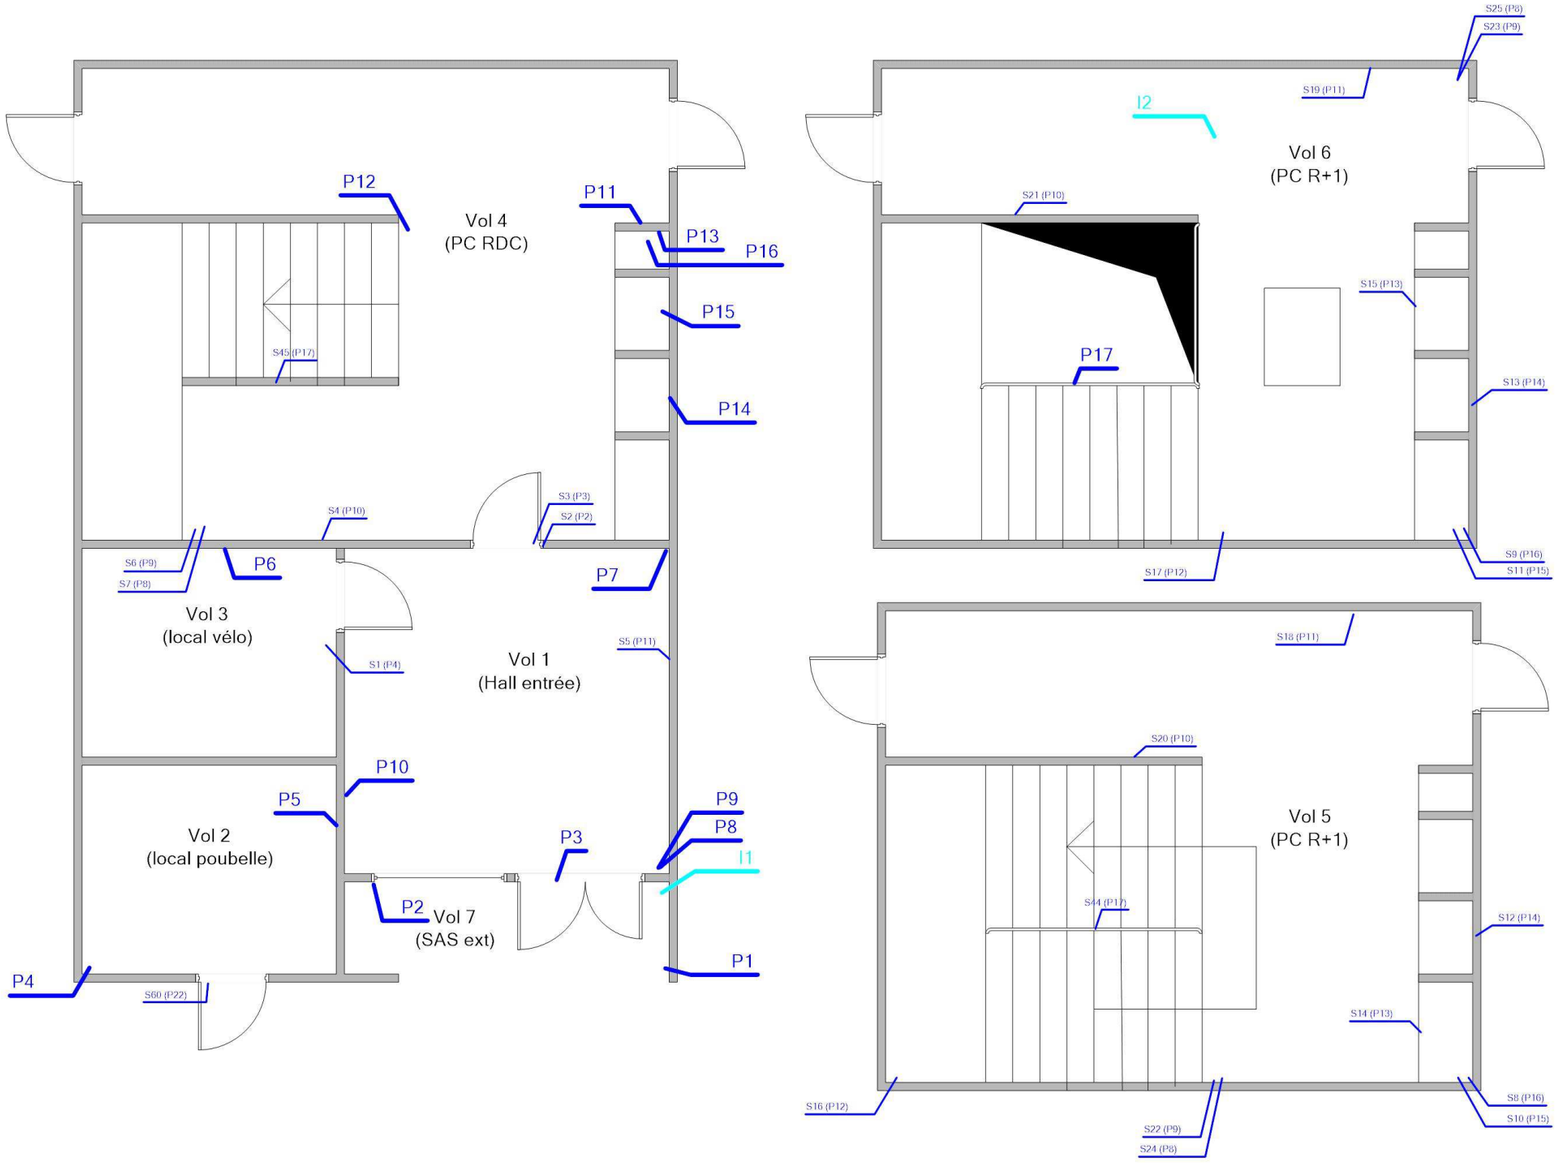

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 30 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001067

Légende

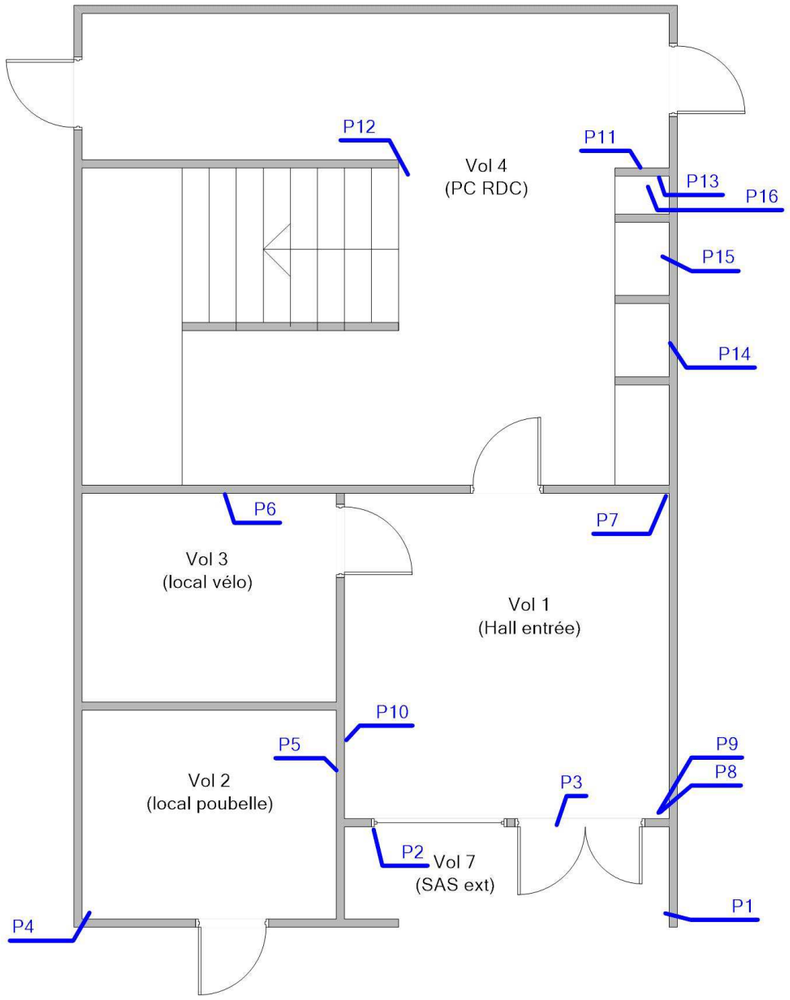

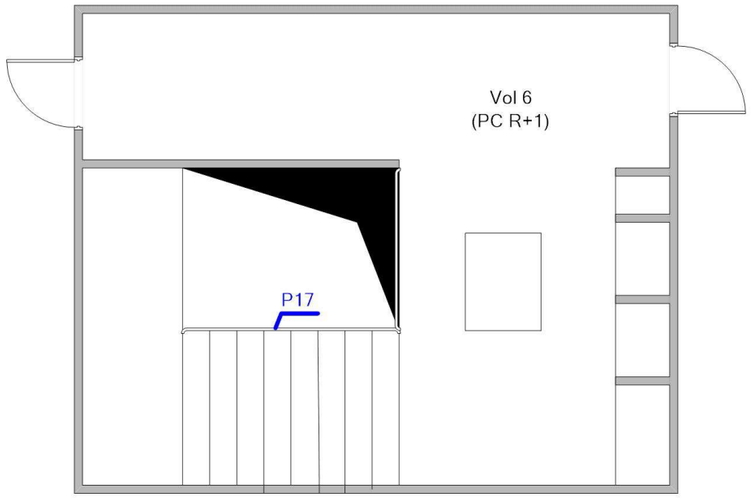

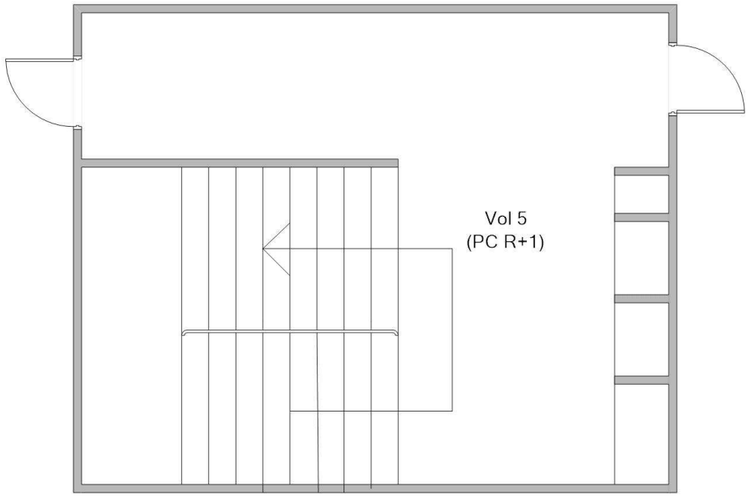

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 30 BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001067

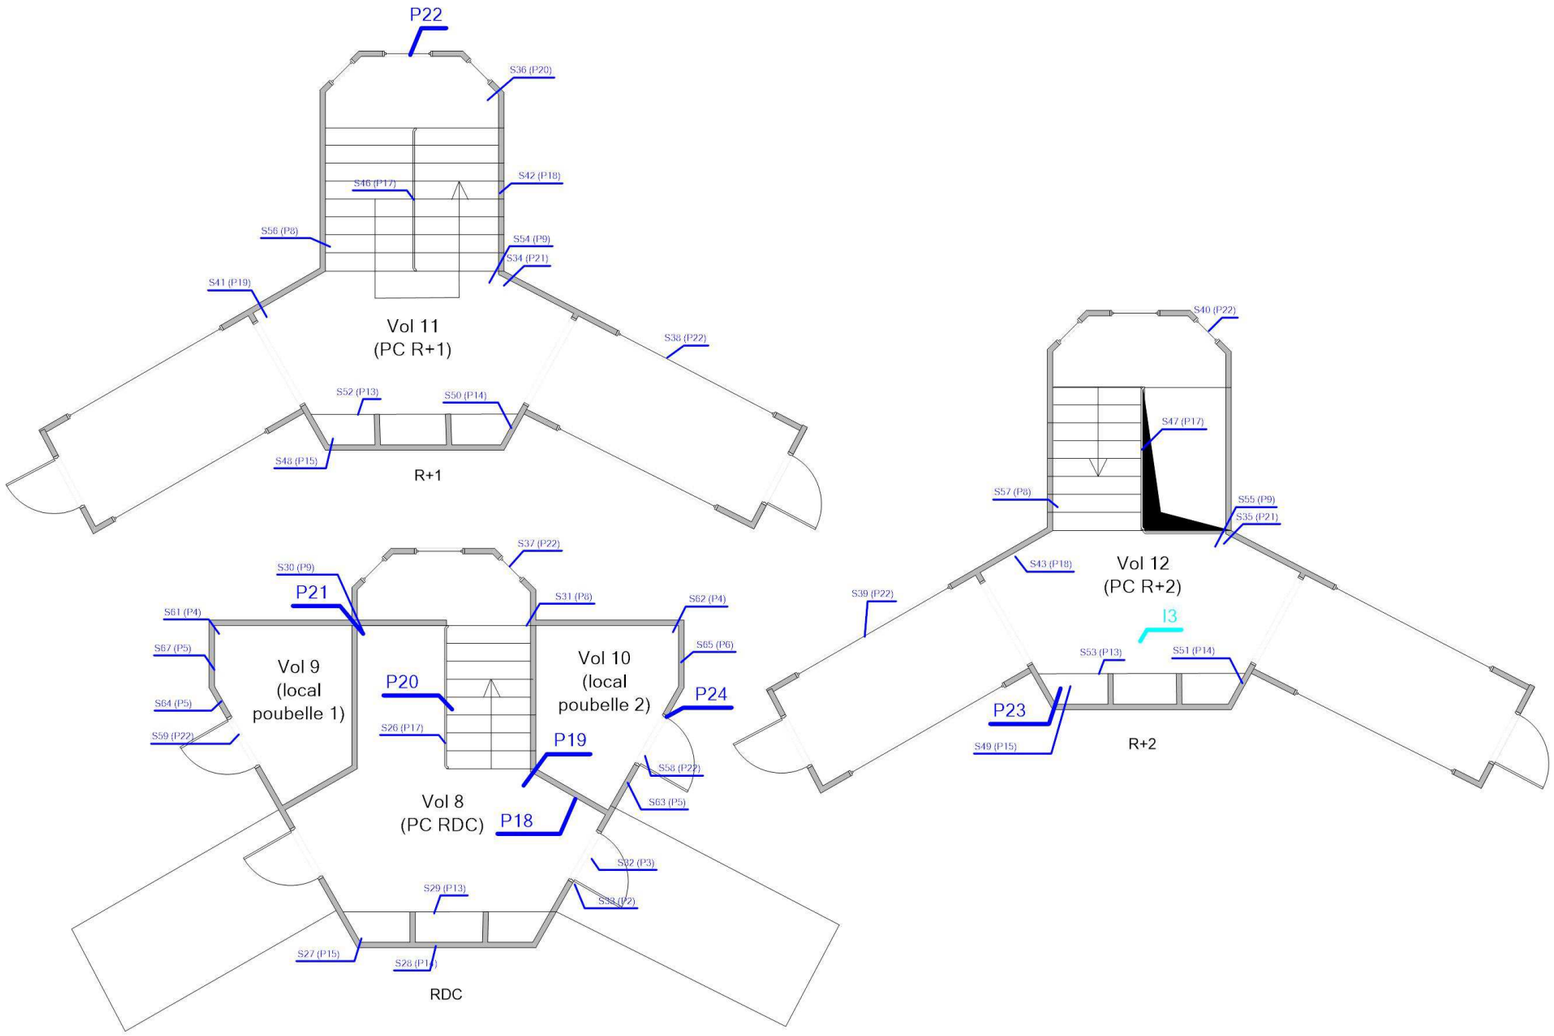

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 30 BIS - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001067

Légende

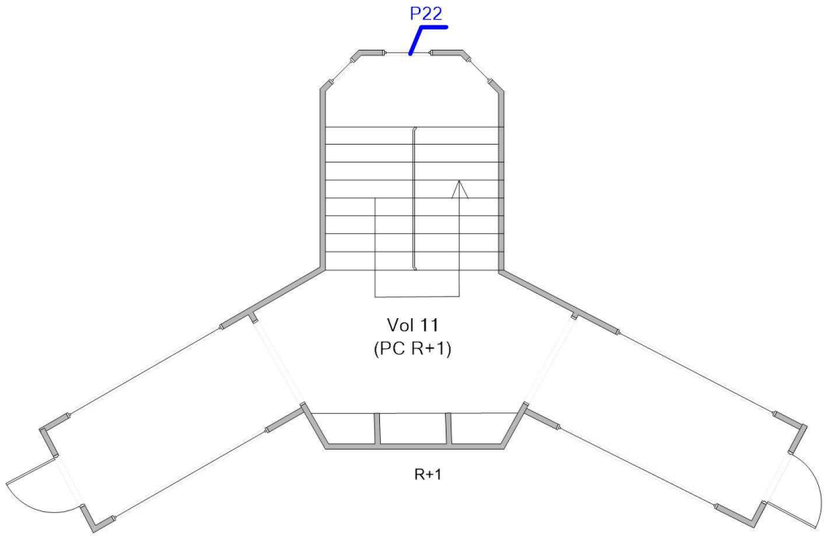

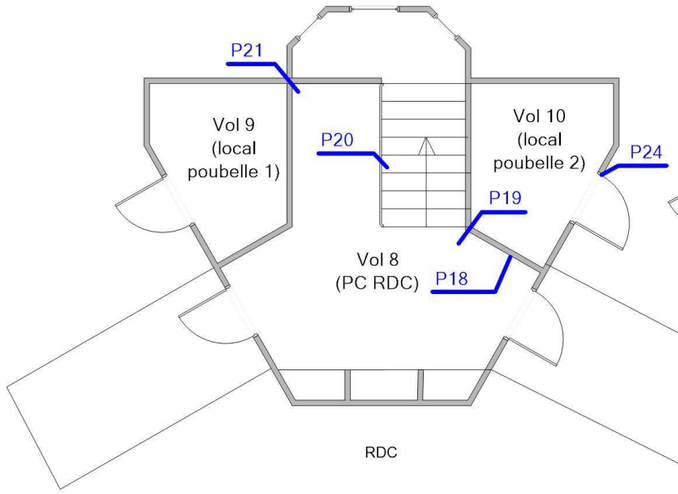

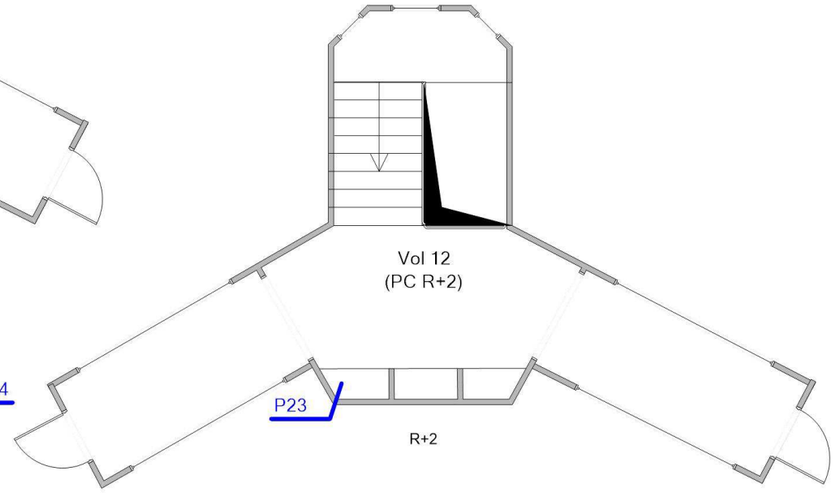

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

COMBLES CAGE 30 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

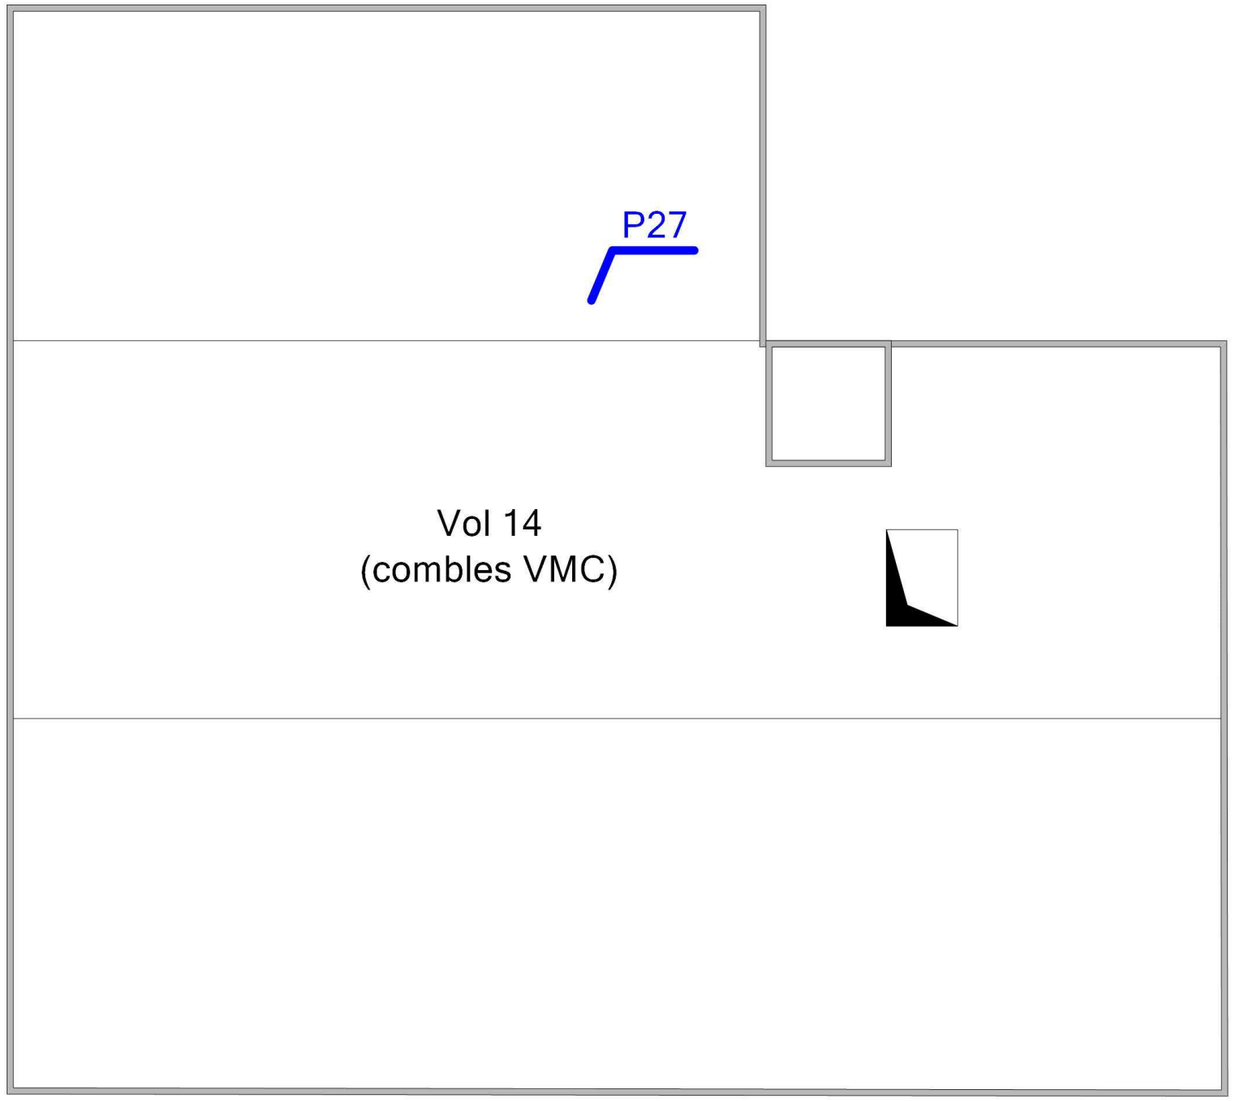

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

COMBLES CAGE 30 BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

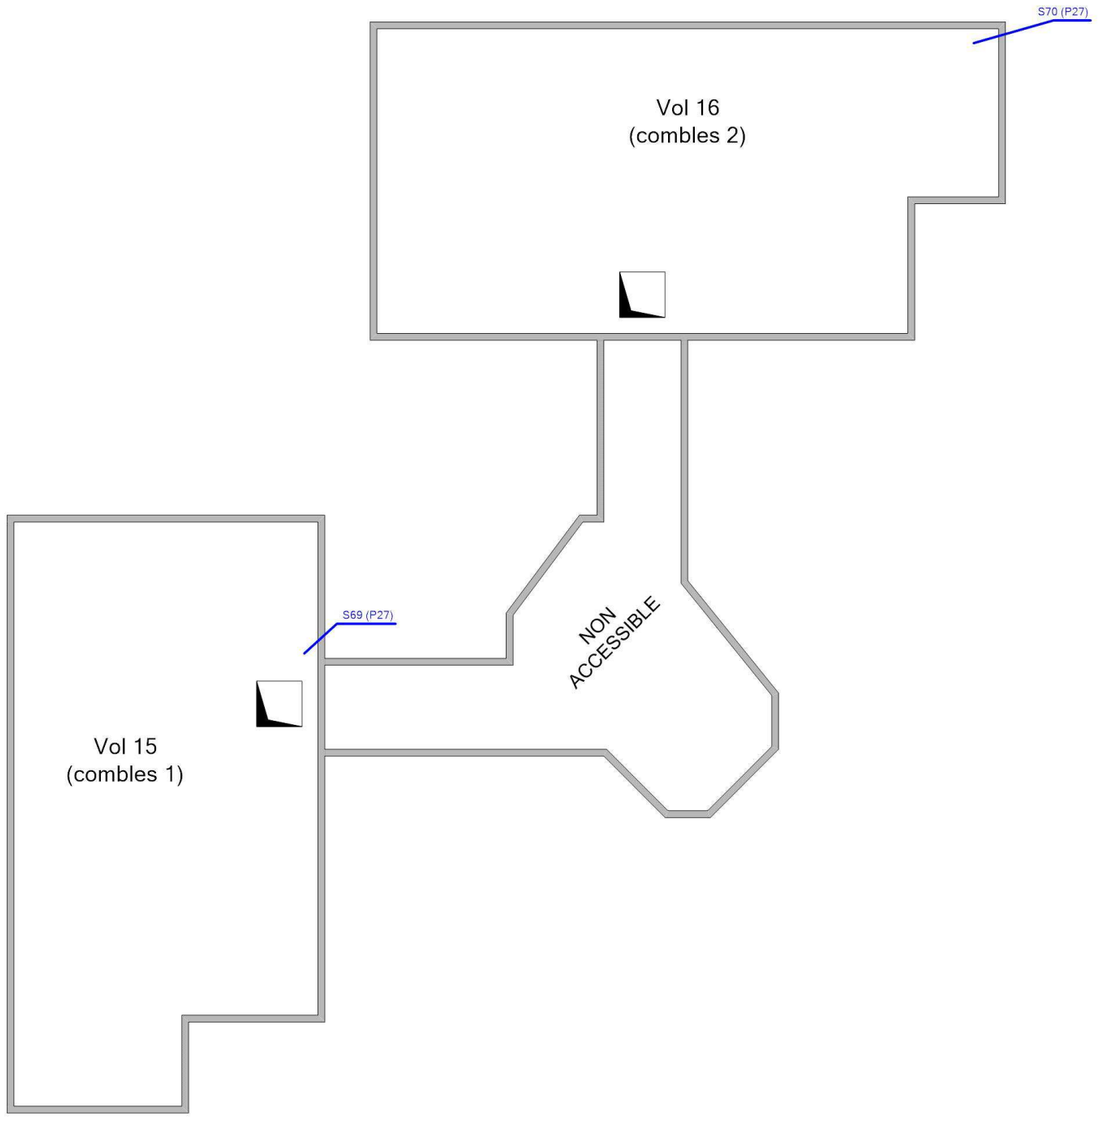

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

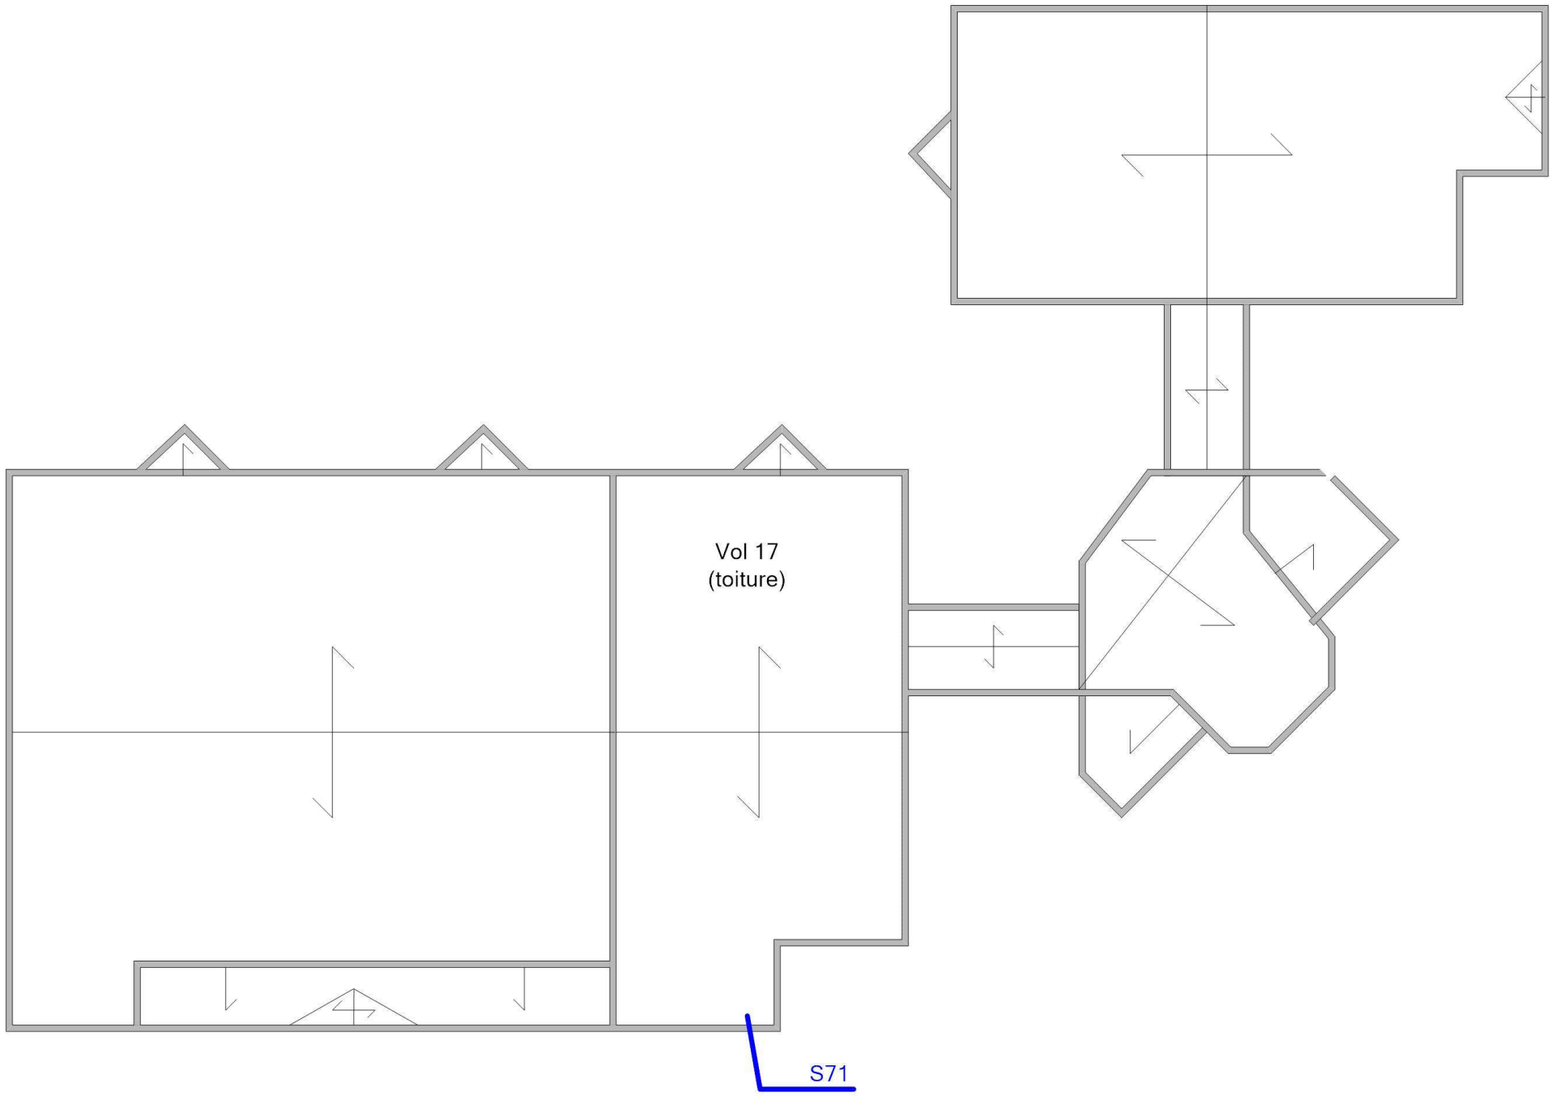

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

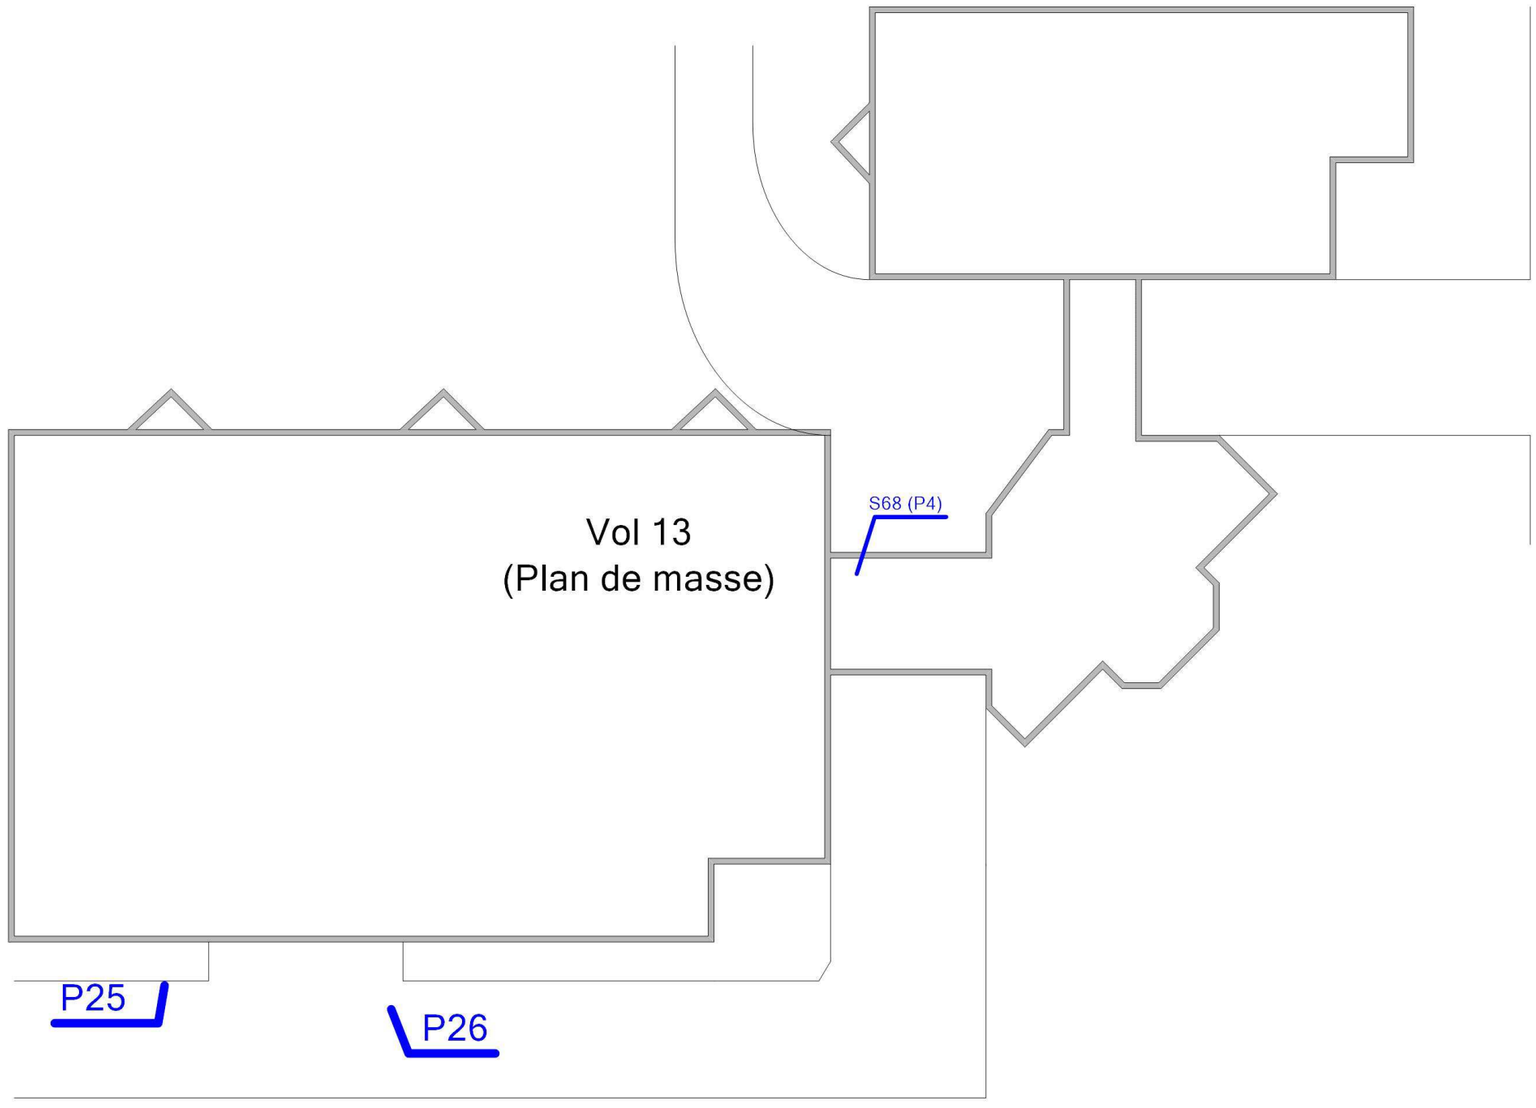

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT CAGE 30 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001067

Légende	
P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT CAGE 30 BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

Vol 19
(Façade avant cage 30 BIS)

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE CAGE 30 BIS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE CAGE 30 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001067

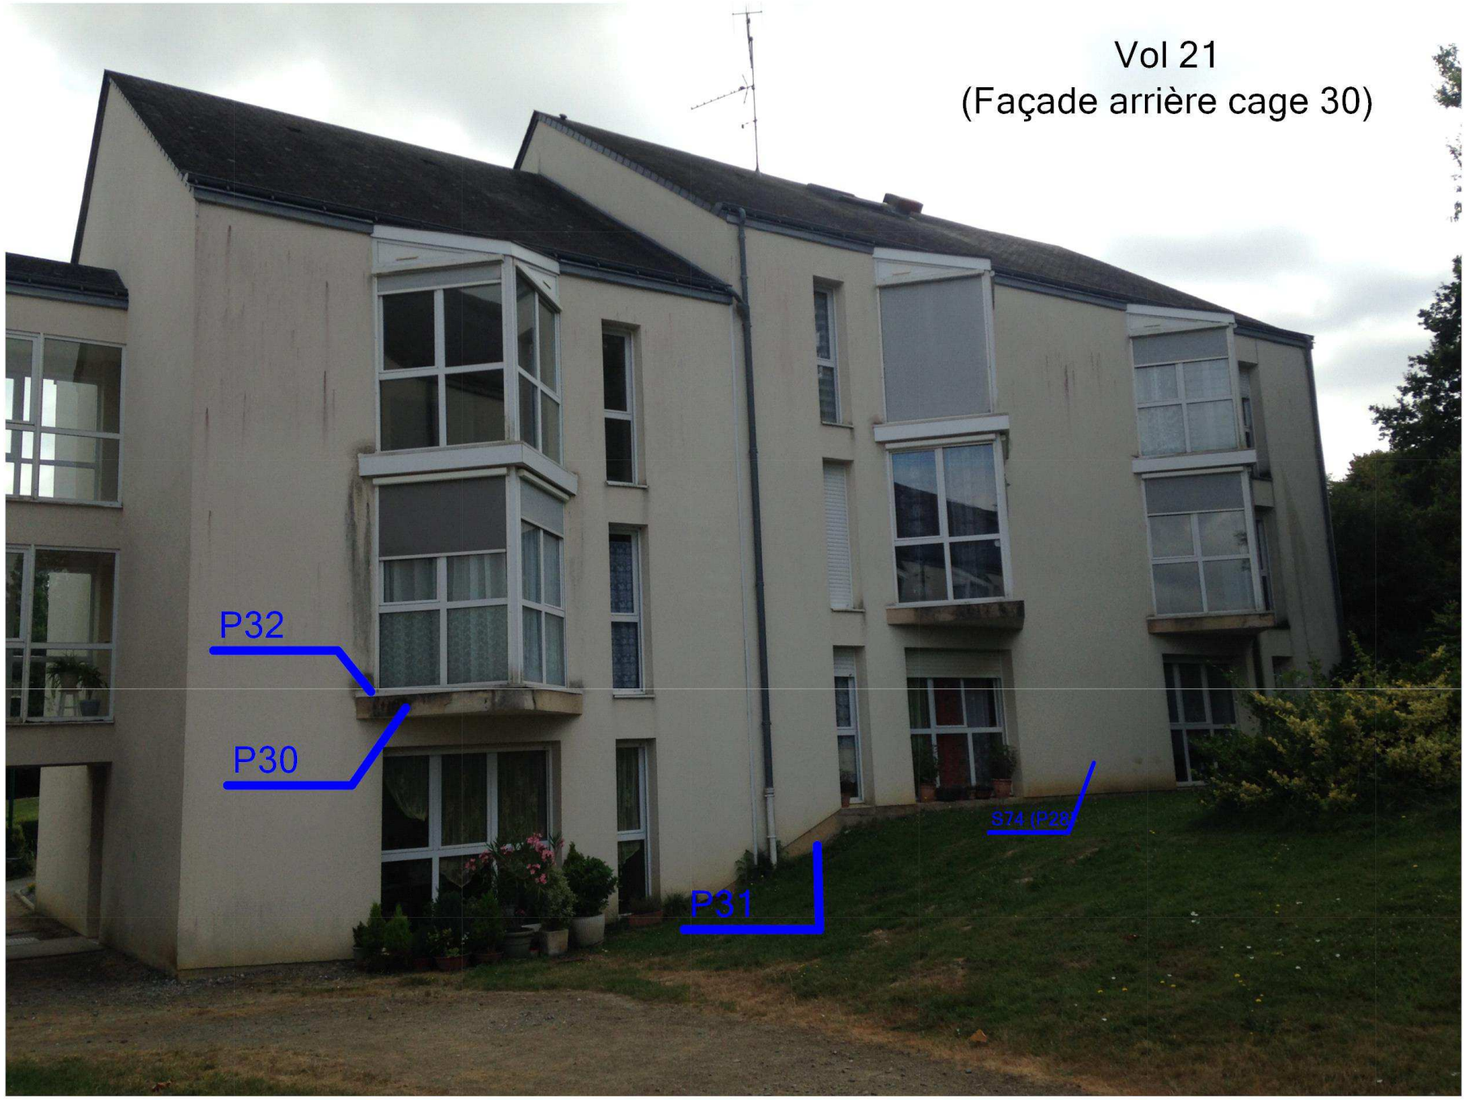

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001067

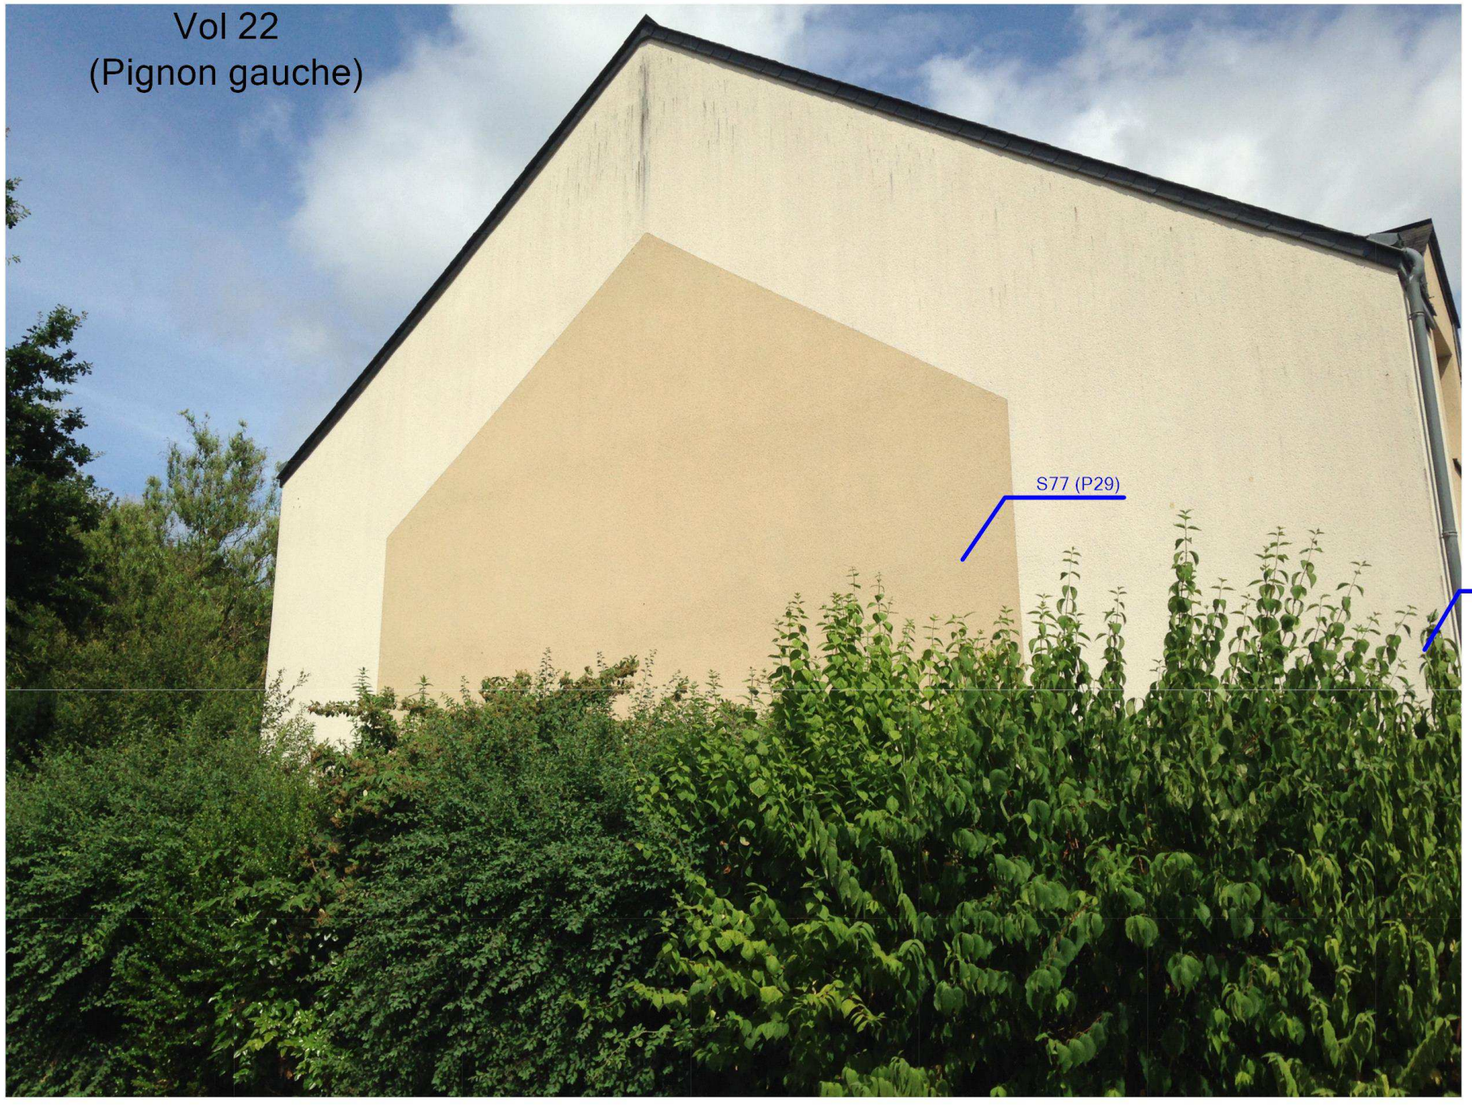

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE JEANNE D ARC 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°27 - 2 (P27)	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°27 - 3 (P27)	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°27 - 1 (P27)	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°30 - 2 (P30)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°30 - 1 (P30)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°31 - 2 (P31)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°31 - 1 (P31)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°32 - 1 (P32)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°32 - 2 (P32)	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°28 - 2 (P28)	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°28 - 1 (P28)	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°29 - 1 (P29)	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	Prélevement négatif
002HD001067 n°29 - 2 (P29)	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°1 - 2 (P1)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°1 - 1 (P1)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°2 - 2 (P2)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°2 - 1 (P2)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°3 - 2 (P3)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°3 - 1 (P3)	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001067 n°4 - 1 (P4)	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	Prélevement négatif
002HD001067 n°4 - 2 (P4)	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	Prélevement négatif
002HD001067 n°5 - 2 (P5)	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	Prélevement négatif
002HD001067 n°5 - 1 (P5)	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	Prélevement négatif
002HD001067 n°6 - 2 (P6)	PC Cage 30 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001067 n°6 - 1 (P6)	PC Cage 30 - Vol 3 (local vélo)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°7 - 1 (P7)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°7 - 2 (P7)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°8 - 1 (P8)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°8 - 2 (P8)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°9 - 1 (P9)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°9 - 2 (P9)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°10 - 1 (P10)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°10 - 2 (P10)	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001067 n°11 - 2 (P11)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°11 - 1 (P11)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°12 - 1 (P12)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°12 - 2 (P12)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°13 - 2 (P13)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°13 - 1 (P13)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°14 - 2 (P14)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°14 - 1 (P14)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°15 - 1 (P15)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°15 - 2 (P15)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°16 - 1 (P16)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°16 - 2 (P16)	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°17 - 2 (P17)	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001067 n°17 - 1 (P17)	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)	Prélevement négatif
	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	I1
	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)	I2

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°18 - 1 (P18)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°18 - 2 (P18)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°19 - 2 (P19)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°19 - 1 (P19)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°20 - 2 (P20)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°20 - 1 (P20)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°21 - 2 (P21)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°21 - 1 (P21)	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001067 n°22 - 2 (P22)	PC Cage 30 BIS - Vol 11 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001067 n°22 - 1 (P22)	PC Cage 30 BIS - Vol 11 (PC R+1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°23 - 1 (P23)	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001067 n°23 - 2 (P23)	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001067 n°24 - 1 (P24)	PC Cage 30 BIS - Vol 10 (local poubelle 2)	Prélevement négatif
	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)	I3

Référence	Localisation	Action
002HD001067 n°25 - 2 (P25)	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	Prélevement négatif
002HD001067 n°25 - 1 (P25)	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	Prélevement négatif
002HD001067 n°26 - 2 (P26)	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	Prélevement négatif
002HD001067 n°26 - 1 (P26)	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S71 - 1 (A71)	Toiture - Vol 17 (toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001067 n°1 - 2 (P1)

002HD001067 n°1 - 1 (P1)

002HD001067 n°2 - 2 (P2)

002HD001067 n°2 - 1 (P2)

002HD001067 n°3 - 2 (P3)

002HD001067 n°3 - 1 (P3)

002HD001067 n°4 - 1 (P4)

002HD001067 n°4 - 2 (P4)

002HD001067 n°5 - 2 (P5)

002HD001067 n°5 - 1 (P5)

002HD001067 n°6 - 2 (P6)

002HD001067 n°6 - 1 (P6)

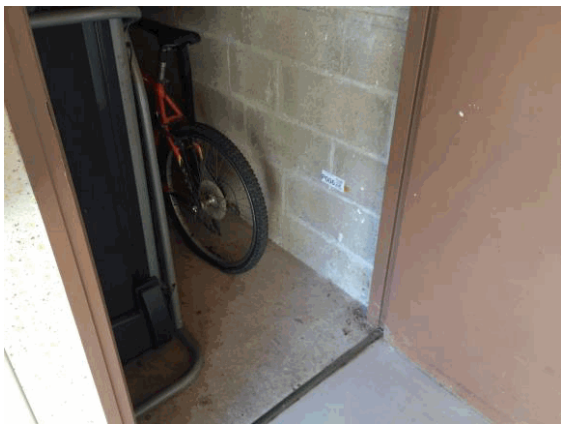

002HD001067 n°7 - 1 (P7)

002HD001067 n°7 - 2 (P7)

002HD001067 n°8 - 1 (P8)

002HD001067 n°8 - 2 (P8)

002HD001067 n°9 - 1 (P9)

002HD001067 n°9 - 2 (P9)

002HD001067 n°10 - 1 (P10)

002HD001067 n°10 - 2 (P10)

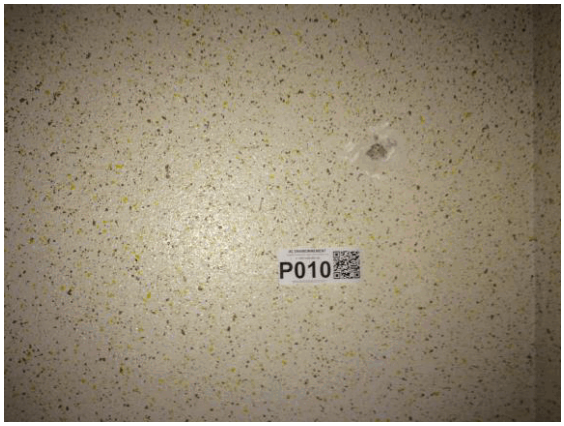

002HD001067 n°11 - 2 (P11)

002HD001067 n°11 - 1 (P11)

002HD001067 n°12 - 1 (P12)

002HD001067 n°12 - 2 (P12)

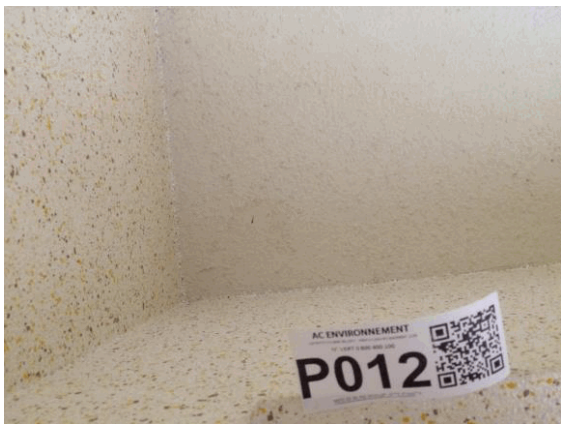

002HD001067 n°13 - 2 (P13)

002HD001067 n°13 - 1 (P13)

002HD001067 n°14 - 2 (P14)

002HD001067 n°14 - 1 (P14)

002HD001067 n°15 - 1 (P15)

002HD001067 n°15 - 2 (P15)

002HD001067 n°16 - 1 (P16)

002HD001067 n°16 - 2 (P16)

002HD001067 n°17 - 2 (P17)

002HD001067 n°17 - 1 (P17)

002HD001067 n°18 - 1 (P18)

002HD001067 n°18 - 2 (P18)

002HD001067 n°19 - 2 (P19)

002HD001067 n°19 - 1 (P19)

002HD001067 n°20 - 2 (P20)

002HD001067 n°20 - 1 (P20)

002HD001067 n°21 - 2 (P21)

002HD001067 n°21 - 1 (P21)

002HD001067 n°22 - 2 (P22)

002HD001067 n°22 - 1 (P22)

002HD001067 n°23 - 1 (P23)

002HD001067 n°23 - 2 (P23)

002HD001067 n°24 - 1 (P24)

002HD001067 n°25 - 2 (P25)

002HD001067 n°25 - 1 (P25)

002HD001067 n°26 - 2 (P26)

002HD001067 n°26 - 1 (P26)

002HD001067 n°27 - 2 (P27)

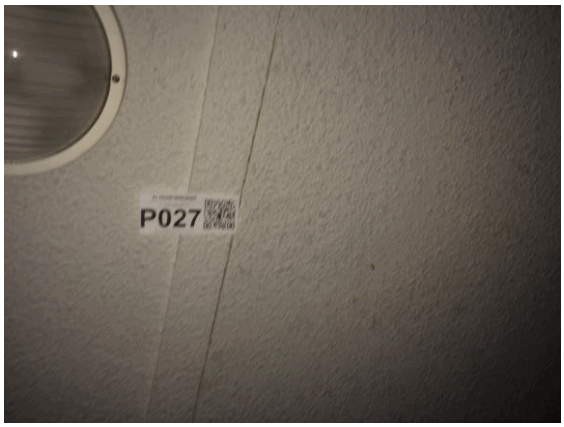

002HD001067 n°27 - 3 (P27)

002HD001067 n°27 - 1 (P27)

002HD001067 n°28 - 2 (P28)

002HD001067 n°28 - 1 (P28)

002HD001067 n°29 - 1 (P29)

002HD001067 n°29 - 2 (P29)

002HD001067 n°30 - 2 (P30)

002HD001067 n°30 - 1 (P30)

002HD001067 n°31 - 2 (P31)

002HD001067 n°31 - 1 (P31)

002HD001067 n°32 - 1 (P32)

002HD001067 n°32 - 2 (P32)

I1 - 1

I2 - 1

I3 - 1

S71 - 1 (A71)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Grise avec motif -	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	
P2	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces - Dur grise -	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	
P3 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau fibreux de type isolant (noir) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type tresse de fibres (marron) - joint souple noir / joint balai fibreux noir -	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	
P3 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (gris) (noir) - joint souple noir / joint balai fibreux noir -	PC Cage 30 - Vol 7 (SAS ext)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - lissé -	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Sur porteur -	PC Cage 30 - Vol 2 (local poubelle)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Joint d'assemblage des parpaings -	PC Cage 30 - Vol 3 (local vélo)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Carreaux 30 X 30 Rosatre -	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type MET - -	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge) - -	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) - gris -	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Sur porteur (sous peinture) -	PC Cage 30 - Vol 1 (Hall entrée)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) - pailleté multicolore -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P12 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Enduit gouttelé (rampant + droit) -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P12 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Enduit gouttelé (rampant + droit) -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Gaines techniques -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - bandes placoplatre (gaines techniques) -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Recharge dans gaines techniques -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P16 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Brut dans gaines techniques -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P16 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Brut dans gaines techniques -	PC Cage 30 - Vol 4 (PC RDC)	
P17 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) - -	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)	
P17 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) - -	PC Cage 30 - Vol 6 (PC R+1)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P19 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Platre lissé + peinture verte -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P19 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Platre lissé + peinture verte -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) - Sous face escalier + palier -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type dalle de sol (marron) - -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) - -	PC Cage 30 BIS - Vol 8 (PC RDC)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - PVC blanche simple vitrage -	PC Cage 30 BIS - Vol 11 (PC R+1)	

P23 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron - Plafond placoplatre dernier étage -	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)	
P23 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Plafond placoplatre dernier étage -	PC Cage 30 BIS - Vol 12 (PC R+2)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (blanc) - semi dur blanche -	PC Cage 30 BIS - Vol 10 (local poubelle 2)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - -	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	
P26	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) - -	Plan Masse - Vol 13 (Plan de masse)	
P27 Phase 1	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir) - laine + pare vapeur -	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)	
P27 Phase 2	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir) - laine + pare vapeur -	Combles cage 30 - Vol 14 (combles VMC)	
P28	Façades	Murs	Matériau semi-dur (blanc) - Enduit principal beige -	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	
P29	Façades	Murs	Matériau semi-dur (beige) - marron -	Façade avant cage 30 - Vol 18 (Façade avant cage 30)	
P30	Façades	Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) - -	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	
P31	Façades	Murs	Enduits projetés - gris soubassement -	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	
P32	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type joint (blanc) - souple blanc -	Façade arrière cage 30 - Vol 21 (Façade arrière cage 30)	

eurofins | Hygiène du Bâtiment

AC ENVIRONNEMENT
Monsieur David JOUSSELIN
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

Numéro de dossier : 16Y022428
Référence de dossier : Commande :002HD001067
Affaire / Dossier :
O.P.H. MAYENNE HABITAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 16Y022428-001 - Référence *002HD001067 n°1 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-002 - Référence *002HD001067 n°2 Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéïté Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-003 - Référence *002HD001067 n°3 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-004 - Référence *002HD001067 n°4 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-005 - Référence *002HD001067 n°5 Parois verticales Intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne 529 294 027 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

- N° 16Y022428-006 - Référence *002HD001067 n°6 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-007 - Référence *002HD001067 n°7 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-008 - Référence *002HD001067 n°8 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés gris + colle jaune Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-009 - Référence *002HD001067 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-010 - Référence *002HD001067 n°10 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 1*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-011 - Référence *002HD001067 n°11 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture décoratives Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-012 - Référence *002HD001067 n°12 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-013 - Référence *002HD001067 n°13 Parois verticales carreaux plâtre intérieures et enduits - Murs et cloisons - joint assemblage Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-014 - Référence *002HD001067 n°14 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-015 - Référence *002HD001067 n°15 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-016 - Référence *002HD001067 n°16 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-017 - Référence *002HD001067 n°17 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Limon escalier Volume n° 6*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-018 - Référence *002HD001067 n°18 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit gratté beige Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-019 - Référence *002HD001067 n°19 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-020 - Référence *002HD001067 n°20 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment + peinture verte Volume n° 8 ,*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-021 - Référence *002HD001067 n°21 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés rosâtre + colle jaune Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-022 - Référence *002HD001067 n°22 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d'étanchéités Volume n° 11*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-023 - Référence *002HD001067 n°23 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 12*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-024 - Référence *002HD001067 n°24 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Reprise d'étanchéïté Volume n° 10*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-025 - Référence *002HD001067 n°25 Revêtement de sol - Revêtement de sol - joint assemblage des bordures Volume n° 13*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-026 - Référence *002HD001067 n°26 Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche supérieure Volume n° 13*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-027 - Référence *002HD001067 n°27 Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 14*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-028 - Référence *002HD001067 n°28 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-029 - Référence *002HD001067 n°29 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-030 - Référence *002HD001067 n°30 Façades - Murs - sous face balcon Volume n° 21*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-031 - Référence *002HD001067 n°31 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 21*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022428-032 - Référence *002HD001067 n°32 Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéïté Volume n° 21*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne 529 294 027 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

ACCREDITATION
N° AB 1609
Portée disponible sur
https://www.pca.gov.pl/

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00
Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	16Y022428-001 - 002HD001067 n°1 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 7	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	16Y022428-002 - 002HD001067 n°2 Façades - Menuiseries - Reprise d''étanchéïté Volume n° 7	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	16Y022428-003 - 002HD001067 n°3 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d''étanchéité de la menuiserie Volume n° 7	Matériau fibreux de type isolant (noir) ; matériau de type colle (gris) ; matériau de type tresse de fibres (marron)(i)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type joint (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	16Y022428-004 - 002HD001067 n°4 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	16Y022428-005 - 002HD001067 n°5 Parois verticales Intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	16Y022428-006 - 002HD001067 n°6 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	16Y022428-007 - 002HD001067 n°7 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 1	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	16Y022428-008 - 002HD001067 n°8 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés gris + colle jaune Volume n° 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	16Y022428-009 - 002HD001067 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	16Y022428-010 - 002HD001067 n°10 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	16Y022428-011 - 002HD001067 n°11 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture décoratives Volume n° 4	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	16Y022428-012 - 002HD001067 n°12 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	16Y022428-013 - 002HD001067 n°13 Parois verticales carreaux plâtre intérieures et enduits - Murs et cloisons - joint assemblage Volume n° 4	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00 Page 4/8

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
014	16Y022428-014 - 002HD001067 n°14 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	16Y022428-015 - 002HD001067 n°15 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	16Y022428-016 - 002HD001067 n°16 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	16Y022428-017 - 002HD001067 n°17 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Limon escalier Volume n° 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
018	16Y022428-018 - 002HD001067 n°18 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit gratté beige Volume n° 8	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	16Y022428-019 - 002HD001067 n°19 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 8	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	16Y022428-020 - 002HD001067 n°20 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment + peinture verte Volume n° 8 ,	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	16Y022428-021 - 002HD001067 n°21 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés rosâtre + colle jaune Volume n° 8	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	16Y022428-022 - 002HD001067 n°22 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d''étanchéités Volume n° 11	Matériau souple de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00 Page 6/8

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
023	16Y022428-023 - 002HD001067 n°23 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 12	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(ii)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	16Y022428-024 - 002HD001067 n°24 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Reprise d''étanchéïté Volume n° 10	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	16Y022428-025 - 002HD001067 n°25 Revêtement de sol - Revêtement de sol - joint assemblage des bordures Volume n° 13	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	16Y022428-026 - 002HD001067 n°26 Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche supérieure Volume n° 13	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	16Y022428-027 - 002HD001067 n°27 Toiture et étanchéité - Elément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 14	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00 Page 7/8

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	16Y022428-028 - 002HD001067 n°28 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18	Matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	16Y022428-029 - 002HD001067 n°29 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18	Matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	16Y022428-030 - 002HD001067 n°30 Façades - Murs - sous face balcon Volume n° 21	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	16Y022428-031 - 002HD001067 n°31 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 21	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	16Y022428-032 - 002HD001067 n°32 Façades - Menuiseries - Reprise d''étanchéïté Volume n° 21	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (MET) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001419-01 Version du : 05.08.2016 11:00

Dossier N° : 16RI001789 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022428 - Commande :002HD001067Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITAT

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité du matériau de type tresse de fibres (marron) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(ii) La totalité du matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Validé et approuvé par :

Adrien Paliniewicz
Team Leader

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
Tél: +48 797365102 - Fax: +48 797365102 - Site Web: www.eurofins.com
