Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER
CP - Ville :	53230 COSSE LE VIVIEN
Référence client :	_00461000020000100010_
Date du repérage :	07/06/2016
Désignation :	Appartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER 53230 COSSE LE VIVIEN
Référence client :	_00461000020000100010_
Désignation :	Appartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	PALLUEL Matthieu
Accompagnateur :	Sans objet (Sans objet)
Date de repérage	07/06/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 3879 V2
Délivré le : 28/04/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 17/06/2016
A Riorges, le 17/06/2016



Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT 10 - Vol 1 (Séjour)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)
LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	LGT 10 - Vol 4 (SDB)
LGT 10 - Vol 5 (Chambre 2)	LGT 10 - Vol 6 (Chambre 3)
LGT 10 - Vol 7 (Entrée)	LGT 10 - Vol 8 (W.C)
LGT 10 - Vol 9 (Dégagement)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Revêtement de sol	LGT 10	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT 10	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 3)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Dégagement)	barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaire.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - LGT 10	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous la baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélevement	Noir	002LQ000078 n°1 - 1 - 002LQ000078 n°1 - 2	P1	Matériau souple (collant) (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Noir	002LQ000078 n°1 - 1 - 002LQ000078 n°1 - 2	P1	Matériau souple (collant) (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 10	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 7 (Entrée)	Menuiseries	joint d'étanchéïté	P6	Réalisation d'un prélevement	ensemble des joints de la porte d'entrée	002LQ000078 n°6 - 1 - 002LQ000078 n°6 - 2	P6	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 8 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement	cloison / doublage placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°8 - 1 - 002LQ000078 n°8 - 2	P8	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloison / doublage placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°8 - 1 - 002LQ000078 n°8 - 2	P8	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélevement	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ000078 n°13 - 1 - 002LQ000078 n°13 - 2	P13	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ000078 n°13 - 1 - 002LQ000078 n°13 - 2	P13	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 10	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 10	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 10	Vol 4 (SDB)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 10	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries		I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	P3	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°3 - 1 - 002LQ000078 n°3 - 2	P3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 8 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°3 - 1 - 002LQ000078 n°3 - 2	P3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 9 (Dégagement)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	P7	Réalisation d'un prélevement	plafond placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°7 - 1 - 002LQ000078 n°7 - 2	P7	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 7 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 1 (Séjour)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	plafond placoplatre pièces humides	002LQ000078 n°7 - 1 - 002LQ000078 n°7 - 2	P7	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélevement	Faïence Blanche	002LQ000078 n°2 - 1 - 002LQ000078 n°2 - 2	P2	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Réalisation d'un prélevement	faïence blanche	002LQ000078 n°12 - 1 - 002LQ000078 n°12 - 2	P12	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	faïence blanche	002LQ000078 n°12 - 1 - 002LQ000078 n°12 - 2	P12	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement	rose pièces humides	002LQ000078 n°4 - 1 - 002LQ000078 n°4 - 2	P4	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 8 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	rose pièces humides	002LQ000078 n°4 - 1 - 002LQ000078 n°4 - 2	P4	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélevement	dalles souples grises + Colle jaune	002LQ000078 n°5 - 1 - 002LQ000078 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	dalles souples grises + Colle jaune	002LQ000078 n°5 - 1 - 002LQ000078 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P5	Réalisation d'un prélevement	dalles souples grises + Colle jaune	002LQ000078 n°5 - 1 - 002LQ000078 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	dalles souples grises + Colle jaune	002LQ000078 n°5 - 1 - 002LQ000078 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélevement	rose pièces sèches	002LQ000078 n°9 - 1 - 002LQ000078 n°9 - 2	P9	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 9 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Entrée) - Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	rose pièces sèches	002LQ000078 n°9 - 1 - 002LQ000078 n°9 - 2	P9	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement	dalles souples 30x30 orange + Colle jaune	002LQ000078 n°10 - 1 - 002LQ000078 n°10 - 2	P10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement	dalles souples 30x30 orange + Colle jaune	002LQ000078 n°10 - 1 - 002LQ000078 n°10 - 2	P10 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélevement	Dalles souple 60x60 orange + Colle jaune	002LQ000078 n°11 - 1 - 002LQ000078 n°11 - 2	P11	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 10	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	barre de seuil	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 10	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	barre de seuil	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 10	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 10	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 10	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 10	LGT 10 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 10	LGT 10 - Plan de prélèvements

LGT 10 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000078

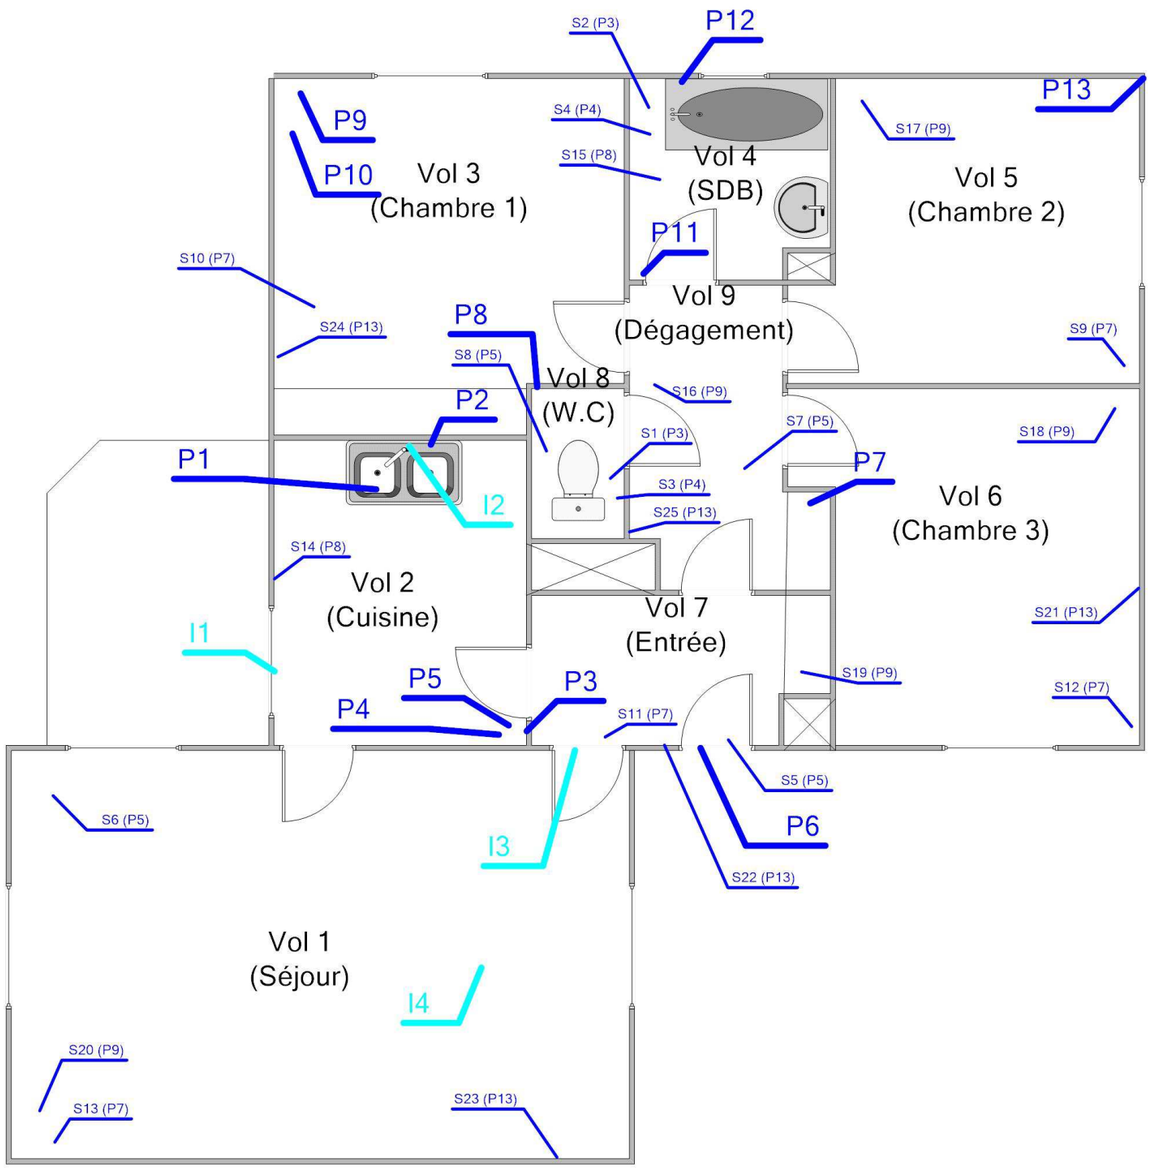

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER 53230 COSSE LE VIVIEN	Appartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage	07/06/2016	PALLUEL Matthieu

LGT 10 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002LQ000078

Légende

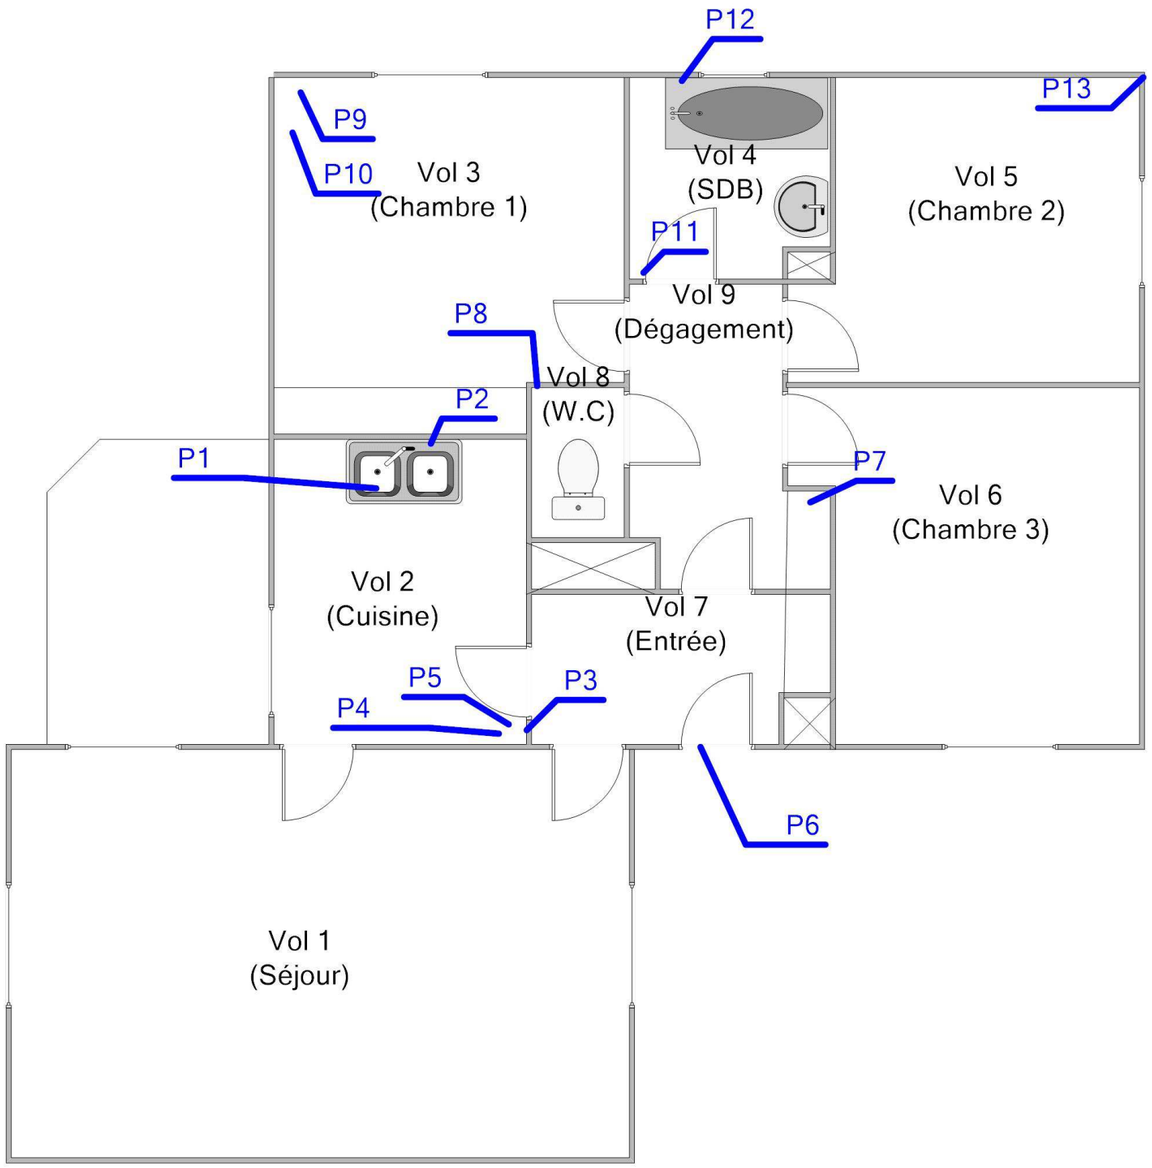

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER 53230 COSSE LE VIVIEN	Appartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage	07/06/2016	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000078 n°1 - 1 (P1)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°1 - 2 (P1)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°2 - 1 (P2)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°2 - 2 (P2)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°3 - 1 (P3)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°3 - 2 (P3)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°4 - 1 (P4)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°4 - 2 (P4)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°5 - 1 (P5)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°5 - 2 (P5)	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°6 - 1 (P6)	LGT 10 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°6 - 2 (P6)	LGT 10 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°7 - 1 (P7)	LGT 10 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°7 - 2 (P7)	LGT 10 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°8 - 1 (P8)	LGT 10 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°8 - 2 (P8)	LGT 10 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°9 - 1 (P9)	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°9 - 2 (P9)	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°10 - 1 (P10)	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°10 - 2 (P10)	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°11 - 1 (P11)	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°11 - 2 (P11)	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°12 - 1 (P12)	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°12 - 2 (P12)	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°13 - 1 (P13)	LGT 10 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000078 n°13 - 2 (P13)	LGT 10 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	LGT 10 - Vol 1 (Séjour)	I3
	LGT 10 - Vol 1 (Séjour)	I4

002LQ000078 n°1 - 1 (P1)

002LQ000078 n°1 - 2 (P1)

002LQ000078 n°2 - 1 (P2)

002LQ000078 n°2 - 2 (P2)

002LQ000078 n°3 - 1 (P3)

002LQ000078 n°3 - 2 (P3)

002LQ000078 n°4 - 1 (P4)

002LQ000078 n°4 - 2 (P4)

002LQ000078 n°5 - 1 (P5)

002LQ000078 n°5 - 2 (P5)

002LQ000078 n°6 - 1 (P6)

002LQ000078 n°6 - 2 (P6)

002LQ000078 n°7 - 1 (P7)

002LQ000078 n°7 - 2 (P7)

002LQ000078 n°8 - 1 (P8)

002LQ000078 n°8 - 2 (P8)

002LQ000078 n°9 - 1 (P9)

002LQ000078 n°9 - 2 (P9)

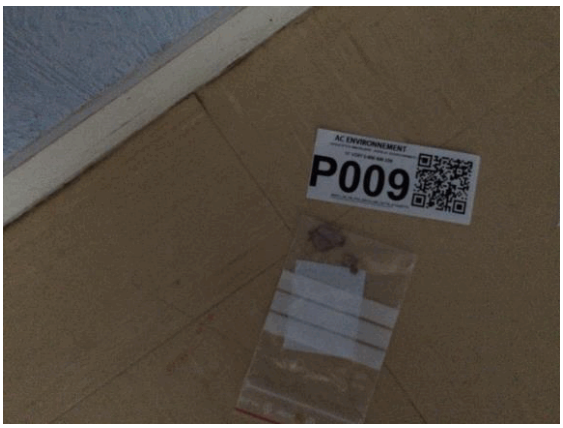

002LQ000078 n°10 - 1 (P10)

002LQ000078 n°10 - 2 (P10)

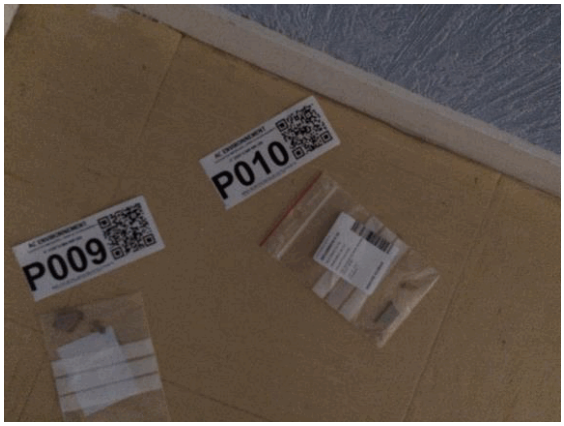

002LQ000078 n°11 - 1 (P11)

002LQ000078 n°11 - 2 (P11)

002LQ000078 n°12 - 1 (P12)

002LQ000078 n°12 - 2 (P12)

002LQ000078 n°13 - 1 (P13)

002LQ000078 n°13 - 2 (P13)

I1 - 1

I1 - 2

I2 - 1

I3 - 1

I4 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau souple (collant) (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) - Noir -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) - Faïence Blanche -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Plafond placoplatre pièces humides -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) - rose pièces humides -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) - dalles souples grises + Colle jaune -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) - dalles souples grises + Colle jaune -	LGT 10 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - ensemble des joints de la porte d'entrée -	LGT 10 - Vol 7 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - plafond placoplatre pièces humides -	LGT 10 - Vol 9 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - cloison / doublage placoplatre pièces humides -	LGT 10 - Vol 8 (W.C)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) - rose pièces sèches -	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) - dalles souples 30x30 orange + Colle jaune -	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) - dalles souples 30x30 orange + Colle jaune -	LGT 10 - Vol 3 (Chambre 1)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) - Dalles souple 60x60 orange + Colle jaune -	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) - faïence blanche -	LGT 10 - Vol 4 (SDB)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - cloison / doublage placoplatre pièces sèches -	LGT 10 - Vol 5 (Chambre 2)	

eurofins | Hygiène du Bâtiment

AC ENVIRONNEMENT
Matthieu PALLUEL
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

Numéro de dossier : 16Y016596
Référence de dossier : Commande : 002LQ000078
Affaire / Dossier :
O.P.H. MAYENNE HABITAT
SITE DE PRELEVEMENT / 26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIEN
Appartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 16Y016596-001 - Référence *002LQ000078 n°1 Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-002 - Référence *002LQ000078 n°10 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-003 - Référence *002LQ000078 n°11 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-004 - Référence *002LQ000078 n°12 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-005 - Référence *002LQ000078 n°13 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-006 - Référence *002LQ000078 n°2 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-007 - Référence *002LQ000078 n°3 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-008 - Référence *002LQ000078 n°4 I - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-009 - Référence *002LQ000078 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-010 - Référence *002LQ000078 n°6 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint d'étanchéïté Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-011 - Référence *002LQ000078 n°7 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 9*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-012 - Référence *002LQ000078 n°8 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 8*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 16Y016596-013 - Référence *002LQ000078 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au Capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne 529 294 027 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-EK-001674-01 Version du : 23.06.2016 18:31
Dossier N° : 16EK003450 Date de réception : 20.06.2016
Référence dossier : 16Y016596 - Commande :002LQ000078Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT / 26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIENAppartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	16Y016596-001 - 002LQ000078 n°1 Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux Volume n° 2	Matériau souple (collant) (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	16Y016596-002 - 002LQ000078 n°10 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 3	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	16Y016596-003 - 002LQ000078 n°11 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 4	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (2)	16Y016596-004 - 002LQ000078 n°12 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 4	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-EK-001674-01 Version du : 23.06.2016 18:31

Dossier N° : 16EK003450 Date de réception : 20.06.2016
Référence dossier : 16Y016596 - Commande :002LQ000078Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT / 26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIENAppartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	16Y016596-005 - 002LQ000078 n°13 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 5	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	16Y016596-006 - 002LQ000078 n°2 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 2	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	16Y016596-007 - 002LQ000078 n°3 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	16Y016596-008 - 002LQ000078 n°4 I - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	16Y016596-009 - 002LQ000078 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques Volume n° 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (3)	16Y016596-010 - 002LQ000078 n°6 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint d''étanchéïté Volume n° 7	Matériau souple de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-EK-001674-01 Version du : 23.06.2016 18:31

Dossier N° : 16EK003450 Date de réception : 20.06.2016
Référence dossier : 16Y016596 - Commande :002LQ000078Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT / 26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIENAppartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
011 (2)	16Y016596-011 - 002LQ000078 n°7 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Jonctions faux-plafond / structure Volume n° 9	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (2)	16Y016596-012 - 002LQ000078 n°8 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 8	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	16Y016596-013 - 002LQ000078 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 3	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (MET) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06: version 1 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse en garantissant la fiabilité du résultat.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. La quantité d'échantillon initiale n'était pas suffisante au regard de l'arrêté du 6 mars 2003, une contre-analyse sera impossible.
(3) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse en garantissant la fiabilité du résultat.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Paredes, PORTUGAL
Tél: +351 255 102 111 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.com

ACCREDITATION
N° L0705
Portée disponible sur
www.ipac.pt

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-EK-001674-01 Version du : 23.06.2016 18:31

Dossier N° : 16EK003450 Date de réception : 20.06.2016
Référence dossier : 16Y016596 - Commande :002LQ000078Affaire / Dossier :O.P.H. MAYENNE HABITATSITE DE PRELEVEMENT / 26 IMP DU VERGER - LOT DU VERGER - 53230 COSSE LE VIVIENAppartement n° 10 de type 4 situé au 01 er étage

Elsa Fonte
Técnico de Laboratório

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Paredes, PORTUGAL
Tél: +351 255 102 111 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.com

ACCREDITATION
N° L0705
Portée disponible sur
www.ipac.pt
