Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	88 RUE DES VALLEES - RES DU BOCAGE
CP - Ville :	53300 CHANTRIGNE
Référence client :	_00468000010000100004_
Date du repérage :	11/07/2016
Désignation :	Appartement n° 4 de type 3 situé au 02 ème étage

Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	88 RUE DES VALLEES - RES DU BOCAGE 53300 CHANTRIGNE
Référence client :	_00468000010000100004_
Désignation :	Appartement n° 4 de type 3 situé au 02 ème étage
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	JOUSSELIN David
Accompagnateur :	Néant ()
Date de repérage	11/07/2016

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3391 V2
Délivré le : 03/04/2015

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 21/07/2016
A Riorges, le 21/07/2016

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	LGT 4 - Vol 2 (Placard)
LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	LGT 4 - Vol 4 (Séjour)
LGT 4 - Vol 5 (Dégagement)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)
LGT 4 - Vol 7 (Chambre 1)	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)
LGT 4 - Vol 9 (WC)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 4	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (WC)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 4	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (WC)	
Revêtement de sol	LGT 4	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Placard) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (WC)	
Revêtement de mur	LGT 4	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :
Les garages ou caves considérer comme non visités.
Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
Les plénums de faux plafond.
Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P1	Réalisation d'un prélevement		002HD001055 n°1 - 1	P1	Matériau souple de type joint (polymérisé) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 3 (Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P1 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001055 n°1 - 1	P1	Matériau souple de type joint (polymérisé) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001055 n°2 - 1 - 002HD001055 n°2 - 2	P2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD001055 n°2 - 1 - 002HD001055 n°2 - 2	P2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélevement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001055 n°4 - 1 - 002HD001055 n°4 - 2	P4	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Placard) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD001055 n°4 - 1 - 002HD001055 n°4 - 2	P4	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint étanchéité porte d'entrée	P5	Réalisation d'un prélevement		002HD001055 n°5 - 1 - 002HD001055 n°5 - 2	P5	Matériau souple (polymérisé) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	joint entre carreaux platres (tablier baignoire)	P8	Réalisation d'un prélevement		002HD001055 n°8 - 1	P8	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	bois	S8			S8 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 4	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P6	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD001055 n°6 - 1 - 002HD001055 n°6 - 2	P6	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Placard) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD001055 n°6 - 1 - 002HD001055 n°6 - 2	P6	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P11	Réalisation d'un prélevement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD001055 n°11 - 1 - 002HD001055 n°11 - 2	P11	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 9 (WC) - Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD001055 n°11 - 1 - 002HD001055 n°11 - 2	P11	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P3	Réalisation d'un prélevement	grise (carreaux 15 X 15 Bleus)	002HD001055 n°3 - 1 - 002HD001055 n°3 - 2	P3	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélevement	gruse (carreaux 15 X 15 Bleus)	002HD001055 n°7 - 1	P7	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	gruse (carreaux 15 X 15 Bleus)	002HD001055 n°7 - 1	P7	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement	lino beige + colle jaune	002HD001055 n°9 - 1 - 002HD001055 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 9 (WC) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	lino beige + colle jaune	002HD001055 n°9 - 1 - 002HD001055 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement	lino beige + colle jaune	002HD001055 n°9 - 1 - 002HD001055 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 9 (WC) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	lino beige + colle jaune	002HD001055 n°9 - 1 - 002HD001055 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélevement	gris pièces humides	002HD001055 n°10 - 1	P10	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 9 (WC) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	gris pièces humides	002HD001055 n°10 - 1	P10	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement	Lino bleu + colle jaune	002HD001055 n°12 - 1 - 002HD001055 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Lino bleu + colle jaune	002HD001055 n°12 - 1 - 002HD001055 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 4	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélevement	Lino bleu + colle jaune	002HD001055 n°12 - 1 - 002HD001055 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Lino bleu + colle jaune	002HD001055 n°12 - 1 - 002HD001055 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélevement	gris pièces sèches	002HD001055 n°13 - 1	P13	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 4	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	gris pièces sèches	002HD001055 n°13 - 1	P13	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	LGT 4	LGT 4 - Plan de repérage - Actions menées
	LGT 4	LGT 4 - Plan de prélèvements

LGT 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002HD001055

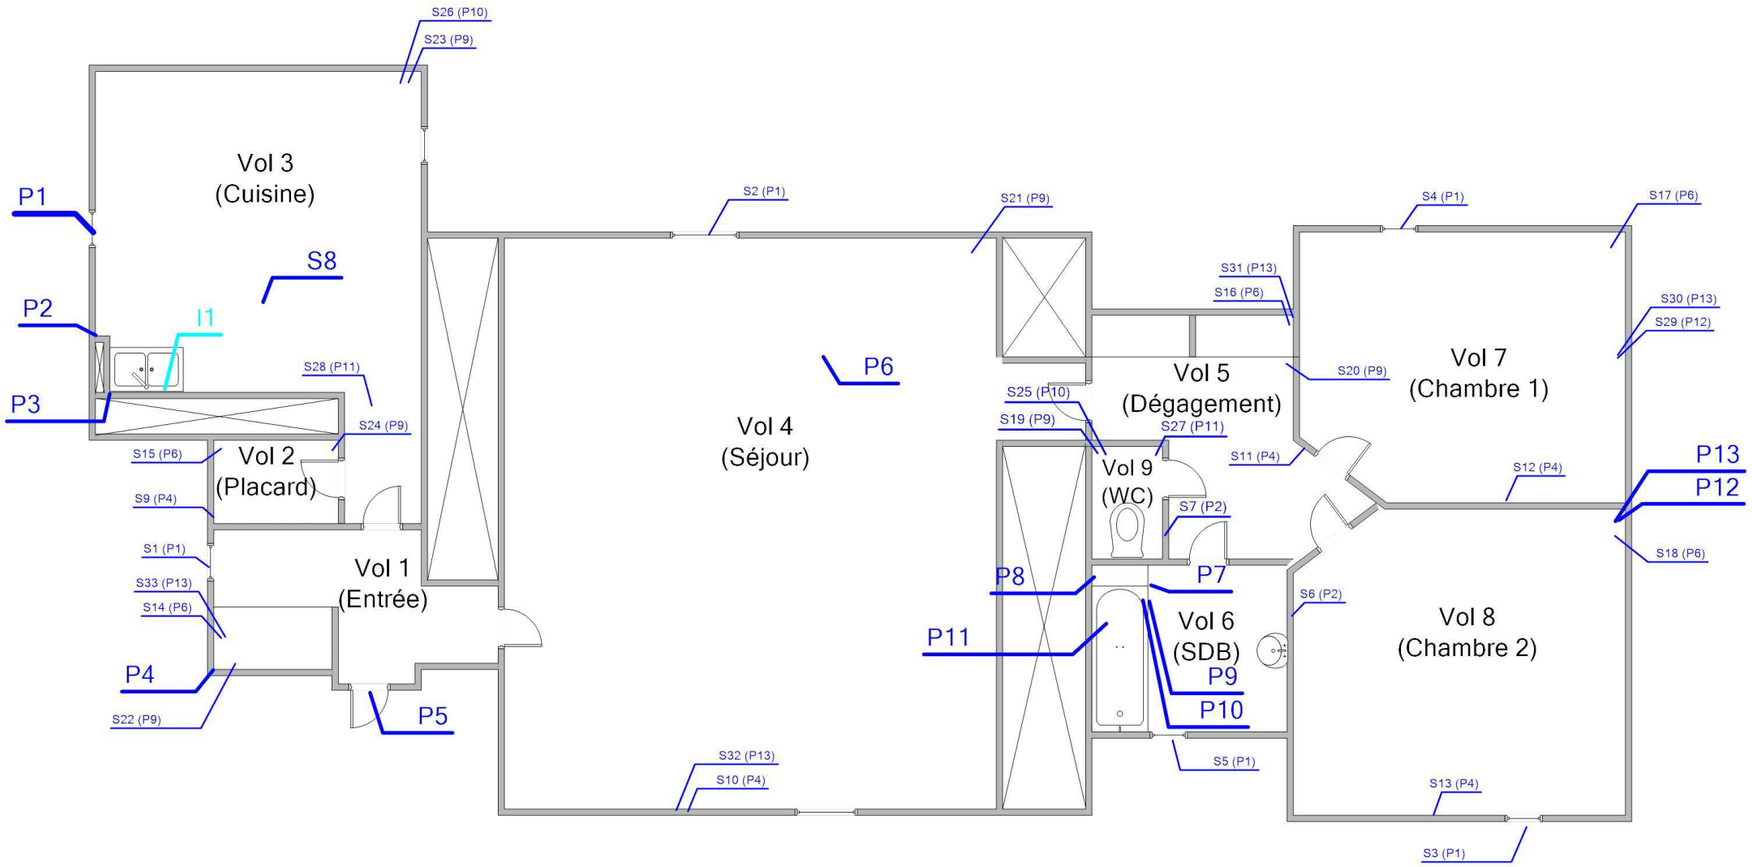

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
88 RUE DES VALLEES - RES DU BOCAGE 53300 CHANTRIGNE	Appartement n° 4 de type 3 situé au 02 ème étage	11/07/2016	JOUSSELIN David

LGT 4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001055

Légende

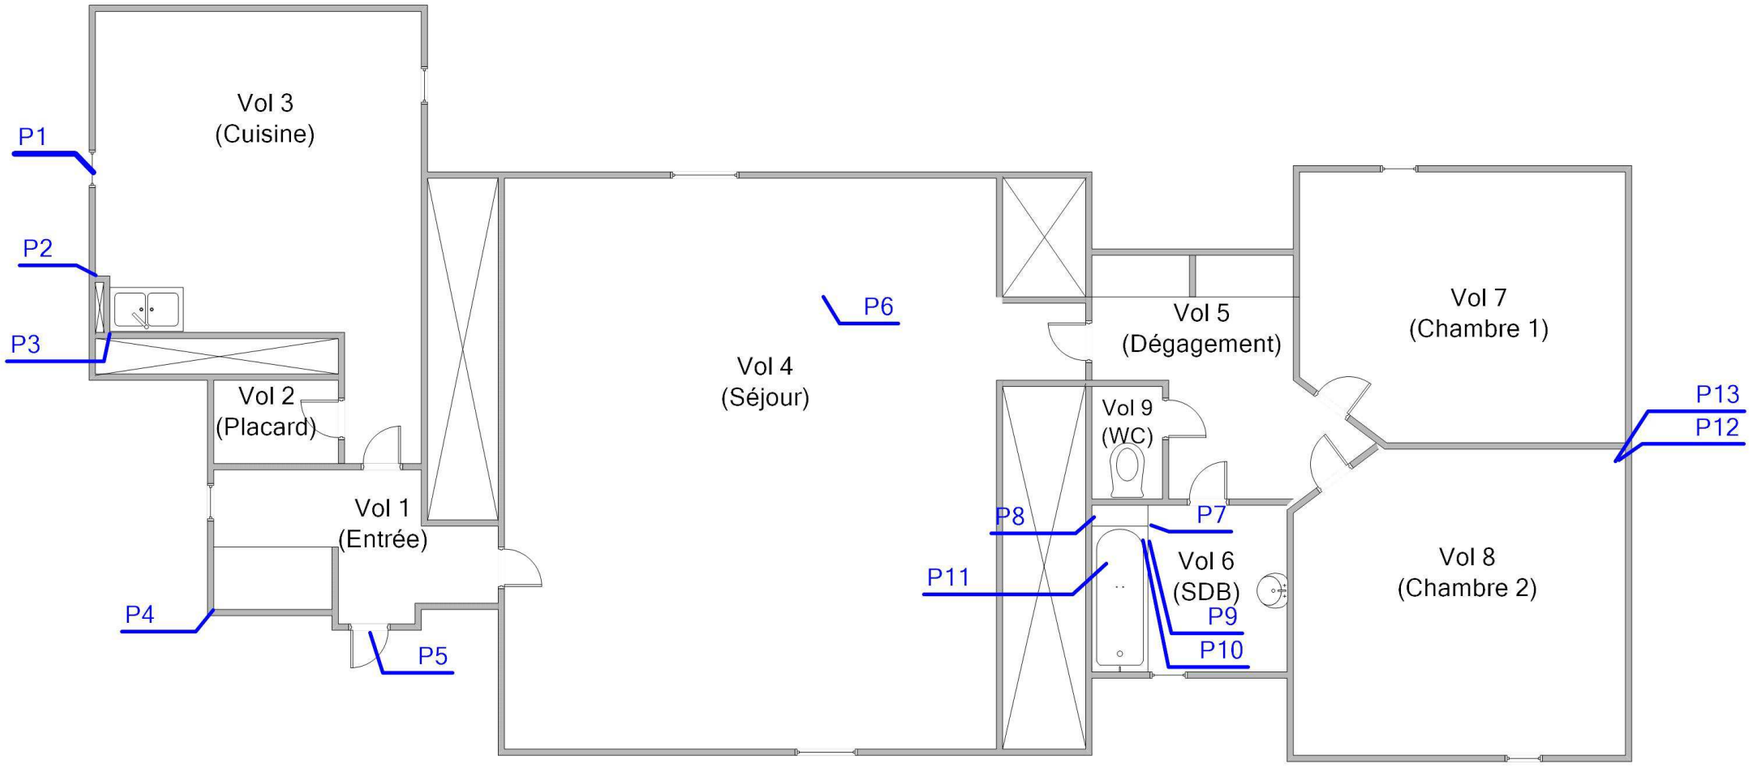

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
88 RUE DES VALLEES - RES DU BOCAGE 53300 CHANTRIGNE	Appartement n° 4 de type 3 situé au 02 ème étage	11/07/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001055 n°1 - 1 (P1)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001055 n°2 - 1 (P2)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001055 n°2 - 2 (P2)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001055 n°3 - 1 (P3)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001055 n°3 - 2 (P3)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
S8 - 1 (A8)	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001055 n°4 - 1 (P4)	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001055 n°4 - 2 (P4)	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001055 n°5 - 1 (P5)	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001055 n°5 - 2 (P5)	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001055 n°6 - 1 (P6)	LGT 4 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001055 n°6 - 2 (P6)	LGT 4 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001055 n°7 - 1 (P7)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°8 - 1 (P8)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°9 - 1 (P9)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°9 - 2 (P9)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°10 - 1 (P10)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°11 - 1 (P11)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°11 - 2 (P11)	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001055 n°12 - 1 (P12)	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001055 n°12 - 2 (P12)	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001055 n°13 - 1 (P13)	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	I1

002HD001055 n°1 - 1 (P1)

002HD001055 n°2 - 1 (P2)

002HD001055 n°2 - 2 (P2)

002HD001055 n°3 - 1 (P3)

002HD001055 n°3 - 2 (P3)

S8 - 1 (A8)

002HD001055 n°4 - 1 (P4)

002HD001055 n°4 - 2 (P4)

002HD001055 n°5 - 1 (P5)

002HD001055 n°5 - 2 (P5)

002HD001055 n°6 - 1 (P6)

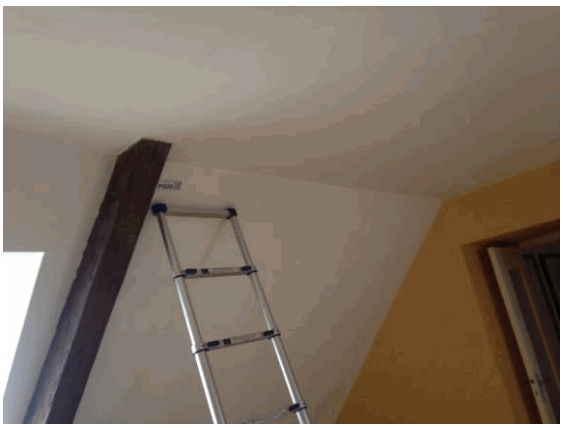

002HD001055 n°6 - 2 (P6)

002HD001055 n°7 - 1 (P7)

002HD001055 n°8 - 1 (P8)

002HD001055 n°9 - 1 (P9)

002HD001055 n°9 - 2 (P9)

002HD001055 n°10 - 1 (P10)

002HD001055 n°11 - 1 (P11)

002HD001055 n°11 - 2 (P11)

002HD001055 n°12 - 1 (P12)

002HD001055 n°12 - 2 (P12)

002HD001055 n°13 - 1 (P13)

I1 - 1

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (polymérisé) (noir) - -	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) - grise (carreaux 15 X 15 Bleus) -	LGT 4 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple (polymérisé) (noir) - -	LGT 4 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 4 - Vol 4 (Séjour)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) - gruse (carreaux 15 X 15 Bleus) -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur (blanc) - -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) - lino beige + colle jaune -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) - lino beige + colle jaune -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - gris pièces humides -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	

P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 4 - Vol 6 (SDB)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) - gris pièces sèches -	LGT 4 - Vol 8 (Chambre 2)	

eurofins | Hygiène du Bâtiment

AC ENVIRONNEMENT
Monsieur David JOUSSELIN
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-KE-046949-01 Version du : 27/07/2016 20:31
Dossier N° : 16KE013800 Date de réception : 21/07/2016
Référence dossier : 002HD001055 O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	002HD001055 n°1 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie Volume n° 3	Matériau souple de type joint (polymérisé) (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	002HD001055 n°10 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 6	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	002HD001055 n°11 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
75 chemin de Sommières
FR-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 15 73 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes TVA FR28 804 354 819 SIRET 804 354 819 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-KE-046949-01 Version du : 27/07/2016 20:31

Dossier N° : 16KE013800 Date de réception : 21/07/2016
Référence dossier : 002HD001055 O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	002HD001055 n°12 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche Volume n ° 8	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	002HD001055 n°13 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 8	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	002HD001055 n°2 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	002HD001055 n°3 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 3	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
75 chemin de Sommières
FR-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 15 73 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes TVA FR28 804 354 819 SIRET 804 354 819 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-KE-046949-01 Version du : 27/07/2016 20:31

Dossier N° : 16KE013800 Date de réception : 21/07/2016
Référence dossier : 002HD001055 O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	002HD001055 n°4 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 1	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	002HD001055 n°5 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint étanchéité porte d'entrée Volume n° 1	Matériau souple (polymérisé) (noir)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	002HD001055 n°6 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 4	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	002HD001055 n°7 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 6	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	002HD001055 n°8 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - joint entre carreaux plâtres (tablier baignoire) Volume n° 6	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
75 chemin de Sommières
FR-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 15 73 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes TVA FR28 804 354 819 SIRET 804 354 819 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-KE-046949-01 Version du : 27/07/2016 20:31

Dossier N° : 16KE013800 Date de réception : 21/07/2016
Référence dossier : 002HD001055 O.P.H. MAYENNE HABITAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
013	002HD001055 n°9 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche Volume n ° 6	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

Manon Sauzade
Business Unit Manager

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
75 chemin de Sommières
FR-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33 (0) 4 66 73 15 73 - Fax: - - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes TVA FR28 804 354 819 SIRET 804 354 819 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
